

建设项目竣工环境保护 验收调查报告

项目名称：2023年州20区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目

委托单位：大庆模范屯油田有限责任公司



黑龙江省合壹环保科技有限公司



2025年10月

编制单位：黑龙江省合壹环保科技有限公司



法人代表：王云鑫

技术负责人：王云鑫

项目负责人：李金琦

编写人员：李金琦

监测单位：黑龙江省吉瑞达检测科技有限公司



参加人员：张磊、付宝林、高德宇、徐畅、刘珊珊、陈雨欣、于爽、盛雪源、梁安琪、李金琦、于洪瑶、郭艳玲

委托单位：大庆油田有限责任公司



法人代表：王健

电话：18745901333

传真：/

邮编：163000

地址：大庆市大同区高台子镇大庆油田有限责任公司第八采油厂

调查单位：黑龙江省合壹环保科技有限公司



法人代表：王云鑫

电话：13351991300

传真：/

邮编：163000

地址：大庆市龙凤区东城领秀居住小区 D-D 座商服楼 0 单元商服 05 室

目 录

前言	1
1 综述	4
1.1 编制依据	4
1.2 调查目的及原则	6
1.3 调查方法	6
1.4 调查范围及调查因子	7
1.5 环境功能区划及验收执行标准	10
1.6 环境保护目标及变化情况	16
1.7 调查重点	21
2 工程调查	23
2.1 项目概况	23
2.2 项目建设过程	23
2.3 实际建设情况调查	23
2.4 污染源调查	49
2.5 项目变更情况调查	58
3 环境影响报告书结论及批复回顾	63
3.1 环境影响报告书主要结论	63
3.2 环境影响报告书批复意见	67
4 环境保护措施落实情况调查	71
4.1 环境影响报告书及批复落实情况调查	71
4.2 环境保护措施落实情况分析	90
4.3 建议	90
5 生态环境影响调查与分析	91
5.1 自然环境概况	91
5.2 生态敏感目标调查	93
5.3 施工期生态环境影响调查	94
5.4 运行期生态环境影响调查	94

5.5 防沙治沙影响调查	103
5.6 水土流失影响调查	103
5.7 生态环境保护措施有效性分析	104
6 水环境影响及环境保护措施调查	106
6.1 污染源及防治措施调查	106
6.2 地下水环境质量现状调查	106
6.3 包气带现状调查	116
6.4 地表水环境现状调查	117
6.5 含油污水污染防治措施调查	118
6.6 水环境保护措施有效性分析	118
7 大气环境影响及环境保护措施调查	119
7.1 污染源及防治措施调查	119
7.2 大气环境质量现状调查	119
7.3 废气污染防治措施调查	120
7.4 大气环境保护措施有效性分析	126
8 声环境影响及环境保护措施调查	128
8.1 污染源及防治措施调查	128
8.2 声环境质量现状监测	128
8.3 噪声污染防治措施调查	129
8.4 声环境影响措施有效性分析	131
9 固体废物环境影响及环境保护措施调查	133
9.1 污染源及防治措施调查	133
9.2 固体废物污染防治效果调查	133
9.3 固体废物环境保护措施有效性分析	134
10 社会环境影响调查	135
10.1 施工期社会影响调查	135
10.2 运营期社会影响调查	135
11 环境风险防范及应急措施调查	136
11.1 环境风险事故调查	136

11.2 环境风险识别	136
11.3 环境风险影响分析调查	137
11.4 环境风险防范措施调查	139
11.5 应急组织机构及职责	141
11.6 应急保障	142
11.7 应急预案有效性分析	142
12 清洁生产调查	144
12.1 生产工艺核查	144
12.2 资源能源利用核查	144
12.3 末端治理技术调查	144
12.4 环境管理调查	145
13 污染物排放总量控制调查	146
14 环境管理及环境监测计划落实情况调查	147
14.1 环保审批手续及“三同时”执行情况	147
14.2 环保管理机构的设置及人员配备	147
14.3 环境管理规章制度	147
14.4 环保设施运行情况调查	151
14.5 固体废物处置及综合利用调查	151
14.6 验收监测质量控制	151
14.7 环境监测计划落实情况	153
14.8 排污许可证制度执行情况	154
14.9 环保投资情况调查	155
14.10 小结	156
15 公众意见调查	158
15.1 公众参与主要内容	158
15.2 调查方法、范围及对象	158
15.3 公众意见调查结果	159
15.4 公众意见调查结论	162
16 调查结论	163

16.1 项目实际建设内容	163
16.2 环境保护措施落实情况调查结论	163
16.3 环境影响调查结论	164
16.4 环境风险防范与应急措施调查结论	165
16.5 环境管理调查结论	165
16.6 总结论	165
附件 1：本项目环评报告批复文件	167
附件 2：监测报告	174
附件 3：含油污泥与废防渗布处理合同	255
附件 4：危废转移联单	278
附件 5：排污许可证	286
附件 6：大庆油田有限责任公司第八采油厂环境突发事件专项应急预案	287
附件 7：采油八厂工业固废填埋场环保手续	289
附件 8：危险废物暂存库环保手续	295
附件 9：废弃钻井液集中处理站环保手续	298
附件 10：拉运记录	307
附件 11：引用监测报告	309
附件 12：工程完工交接证书	3098

前言

2023 年州 20 区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目（以下简称“本项目”）位于黑龙江省大庆市肇州县新福乡境内，油田开发区域中心坐标：E125.131431，N45.845292（地理位置见图 1）。本项目区块位于州 20 区块，区域附近的村屯主要有东太平山、李洪林屯、保安村、刘马贩子、大窝棚、西太平山、温家屯、乐园村、乐业村、四新村、丛家屯、吕国春屯、四合村、双龙山乡等。

2022 年 3 月，黑龙江环盛环保科技开发有限公司编制了《2023 年州 20 区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目环境影响报告书》，大庆市生态环境局于 2023 年 4 月 25 日对本项目环境影响报告书进行了批复（庆环审[2023]44 号）。

本项目工程于 2023 年 12 月建设，2024 年 12 月竣工并投产运行。本项目实际基建了 15 口油井、3 口转注井，建成后产能 $0.73 \times 10^4 \text{t/a}$ 。新建了单井集油掺水管道 5.27km，站间掺水管道 4.3km，单井注水管道 0.852km，新建了通井路等道路 1.15km，新建了井场柱上变 11 座，新建了 10kV 线路 2.94km，更换了 2 台宋 II-3 转油站外输泵，在肇 2 转油站内新建了 1 台 0.2MW 外输炉。实际占地面积 8.422hm^2 ，其中临时占地 7.957hm^2 ，永久占地 0.465hm^2 。由于批复概算核减，项目实际总投资 816.21 万元，相比环评时期 1950 万元，减少了 1133.79 万元，环保投资 106.883 万元。与环评时期相比，建设内容无变化。

对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52 号）、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910 号），本项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护措施基本与环评一致，且运行期未有新增污染源，本项目不属于重大变动。

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ612-2011），通过企业提供的资料和现场勘查得出，本项目涉及的井场、管线等已建设完成，现已正常运行，配套环境保护设施建成并投入使用，符合验收条件，可以开展项目验收调查工作。

受大庆模范屯油田有限责任公司的委托，由黑龙江省合壹环保科技有限公司承担大庆模范屯油田有限责任公司 2023 年州 20 区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目竣工环境保护验收调查工作。

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007）、《建

设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，在建设单位的积极配合下，我单位仔细研究了本项目文件资料、环境影响报告书及其批复文件，对项目所在区域的环境敏感点分布情况、环境保护措施执行情况、生态影响及恢复情况、污染治理设施运行情况以及井场、管线、道路、供配电工程建设及运行情况进行了详细的现场勘查，并委托大庆中环评价检测有限公司对本项目的污染物排放状况、环保设施治理效果及本项目所在区域的空气、土壤、声环境、地下水等环境要素进行了验收监测。在完成上述工作的基础上，结合工程有关资料，于2025年10月编制完成了本项目验收调查报告。验收过程见图I-2。



图 I-1 地理位置

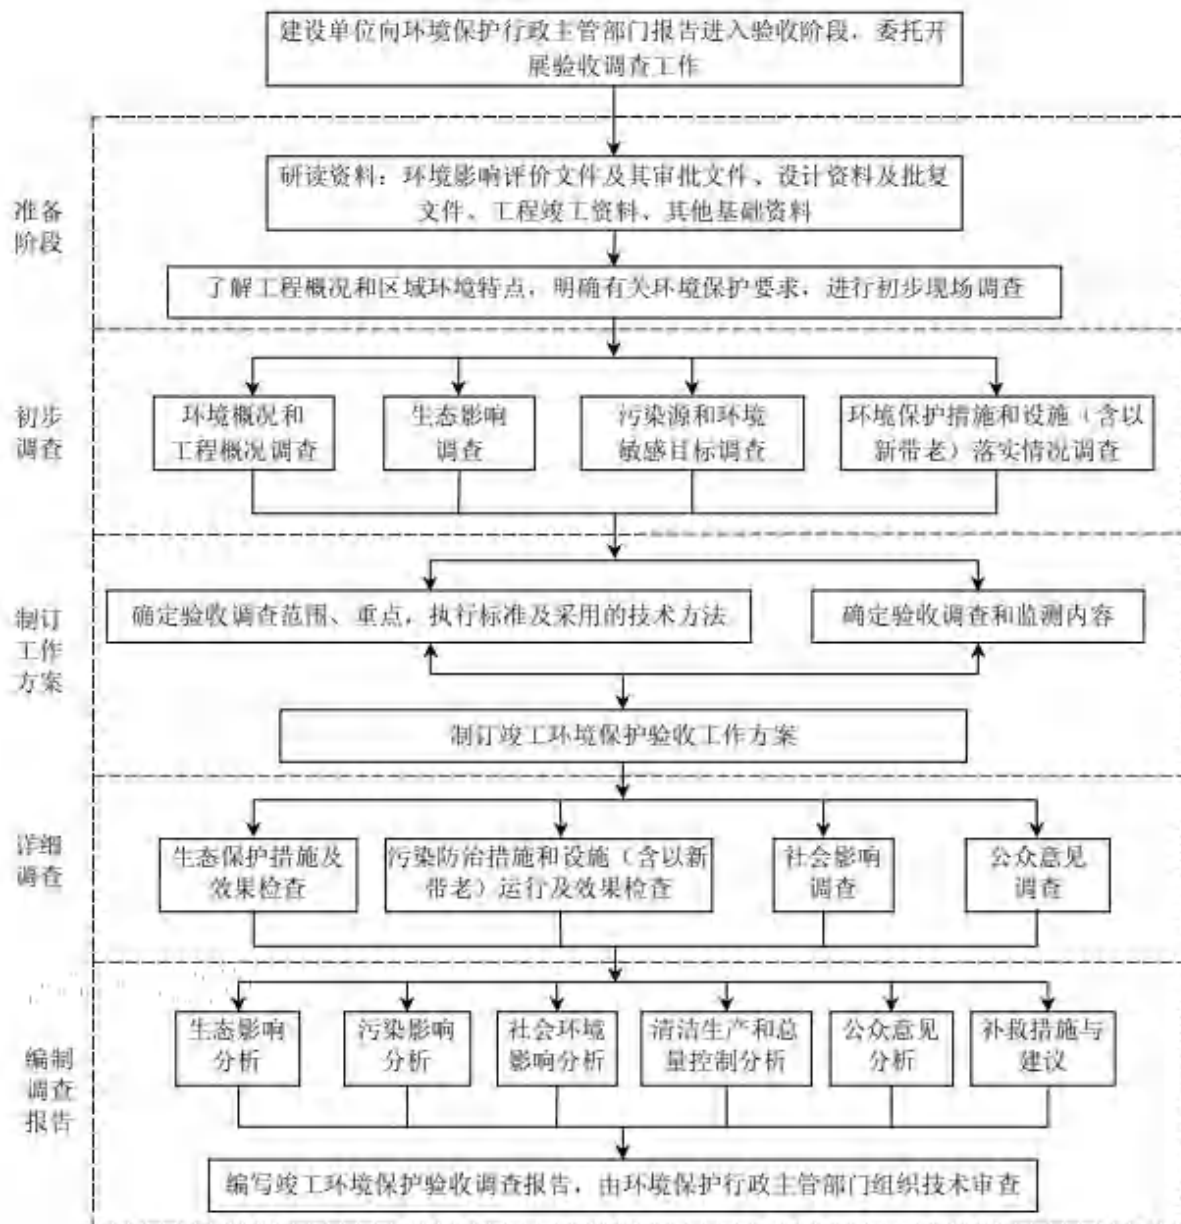


图 I-2 验收调查工作程序图

1 综述

1.1 编制依据

本调查报告编制依据见表 1.1-1。

表 1.1-1 编制依据一览表

项目	序号	内容
法律法规、部门规章和规范性文件	1	《中华人民共和国环境保护法》 (中华人民共和国主席令第九号, 2015年1月1日起施行)
	2	《中华人民共和国水污染防治法》 (第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次, 2018年1月1日起施行)
	3	《中华人民共和国大气污染防治法》 (中华人民共和国主席令第31号)(2018修订)(2018年10月26日实施)
	4	《中华人民共和国噪声污染防治法》 (中华人民共和国主席令第104号, 2022年6月5日起施行)
	5	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 (中华人民共和国主席令第43号, 2020年9月1日起施行)
	6	《中华人民共和国土壤污染防治法》 (2018年8月31日第十三届全国人大第五次会议通过, 2019年1月1日实施)
	7	《中华人民共和国清洁生产促进法》 (中华人民共和国主席令第54号, 2012年7月1日起施行)
	8	《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 (中华人民共和国主席令第30号, 2010年10月1日起施行)
	9	《中华人民共和国土地管理法》 (中华人民共和国主席令第28号, 2020年1月1日起施行)
	10	《中华人民共和国黑土地保护法》 (中华人民共和国主席令第115号, 2022年3月1日施行)
	11	《中华人民共和国水土保持法》 (中华人民共和国主席令第39号, 2011年3月1日修订)
	12	《中华人民共和国防沙治沙法》 (中华人民共和国主席令第16号, 2018年10月26日)
	13	《中华人民共和国循环经济促进法》 (全国人民代表大会常务委员会, 2018年12月26日修正)
	14	《建设项目环境保护管理条例》 (国务院令第682号, 2017年10月1日施行)
	15	《关于环境保护主管部门不再进行建设项目试生产审批的公告》 (环境保护部公告2016年第29号, 2016年4月8日)
	16	《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 (国环规环评〔2017〕4号文, 2017年11月22日起实施)
	17	《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119号, 2014年12月29日)
	18	《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号, 2015年6月5日)
	19	《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》 (环办〔2015〕52号, 2015年6月4日起实施)
	20	《石油天然气开采业污染防治技术政策》(2012年3月7日)
	21	《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)
	22	《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发〔2016〕31号)
	23	《黑龙江省环境保护条例》(2018年4月26日起施行)

	24	《关于印发〈黑龙江省环境保护厅关于建设项目环境保护设施验收的工作指引（试行）〉的通知》（黑环函〔2018〕284号，2018年8月22日印发）
	25	《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年12月27日）
	26	《黑龙江省水污染防治条例》（2023年12月1日起施行）
	27	《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省土壤污染防治实施方案的通知》（黑政发〔2016〕46号，2016年12月30日）
	28	《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021年3月2日黑龙江省十三届人大五次会议审议通过）
	29	《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》
	30	《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2022年3月1日起施行）
	31	《关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》（黑龙江省人民政府办公厅，黑政办规〔2021〕18号）
	32	《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划》（黑龙江省人民政府办公厅，黑政办规〔2021〕48号）
	33	《黑龙江省黑土地保护工程实施方案（2021-2025年）》（黑龙江省人民政府办公厅，黑政办规〔2021〕40号）
	34	《大庆市人民政府关于印发大庆市土壤污染防治实施方案的通知》（庆政规〔2017〕2号）
	35	《大庆市人民政府办公室关于印发大庆市加强水污染防治工作实施方案的通知》（庆政办发〔2015〕55号）
	36	《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）
	37	《大庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（庆政发〔2021〕13号）
	38	《中共大庆市委大庆市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的具体实施意见》（庆发〔2018〕17号）
	39	《大庆市土壤污染防治实施方案》（大庆市人民政府，庆政规〔2017〕2号，2017年3月31日）
	40	《大庆市加强水污染防治工作实施方案》（大庆市人民政府办公室，庆政办发〔2015〕55号，2015年12月31日）
	41	《大庆市湿地保护管理办法》（庆政规〔2017〕10号）
	42	《大庆市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（大庆市人民政府，庆政规〔2021〕3号，2021年7月14日）
	43	《关于印发大庆市声环境功能区划分、大庆市环境空气质量功能区划分、大庆市地表水环境功能区划分的通知》（庆政发〔2019〕11号）
技术 导则	1	《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）
	2	《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）
	3	《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）
	4	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）
	5	《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）
	6	《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）
	7	《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）
	8	《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ/T349-2007）
	9	《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）
技术 规范	1	《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）
	2	《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅2018年第9号，2018年5月16日起实施）
	3	《建设项目竣工环境保护技术规范 石油天然气开采》（HJ612-2011）
	4	《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）

	5	《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ 1248-2022）
	6	《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）
	7	《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（环办便函[2020]492号）
	8	《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ953-2018）
	9	《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）
	10	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
	11	《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）
技术资料	1	《2023年州20区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目环境影响报告书》（黑龙江环盛环保科技有限公司，2022年7月）
	2	《关于2023年州20区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目环境影响报告书的批复》（庆环审[2023]44号，2023年4月25日）
	3	《临时用地许可证》
	4	检测报告等其他相关资料

1.2 调查目的及原则

1.2.1 调查目的

（1）对本项目的实际建设内容、环境影响因素及环保措施落实情况进行核查，与环境影响报告书、环评批复相对照，反映其变化状况；

（2）调查项目在施工、运行和管理等方面落实环境影响报告书、以及是否履行了各级环保行政主管部门批复的各项要求；

（3）调查本项目已采取的生态保护、污染控制措施，并通过对项目所在区域环境现状监测结果的评价，分析各项措施实施的有效性，针对本项目已产生的实际环境问题及可能潜在的环境影响，提出切实可行的补救和应对措施；

（4）根据项目环境影响的调查结果，客观、公正地从技术上论证工程是否符合建设项目竣工环境保护验收的条件。

1.2.2 调查原则

- （1）认真贯彻国家与地方的环境保护法律、法规及有关规定；
- （2）坚持污染防治与生态保护并重的原则；
- （3）坚持客观、公正、科学、实用的原则；
- （4）坚持充分利用已有资料与实地踏勘、现场调研、现状监测相结合的原则；
- （5）坚持对项目施工期、运行期环境影响进行全过程分析的原则。

1.3 调查方法

（1）按照国家关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，并遵循《建设项目竣工环境保护验收技术规范石油天然气开采》（HJ612-2011）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T394-2007）、《建设项目竣工环境保护验收技

术指南污染影响类》（生态环境部办公厅 2018 年 5 月 16 日印发）、《环境影响评价技术导则》规定的方法；

（2）考虑所用方法的可操作性，针对性的选择环境监测、实地调查、文件资料核实等综合性技术手段及方法；

（3）运营期环境影响调查采用资料调研、现场调查与现状监测相结合的方法。

1.4 调查范围及调查因子

1.4.1 调查范围

本次竣工环境保护验收调查内容为 2023 年州 20 区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目开发范围内的大气环境、水环境、生态环境、土壤环境和声环境等环境质量现状，以及主要污染源分布情况、主要污染源的种类、数量和来源以及存在的主要环境问题；调查油田开发生产过程中临时占地和永久占地情况；由于施工过程中改变土地利用功能，对周围植被造成破坏及对地形地貌与景观造成改变的情况；固体废物的处置情况。验收调查范围原则上与环评的评价范围一致，并根据工程实际建设及环境影响实际情况，结合现场勘查情况对其进行适当调整。验收调查范围与环评一致性详见表 1.4-1，调查范围图见图 1.4-1。

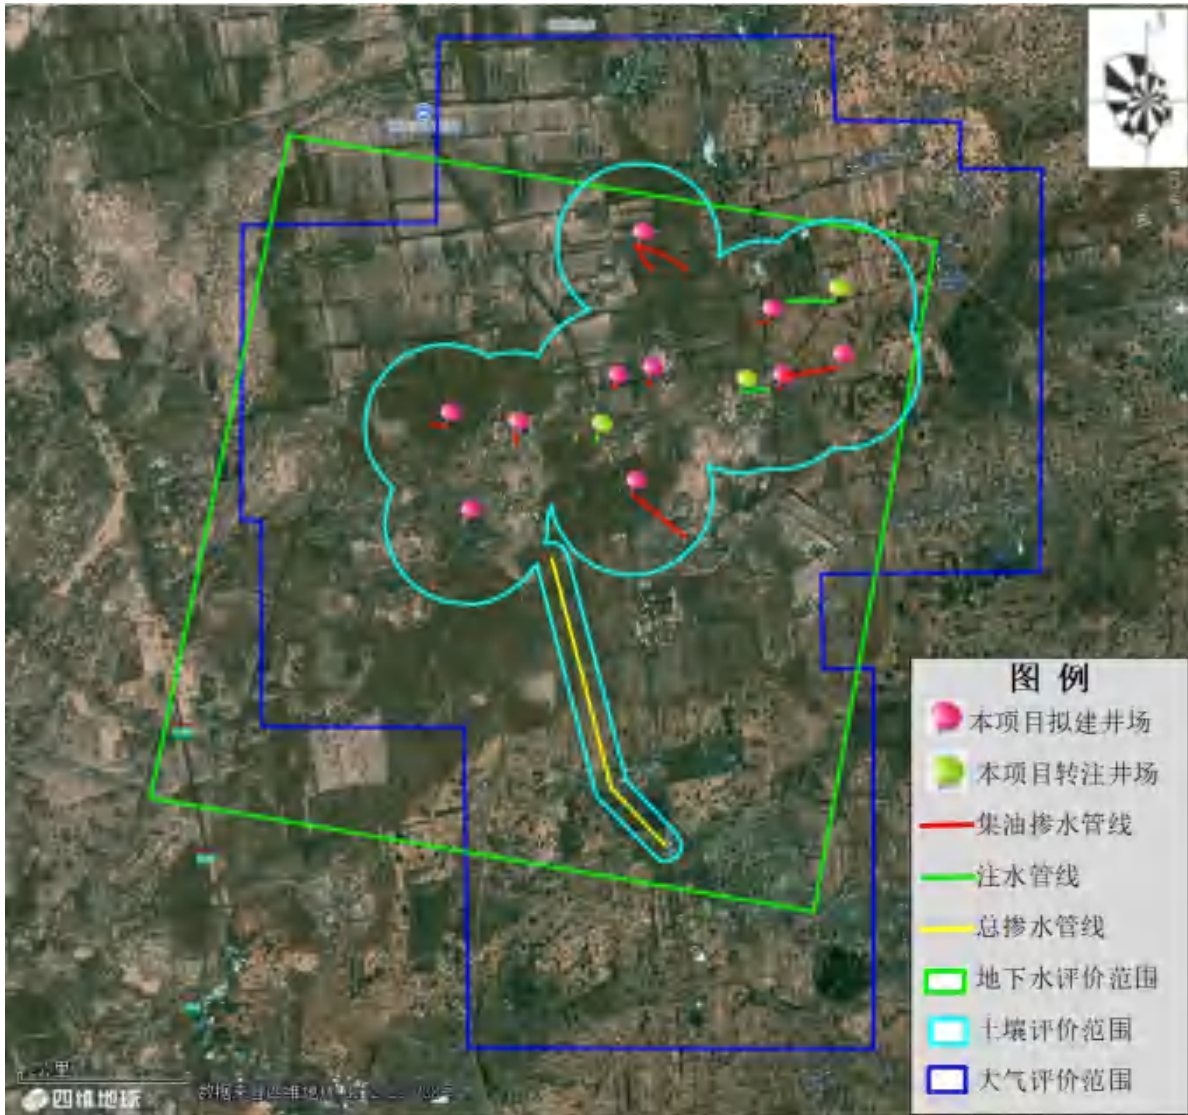


图 1.4-1 调查范围图

（1）大气环境验收调查范围

根据该地区气象条件、地形地貌、污染源分布、环境功能等并结合环境影响评价报告书确定的评价范围，本次验收大气环境调查范围为项目井场区域边界外扩 2.5km 范围的区域，调查范围总面积 28km²。

（2）水环境验收调查范围

本次验收地下水调查为井场区域边界上游 630m、西侧 2400m、东侧 900m、下游 490m 的东北→西南走向的矩形区域，项目评价范围共计达 68.18km²。

（3）声环境验收调查范围

本次验收声环境调查范围为井场、管道，边界外扩 200m 范围内的声环境。

（4）土壤环境验收调查范围

本次验收土壤环境调查范围为井场占地范围和井场评价区域外扩 1.0km 范围（包含集输管道外扩 200m 范围）。

（5）生态环境验收调查范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）、《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023），本次验收生态环境调查范围为井场外扩 50m 范围，肇 2-1 集油阀组间至肇 2 转油站间总掺水管道外扩 300m 范围的生态环境，与环评时期相比，由于导则更新，井场外扩范围改为 50m。

（6）环境风险验收调查范围

本项目风险评价等级为简单分析，不设置环境风险调查范围。

表 1.4-1 各环境要素调查范围一览表

序号	环境要素	环评阶段调查范围	验收阶段调查范围	一致性分析
1	环境空气	井场区域边界外扩 2.5km 范围的区域，评价范围总面积 28km ²	井场区域边界外扩 2.5km 范围的区域，评价范围总面积 28km ²	与环评时期一致
2	地下水	拟建井场、管道，边界外扩 200m 范围	井场、管道，边界外扩 200m 范围	
3	声环境	拟建井场区域边界上游 660m、西侧 1270m、东侧 680m、下游 230m 的东北→西南走向的矩形区域，项目评价范围共计达 68.18km ²	井场区域边界上游 660m、西侧 1270m、东侧 680m、下游 230m 的东北→西南走向的矩形区域，项目评价范围共计达 68.18km ²	
4	土壤环境	拟建井场占地范围和井场评价区域外扩 1.0km 范围，肇 2-1 集油阀组间至肇 2 转油站间总掺水	井场占地范围和井场评价区域外扩 1.0km 范围，肇 2-1 集油阀组间至肇 2 转油站间总掺水管道外扩 200m 范围	

		管道外扩 200m 范围		
5	生态环境	项目井区及边界外扩 1000m，肇 2-1 集油阀组间至肇 2 转油站间总掺水管道外扩 300m 范围	井场外扩 50m 范围，肇 2-1 集油阀组间至肇 2 转油站间总掺水管道外扩 300m 范围	与环评时期相比，井场外扩范围改为 50m，验收范围减少，主要是由于 HJ349 更新

1.4.2 调查因子

根据本项目环境影响因素、当地环境状况的特点，参照环境影响报告书内容，确定的调查因子，见表 1.4-2。

表 1.4-2 验收调查因子

分类	调查内容	调查因子	
环境质量	环境空气	SO ₂ 、NO ₂ 、PM _{2.5} 、PM ₁₀ 、CO、O ₃ 、非甲烷总烃	
	地表水	pH 值、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、石油类	
	地下水	K ⁺ 、Na ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ 、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻ 、Cl ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、挥发酚、氰化物、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、铬（六价）、砷、铅、铁、汞、锰、镉、石油类、总大肠菌群、菌落总数、硫化物	
	包气带	pH、铅、汞、总铬、石油类、砷、挥发酚、镉、铜、镍	
	声环境	连续等效 A 声级	
	土壤	建设用地：pH、As、Cd、Cr（六价）、Cu、Pb、Hg、Ni、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）；农用地：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	
	生态	植被现状，土地类型，临时占地恢复情况，永久占地的平整情况	
污染物排放	废气	加热炉	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度
		无组织排放	非甲烷总烃
	噪声	连续等效 A 声级	
	含油污水	污水处理设施进出口：含油量、悬浮固体含量、悬浮物颗粒直径中值	
	固体废物	含油污泥处理去向，处理后污泥：砷、汞、六价铬、铜、锌、镍、铅、镉、石油类、含水率、pH 值，废含油防渗布、KOH 废包装袋、过硫酸钾废包装袋等固废处理去向。	

1.5 环境功能区划及验收执行标准

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T394-2007）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）与《建设项目竣工环境保护验收技术规范石油天然气开采》（HJ612-2011）的相关要求，本次调查，原则上采用建设项目环境影响评价阶段环境保护部门确认的环境保护标准与环境保护设施工艺指标进行验收，如有已修订新颁布的环境保护标准，则用其作为验收调查的标准。本项目执行标准见表 1.5-1。

表 1.5-1 验收执行标准

类别	标准名称
环境质量标准	《环境空气质量标准》（GB3096-2026） 非甲烷总烃采用《大气污染物综合排放标准详解》
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 地下水石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类、2类声环境功能区标准
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）
污染物排放标准	依托场站无组织排放的非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中的相关标准要求 场站内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内非甲烷总烃无组织排放限值
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015） 《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》（DB23/T3104-2022） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

1.5.1 环境质量标准

1.5.1.1 环境空气

根据《大庆市人民政府关于印发大庆市声环境功能区划分、大庆市环境空气质量功能区划分、大庆市地表水环境功能区划分的通知》（庆政发[2019]11号），本项目所在地为环境空气二类功能区。

环境空气质量标准环评阶段执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，本次验收执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，具体值见表 1.5-2；非甲烷总烃环评阶段和本次验收阶段执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐标准值，具体值见表 1.5-3。

表 1.5-2 空气环境质量标准

污染物项目	平均时间	浓度限值	单位	标准来源
SO ₂	年平均	60	μg/m ³	《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修 改单二级
	24小时平均	150		
	1小时平均	500		
NO ₂	年平均	40		
	24小时平均	80		
	1小时平均	200		
CO	24小时平均	4	mg/m ³	
	1小时平均	10		
O ₃	日最大8小时平均	160	μg/m ³	
	1小时平均	200		
PM ₁₀	年平均	70		

	24小时平均	150		
PM _{2.5}	年平均	35		
	24小时平均	75		

表 1.5-3 大气污染物综合排放标准详解

污染物名称	项目	《大气污染物综合排放标准详解》	浓度单位
非甲烷总烃	小时浓度值	2.0	mg/m ³

1.5.1.2 地下水环境

本项目区域地下水环境质量在环评阶段及本次验收均执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，见表 1.5-4；石油类环评阶段及本次验收均参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准执行，见表 1.5-5。

表 1.5-4 地下水质量标准

序号	项目	标准值 mg/L	序号	项目	标准值 mg/L
1	pH	6.5-8.5	13	铅	≤0.01
2	总硬度	≤450	14	镉	≤0.005
3	耗氧量	≤3.0	15	铬（六价）	≤0.05
4	挥发酚	≤0.002	16	汞	≤0.001
5	氟化物	≤1.0	17	砷	≤0.01
6	硝酸盐（以 N 计）	≤20.0	18	氰化物	≤0.05
7	亚硝酸盐（以 N 计）	≤1.00	19	铁	≤0.3
8	氨氮	≤0.50	20	锰	≤0.10
9	石油类	≤0.05	21	溶解性总固体	≤1000
10	菌落总数（CFU/ml）	≤100	22	氯化物	≤250
11	总大肠菌群（MPN/100ml）	≤3.0	23	钠	≤200
12	硫酸盐	≤250	24	硫化物	≤0.02

1.5.1.3 声环境质量标准

根据《大庆市人民政府关于印发大庆市声环境功能区划分、大庆市环境空气质量功能区划分、大庆市地表水环境功能区划分的通知》（庆政发[2019]11号），本项目所在区域内声环境环评阶段及本次验收执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2类声环境功能区标准。具体值见表 1.5-5。

表 1.5-5 声环境质量标准单位：dB(A)

类别	适用区域	昼间	夜间	标准来源
1类	村屯居民住宅	55	45	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
2类	居住、商业、工业混杂区	60	50	

1.5.1.4 土壤环境质量标准

本次验收井场永久占地范围内土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中第二类用地标准，井场外土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值标准，与环评时期一致。验收执行标准详见表 1.5-6、表 1.5-7。

表 1.5-6 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 单位: mg/kg

序号	污染物项目	CAS 编号	筛选值
			第二类用地
重金属和无机物			
1	砷	7440-38-2	60
2	镉	7440-43-9	65
3	铬（六价）	18540-29-9	5.7
4	铜	7440-50-8	18000
5	铅	7439-92-1	800
6	汞	7439-97-6	38
7	镍	7440-02-0	900
挥发性有机物			
8	四氯化碳	56-23-5	2.8
9	氯仿	67-66-3	0.9
10	氯甲烷	74-87-3	37
11	1, 1-二氯乙烷	75-34-3	9
12	1, 2-二氯乙烷	107-06-2	5
13	1, 1-二氯乙烯	75-35-4	66
14	顺-1, 2-二氯乙烯	156-59-2	596
15	反-1, 2-二氯乙烯	156-60-5	54
16	二氯甲烷	75-09-2	616
17	1, 2-二氯丙烷	78-87-5	5
18	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	630-20-6	10
19	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	79-34-5	6.8
20	四氯乙烯	127-18-4	53
21	1, 1, 1-三氯乙烷	71-55-6	840
22	1, 1, 2-三氯乙烷	79-00-5	2.8
23	三氯乙烯	79-01-6	2.8
24	1, 2, 3-三氯丙烷	96-18-4	0.5
25	氯乙烯	75-01-4	0.43
26	苯	71-43-2	4
27	氯苯	108-90-7	270
28	1, 2-二氯苯	95-50-1	560
29	1, 4-二氯苯	106-46-7	20
30	乙苯	100-41-4	28
31	苯乙烯	100-42-5	1290
32	甲苯	108-88-3	1200
33	间二甲苯+对二甲苯	108-38-3, 106-42-3	570
34	邻二甲苯	95-47-6	640
35	硝基苯	98-95-3	76
36	苯胺	62-53-3	260
37	2-氯酚	95-57-8	2256
38	苯并[a]蒽	56-55-3	15
39	苯并[a]芘	50-32-8	1.5
40	苯并[b]荧蒽	205-99-2	15
41	苯并[k]荧蒽	207-08-9	151
42	蒽	218-01-9	1293
43	二苯并[a, h]蒽	53-70-3	1.5
44	茚并[1, 2, 3-cd]芘	193-39-5	15

45	萘	91-20-3	70
其他项目			
46	石油烃（C ₁₀ —C ₄₀ ）	/	4500

表 1.5-7 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准 单位：mg/kg

序号	污染物项目		风险筛选值（mg/kg）			
			pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
1	镉	其他	0.3	0.3	0.3	0.6
2	汞	其他	1.3	1.8	2.4	3.4
3	砷	其他	40	40	30	25
4	铅	其他	70	90	120	170
5	铬	其他	150	150	200	250
6	铜	其他	50	50	100	100
7	镍		60	70	100	190
8	锌		200	200	250	300

1.5.2 污染物排放控制标准

1.5.2.1 废气排放执行标准

根据环评、批复，结合标准执行情况，本项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；运营期井场、依托场站（宋 II-3 转油站、宋 II-4 转油站、肇 2 转油站、肇一联合站、宋二联合站）厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中的相关标准要求，见表 1.5-9。

表 1.5-8 大气污染物综合排放标准

污染物	无组织排放监控浓度限值		标准来源
	监控点	浓度（mg/m ³ ）	
扬尘	周界外浓度最高点	1.0	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
非甲烷总烃	周界外浓度最高点	4.0	

表 1.5-9 陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准

污染物	监控点	浓度限值（mg/m ³ ）
非甲烷总烃	油气集中处理站、涉及凝析油或天然气凝液的天然气处理厂、储油库边界	4.0

宋 II-3 转油站、宋 II-4 转油站、肇 2 转油站、肇一联合站、宋二联合站站内非甲烷总烃排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 中厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。

表 1.5-10 场站内非甲烷总烃排放浓度限值

污染物项目	排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
非甲烷总烃	10	监控点处 1h 平均浓度值	在厂房外设置监控点
	30	监控点处任意一次浓度值	

依托场站（宋 II-3 转油站、宋 II-4 转油站、肇 2 转油站、肇一联合站、宋二联合站）加热炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建燃气锅炉大气污染物浓度限值，具体见表 1.5-11。

表 1.5-11 锅炉大气污染物排放标准

污染物		表 2 限值	标准来源
燃气锅炉	颗粒物 (mg/m ³)	20	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
	二氧化硫 (mg/m ³)	50	
	氮氧化物 (mg/m ³)	200	
	烟气黑度 (林格曼黑度, 级)	≤1	

1.5.2.2 废水处理执行标准

运营期含油污水依托肇一联合含油污水处理站及宋二联合含油污水处理站进行处理后达标回注，出水执行《大庆油田地面工程建设设计规定》(Q/SYDQ0639-2015)、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T 5329-2022)标准要求(含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、悬浮物颗粒直径中值≤2μm)，具体见表 1.5-13。

表 1.5-12 大庆油田地面工程建设设计规定

序号	控制指标	限值
1	含油量	≤8mg/L
2	悬浮固体含量	≤3mg/L
3	悬浮物颗粒直径中值	≤2μm

1.5.2.3 噪声排放执行标准

施工期执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)表 1 排放限值，见表 1.5-13；

表 1.5-13 建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB(A)

昼间	夜间
70	55

油田场站厂界噪声、井场衰减噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准，见表 1.5-14。

表 1.5-14 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A)

类别	适用区域	昼间	夜间
2 类	居住、商业、工业混杂及商业中心区	60	50

1.5.2.4 固体废物排放执行标准

运营期产生的含油污泥运送至第大庆市庆兴环保科技有限公司进行处理，处理后泥渣含油量满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》(DB23/T3104-2022)标准限值(石油类≤3000mg/kg)。具体见表 1.5-18。

表 1.5-18 含油污泥执行标准 单位：mg/kg

序号	控制项目	控制限制
1	As (以干基计) (mg/kg)	≤30
2	Hg (以干基计) (mg/kg)	≤0.8
3	Cr ⁶⁺ (以干基计) (mg/kg)	≤5
4	Cu (以干基计) (mg/kg)	≤150
5	Zn (以干基计) (mg/kg)	≤600
6	Ni (以干基计) (mg/kg)	≤150
7	Pb (以干基计) (mg/kg)	≤375
8	Cd (以干基计) (mg/kg)	≤3

9	石油类（以干基计）（mg/kg）	≤3000
10	pH	6.5-9
11	含水率（质量百分比）	≤40%

本项目产生的生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第157号令）。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物收集、贮存、转移活动严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

1.6 环境保护目标及变化情况

通过对本项目进行现场勘察和分析，确定出本次验收调查的主要环境保护目标。详见表 1.6-1。本项目环境保护目标见图 1-6-1。与环评时期相比，大气环境、地下水环境、声环境、土壤环境调查范围与环评时期一致，由于《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）更新，生态调查范围比环评时期相比减少，生态保护目标减少。

表 1.6-1 环境保护目标一览表

环境要素	保护目标	验收位置	环境特征	与环评一致性	保护等级
地下水	保安村、刘马贩子、李洪林屯联村饮用水井	7#井场西北侧 2630m	1口承压水井（125.081411°，45.863710°），井深约 120m，主要用于村屯居民生活饮用水，供水人数约 755 人，属于分散式饮用水水源，位于保安村	一致	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类
	西太平山分散式饮用水井	6#井场西南侧 345m	1口承压水井（125.122661°，45.848060°），井深约 100m，主要用于全村居民生活饮用水，供水人数约 270 人，属于分散式饮用水水源	一致	
	乐园村、乐园、大岗子、温家屯、大窝棚、东太平山、三新村、小场子、四合村联村饮用水井	1#井场西南侧 785m/集输管线西南侧 740m	1口承压水井（125.124399°，45.858783°），井深约 120m，主要用于全村居民生活饮用水，供水人数约 960 人，位于乐园，属于分散式饮用水水源	一致	
	张辉屯、太平岭联村饮用水井	2#井场东北侧 915m	1口承压水井（125.154013°，45.863742°），井深约 110m，主要用于全村居民生活饮用水，供水人数约 255 人，属于分散式饮用水水源，位于张辉屯	一致	
环境空气	东太平山	芳 180-124 井东侧 155m	约 60 户，180 人	一致	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准
	李洪林屯	7#井场西北侧 800m	约 60 户，180 人	一致	
	东三合屯	7#井场集输管线西北侧 650m	约 200 户，600 人	一致	
	保安村	7#井场西北侧 2335m	约 200 户，600 人	一致	
	四马架	7#井场集输管线西北侧 2300m	约 50 户，150 人	一致	
	刘马贩子	7#井场西北侧 2285m	约 50 户，150 人	一致	
	双进村	7#井场集输管线西北侧 2200m	约 40 户，120 人	一致	

大窝棚	7#井场/集输管线东北侧 1250m	约 3000 户，9000 人	一致
西太平山	6#井场/集输管线西南侧 300m	约 60 户，180 人	一致
温家屯	5#井场北侧 330m	约 200 户，600 人	一致
大岗子	1#平台西北侧 490m	约 150 户，450 人	一致
乐园村	1#井场西南侧 240m	约 200 户，600 人	一致
刘家围子	1#井场集输管线西南侧 210m	约 100 户，300 人	一致
乐园	1#井场西南侧 535m	约 200 户，600 人	一致
赵有才	1#井场集输管线西南侧 460m	约 30 户，90 人	一致
丛家屯	1#井场西北侧 980m	约 30 户，90 人	一致
乐业村	1#井场西北侧 1710m	约 30 户，90 人	一致
张家围子	1#井场东北侧 1610m	约 40 户，120 人	一致
苟家屯	1#井场东北侧 2210m	约 50 户，150 人	一致
集中村	2#井场东北侧 1960m	约 120 户，360 人	一致
张辉屯	2#井场北侧 710m	约 50 户，150 人	一致
小农场	3#井场东南侧 1840m	约 50 户，150 人	一致
四新村	3#井场东南侧 1960m	约 20 户，60 人	一致
太平岭	芳 172-134 井东南侧 120m	约 60 户，180 人	一致
小榆树	4#井场西南侧 210m	约 120 户，360 人	一致
三分场	9#井场西南侧 2040m	约 30 户，90 人	一致
光明村	9#井场集输管线西南侧 2000m	约 40 户，120 人	一致
小场子	10#井场集输管线东南侧 1640m	约 30 户，90 人	一致
四合村	10#井场南侧 1580m	约 60 户，180 人	一致
三新村	肇 2-1 集油阀组间至肇 2 转油站间总掺水管线东北 侧 105m	约 30 户，90 人	一致
徐俭围子	肇 2 转油站北侧 800m	约 200 户，600 人	一致
吕国春屯	肇 2 转油站东南侧 2100m	约 300 户，900 人	一致

2023年州20区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目竣工环境保护验收调查报告

	双龙山乡	1#井场西北侧 2480m	约 300 户，900 人	一致	
	王家炉	1#井场东北侧 2000m	约 120 户，360 人	一致	
声环境	东太平山居民	芳 180-124 井东侧 155m	约 195 人	一致	《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中 1 类标准
	太平岭居民	芳 172-134 井东南侧 120m	约 120 人	一致	
生态	井场厂界外扩 50m 范围，管道、道路中心线两侧各 300m 的生态环境			不一致，井场外扩范围改为 50m	永久占地的耕地按照“占一补一”进行开垦，补缴费用，临时占用耕地平整后复垦
土壤	建设项目井场、道路、柱上变电站永久占地范围内，土壤类型为草甸土。			一致	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值
	井场外延 1km 区域，管道、道路中心线两侧各 200m 内的村屯土壤环境，主要包括三新村、李洪林、西太平山、东太平山、太平岭、温家屯、张辉屯、乐园、乐园村和大岗子住宅。				《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值
	井场外延 1km 区域，管道、道路中心线两侧各 200m 内的土壤环境，主要为耕地、荒草地，土壤类型为草甸土。			一致	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 中农用地土壤污染风险筛选值



图 1.6-1 环境保护目标示意图

1.7 调查重点

本次调查重点是项目开发及运行期对生态、大气环境、水环境、声环境的影响，环境影响报告书及批复文件中提出的各项环保措施落实情况及其有效性，并根据调查结果提出环境保护补救措施。

（1）工程调查：核实实际工程建设内容与环评阶段变化情况，工程实际环境保护投资落实情况，项目建设前后环境敏感目标基本情况及变化情况。

（2）生态、土壤影响调查：重点调查油田开发区域新建井场及管线敷设等临时占地的恢复情况，监测井场内及附近土壤环境质量状况，分析生态环保措施落实情况及其效果，对已采取的措施进行有效性评估。

（3）大气环境影响调查：将重点调查新建井场废气排放情况和依托的转油站废气排放情况、处理设施运行效果，监测分析废气是否按要求达标排放，对已采取的措施进行有效性评估。

（4）水环境影响调查：重点调查本项目废水排放情况、处理设施运行效果，通过对含油污水处理站处理效果进行监测分析是否达标排放，对环境是否造成影响；分析水环境保护措施落实情况及其效果，是否存在跑、冒、滴、漏等现象，对环境是否造成影响，对已采取的措施进行有效性评估。

（5）声环境影响调查：重点调查本项目新建井场、依托场站对周围环境敏感目标的影响；分析声环境保护措施落实情况及其效果。

（6）固体废物调查：重点调查固体废物排放情况；钻井泥浆、岩屑的处置情况，射孔废液产生量，以及贮存、处置方式；调查生产运行期产生的落地油、油泥（砂）等固体废物的处理情况、日常管理情况；是否落实环境影响报告书及其批复文件中提出的固体污染防治措施。

（7）环境风险防范及应急措施调查：调查是否发生过环境风险污染事故及事故处理情况，环境风险污染事故应急防范预案的建立、执行、演练情况及事故应急设施的准备情况。

（8）环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、污染物排放总量控制要求落实情况。

（9）环境管理状况调查：环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况、监测计划执行情况及排污许可执行情况。

（10）对清洁生产和污染物排放总量情况进行核查。

(11) 开展公众参与调查，了解公众对建设项目工程建设及运行过程中的意见及建议等。

2 工程调查

2.1 项目概况

项目名称：2023年州20区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目

工程规模：本项目实际基建了15口油井、3口转注井，建成后产能 $0.73 \times 10^4 \text{t/a}$ 。新建了单井集油掺水管道5.27km，站间掺水管道4.3km，单井注水管道0.852km，新建了通井路等道路1.15km，新建了井场柱上变11座，新建了10kV线路1.26km，更换了2台宋II-3转油站外输泵，在肇2转油站内新建了1台0.2MW外输炉。与环评时期相比，建设内容无变化。

项目投资：项目总投资1950万元，环保投资106.883万元。

项目占地面积：实际占地面积 8.422hm^2 ，其中临时占地 7.957hm^2 ，永久占地 0.465hm^2 。

项目建设性质：改扩建。

项目地理位置：本项目油田开发区块位于大庆市肇州县新福乡境内，具体位置如图I-1所示。

2.2 项目建设过程

2022年3月，黑龙江环盛环保科技开发有限公司编制了《2023年州20区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目环境影响报告书》，大庆市生态环境局于2023年4月25日对本项目环境影响报告书进行了批复（庆环审[2023]44号）。

本项目环保设施设计单位为大庆油田设计院有限公司，环评批复后，本项目于2023年5月由大庆油田工程建设有限公司油田工程事业部进行地面工程施工，2024年5月竣工并投产运行。建设过程详情见表2.2-1。

表 2.2-1 建设工程回顾表

序号	项目	时间	单位
1	环评文件	2022.3	黑龙江环盛环保科技开发有限公司
2	环评文件批复	2023.4.25	大庆市生态环境局
3	建设期	2023.5-2024.5	大庆油田工程建设有限公司油田工程事业部
4	本项目运行期	2024.5	大庆模范屯油田有限责任公司

2.3 实际建设情况调查

2.3.1 本项目主要工程量对比情况

本项目基建的油水井分布情况见表2.3-1。

表 2.3-1 项目井位及类别表

编号	平台号	井号	井别	井位坐标		占地类型	进入阀组间	所属转油站	所属联合站	与环评内容异同点		
				井口横坐标	井口纵坐标							
1	1号平台	芳 162-斜120	油井	21660937	5178530	耕地 (基本农田)	宋 II-3-10 集油阀组间	宋 II-3 转油站	宋二联合站	一致		
2		芳 163-斜122	油井	21660928	5178532					一致		
3	2号平台	芳 168-斜140	油井	21660625	5179070		宋 II-3-12 集油阀组间			一致		
4	3号平台	芳 172-斜141	油井	21659959	5179237		宋 II-3-12 集油阀组间			一致		
5	4号平台	芳 176-斜138	油井	21659639	5179330		宋 II-3-12 集油阀组间			一致		
6	5号平台	芳 171-斜126	油井	21659263	5179433		宋 II-3-11 集油阀组间			一致		
7	6号平台	芳 177-斜122	油井	21659135	5179457		宋 II-3-11 集油阀组间			一致		
8	7号平台	芳 182-斜110	油井	21660245	5178702		宋 II-4-1 集油阀组间			宋 II-4 转油站	一致	
9	8号平台	芳 183-斜118	油井	21658721	5179920	荒草地 (非基本草原)	肇 2-1 集油阀组间	肇 2 转油站→肇一联合站	宋二联合站	一致		
10		芳 180-斜118	油井	21658711	5179920					一致		
11	9号平台	芳 191-斜120	油井	21658174	5179883		肇 2-1 集油阀组间			肇 2 转油站→肇一联合站	宋二联合站	一致
12		芳 189-斜114	油井	21658164	5179883							一致
13	10号平台	芳 182-斜127	油井	21657363	5179912	耕地 (基本农田)	芳 48 集油阀组间	肇 2 转油站→肇一联合站	宋二联合站			一致
14		芳 183-斜122	油井	21657353	5179912							一致
15		芳 184-斜122	油井	21657343	5179912					一致		
16	/	芳 166-142	转注井	21667884	5082634	/	挂接现有注水干线	肇一联合注水站	/	一致		
17	/	芳 172-134	转注井	21666744	5081471	/	挂接现有注水干线	肇一联合注水站	/	一致		
18	/	芳 180-124	转注井	21664973	5080858	/	挂接现有注水干线	宋 II-3 注水站	/	一致		

本项目建设内容及工程量详见表 2.3-2。

表 2.3-2 本项目实际建设内容与环评阶段变化情况表

工程类别	单项工程	环评阶段计划建设内容	工程实际建设内容	与环评内容异同点
主体工程	采油工程	<p>本项目基建油井 15 口，形成 10 座丛式平台井。其中，芳 168-斜 140、芳 172-斜 141、芳 176-斜 138、芳 171-斜 126、芳 177-斜 122、芳 182-斜 110 挂接在老平台建设。</p> <p>油井采用抽油机采油方式（CYJY8-3-37HB 型抽油机 15 台），建成后产能 $0.73 \times 10^4 \text{t/a}$。</p>	<p>本项目实际基建了油井 15 口，形成了 10 座丛式平台井。其中，芳 168-斜 140、芳 172-斜 141、芳 176-斜 138、芳 171-斜 126、芳 177-斜 122、芳 182-斜 110 挂接在老平台建设。</p> <p>油井采用了抽油机采油方式（CYJY8-3-37HB 型抽油机 15 台），建成后产能 $0.73 \times 10^4 \text{t/a}$。</p>	一致
		<p>本项目采用单管环状集油掺水工艺，新建井产液就近接入周围已建集油阀组间。新建单井集油掺水管道 5.27km（$\Phi 76 \times 4.5 \sim 4.45 \text{km}$、$\Phi 60 \times 3.5 \sim 0.82 \text{km}$）。</p> <p>其中：1#平台~6#平台共计 7 口油井产液进入宋 II-3 转油站初步处理后，进入宋二联脱水站进行脱水处理。7#平台 1 口油井产液进入宋 II-4 转油站初步处理后，进入宋二联脱水站进行脱水处理。</p> <p>8#平台~10#平台共 7 口油井产液进入肇 2 转油站初步处理后，进入肇一联脱水站处理，低含水油进入宋二联脱水站进行脱水处理。</p> <p>集油掺水管道埋深 2.0m，管道材质为内缠胶带硬质聚氨酯泡沫黄夹克管，管道铺设涉及钢顶穿跨越 6 处乡道。</p>	<p>本项目采用了单管环状集油掺水工艺，新建了井产液就近接入周围已建集油阀组间。新建了单井集油掺水管道 5.27km（$\Phi 76 \times 4.5 \sim 4.45 \text{km}$、$\Phi 60 \times 3.5 \sim 0.82 \text{km}$）。</p> <p>其中：1#平台~6#平台共计 7 口油井产液进入宋 II-3 转油站初步处理后，进入宋二联脱水站进行脱水处理。7#平台 1 口油井产液进入宋 II-4 转油站初步处理后，进入宋二联脱水站进行脱水处理。</p> <p>8#平台~10#平台共 7 口油井产液进入肇 2 转油站初步处理后，进入肇一联脱水站处理，低含水油进入宋二联脱水站进行脱水处理。</p> <p>集油掺水管道埋深 2.0m，管道材质为内缠胶带硬质聚氨酯泡沫黄夹克管，管道铺设涉及钢顶穿跨越 6 处乡道。</p>	一致
	注水工程	<p>本次产能共基建注水井 3 口（转注井），注入水质为深度处理水，10 年内最高井口注水压力为 14.5MPa，平均单井注水量为 13-15m³/d。</p>	<p>本次产能实际基建了注水井 3 口（转注井），注入水质为深度处理水，10 年内最高井口注水压力为 14.5MPa，平均单井注水量为 13-15m³/d。</p>	一致
		<p>新建单井注水管道 0.852km（$\Phi 48 \times 6$），管道材质采用防腐钢管，管道埋深 2.5m。</p>	<p>新建了单井注水管道 0.852km（$\Phi 48 \times 6$），管道材质采用了防腐钢管，管道埋深 2.5m。</p>	一致
		<p>更换肇 2 转油站至肇 2-1 集油阀组间总掺水管道 4.3km（$\Phi 114 \times 4.5$），管道埋深 2.5m，管道敷设利旧钢过桥 1 处，钢顶穿越 6 处乡道。</p>	<p>更换了肇 2 转油站至肇 2-1 集油阀组间总掺水管道 4.3km（$\Phi 114 \times 4.5$），管道埋深 2.5m，管道敷设利旧钢过桥 1 处，钢顶穿越 6 处乡道。</p>	一致
	辅助工程	数字化工程	<p>对新建的 15 口油井进行配套数字化建设。转注井新建井口数字化配水阀组 3 套。</p>	<p>对本次 15 口油井进行了配套数字化建设。转注井新建了井口数字化配水阀组 3 套。</p>

储运工程	井场道路	<p>本项目转注井场利旧原通井路，2号至7号井场均未新井挂接现有平台，利旧通井路。</p> <p>本次新建3.5m宽砂石路0.16km，路基宽4.5m；新建3.0m宽砂石路0.35km，路基宽3.5m；新建4m宽土路0.33km、3.5m宽土路0.31km。</p>	<p>本项目转注井场利旧原通井路，2号至7号井场均未新井挂接现有平台，利旧通井路。</p> <p>本次新建了3.5m宽砂石路0.16km，路基宽4.5m；新建3.0m宽砂石路0.35km，路基宽3.5m；新建了4m宽土路0.33km、3.5m宽土路0.31km。</p>	一致
公用工程	给水工程	<p>施工期管线试压用水、设备清洗水及转注井洗井用水采用水罐车拉运，生活用水采用桶装水。</p> <p>运营期依托宋II-3转油站、宋II-4转油站、肇2转油站、肇一联合站、宋二联合站，均无新增劳动定员，无新增生活用水。</p>	<p>施工期管线试压用水、设备清洗水及转注井洗井用水采用水罐车拉运，生活用水采用了桶装水。</p> <p>运营期依托宋II-3转油站、宋II-4转油站、肇2转油站、肇一联合站、宋二联合站，均无新增劳动定员，无新增生活用水。</p>	一致
	排水工程	<p>施工期集油掺水管线试压废水、设备清洗废水及转注井洗井废水由罐车拉运至肇一联合油污水处理站处理达标后回注现役油层。施工期生活污水进入附近芳48集油阀组间、宋II-1-1集油阀组间、宋II-3-10集油阀组间、宋II-3-11集油阀组间、宋II-3-12集油阀组间已建旱厕，定期清掏。</p> <p>运营期依托的宋II-3转油站、宋II-4转油站、肇2转油站、肇一联合站、宋二联合站均无新增劳动定员，无新增生活污水。运营期15口油井采出液最终进入肇一联、宋二联脱水站处理，其脱出的含油污水由管道输送至肇一联、宋二联合油污水处理站，出水水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）中含油量$\leq 8\text{mg/L}$、悬浮固体含量$\leq 3\text{mg/L}$、悬浮物颗粒直径中值$\leq 2\mu\text{m}$要求后，回注地下开采油层。</p>	<p>施工期集油掺水管线试压废水、设备清洗废水及转注井洗井废水由罐车拉运至肇一联合油污水处理站处理达标后回注现役油层。施工期生活污水进入附近芳48集油阀组间、宋II-1-1集油阀组间、宋II-3-10集油阀组间、宋II-3-11集油阀组间、宋II-3-12集油阀组间已建旱厕，定期清掏。</p> <p>运营期依托的宋II-3转油站、宋II-4转油站、肇2转油站、肇一联合站、宋二联合站均无新增劳动定员，无新增生活污水。运营期15口油井采出液最终进入肇一联、宋二联脱水站处理，其脱出的含油污水由管道输送至肇一联、宋二联合油污水处理站，出水水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2012）标准要求中含油量$\leq 8\text{mg/L}$、悬浮固体含量$\leq 3\text{mg/L}$、悬浮物颗粒直径中值$\leq 2\mu\text{m}$要求后，回注地下开采油层。</p>	一致
	供电工程	<p>本次产能新增用电负荷162kW，区域内的宋二联变电站、肇一联变电站供电能力满足要求。新建10座柱上变电站，新建1.26km的10kV线路。</p>	<p>本次产能新增用电负荷162kW，区域内的宋二联变电站、肇一联变电站供电能力满足要求。新建了10座柱上变电站，新建了1.26km的10kV线路。</p>	一致
	道路工程	<p>新建3.5m宽砂石通井路3.3km，4m宽通井土路0.06m，3.5m宽进井路（耕地）0.47km。</p>	<p>新建了3.5m宽砂石通井路3.3km、4m宽通井土路0.06m、3.5m宽进井路（耕地）0.47km。</p>	一致

依托 场站	宋 II-3 转 油站	宋II-3 转油站建于 1994 年，站内采用“三合一”处理工艺，处理后含水油输往宋二联。站内有 2 台三合一装置（1 用 1 备），设计处理能力 6750t/d。本次产能新增 7 口油井产液进入宋 II-3 转油站，另外 2023 年宋南零散补充区块新增 11 口油井产液进入宋 II-3 转油站，项目投产后三合一装置最大负荷率为 66.8%、外输炉负荷率最大为 52.1%，本次更换站内 2 台外输泵（ $Q=30\text{m}^3/\text{h}$ $H=150\text{m}$ ），更换后外输泵最高负荷率为 97.6%，本项目依托可行。	宋II-3 转油站建于 1994 年，站内采用“三合一”处理工艺，处理后含水油输往宋二联。站内有 2 台三合一装置（1 用 1 备），设计处理能力 6750t/d。本次产能新增 7 口油井产液进入宋 II-3 转油站，项目投产后三合一装置最大负荷率为 66.8%、外输炉负荷率最大为 52.1%，本次更换了站内 2 台外输泵（ $Q=30\text{m}^3/\text{h}$ $H=150\text{m}$ ），更换后外输泵最高负荷率为 97.6%，满足本项目依托要求。	一致
	宋 II-4 转 油站	宋II-4 转油站建于 1996 年，站内采用“三合一”处理工艺，处理后含水油输往宋二联。站内有 3 台三合一装置（2 用 1 备），设计处理能力 8600t/d。本次产能规划新增油井 1 口，同时 2023 年宋南零散区块新增油井 9 口，新井投产后，三合一装置最大负荷率为 48.3%、外输炉负荷率最大为 30.2%，外输泵最大负荷率为 96.1%，本项目依托可行。	宋II-4 转油站建于 1996 年，站内采用“三合一”处理工艺，处理后含水油输往宋二联。站内有 3 台三合一装置（2 用 1 备），设计处理能力 8600t/d。本次产能规划新增油井 1 口，新井投产后，三合一装置最大负荷率为 48.3%、外输炉负荷率最大为 30.2%，外输泵最大负荷率为 96.1%，满足本项目依托要求。	一致
	肇 2 转油 站	肇 2 转油站建于 2000 年，目前该站管辖油井 186 口（正常生产井 160 口），集油阀组间 8 座。站内采用“三合一+大罐沉降”处理工艺，处理后含水油输往肇一联。站内三合一装置 2 台，设计能力 5600t/d。本次产能新增 7 口油井产液进入肇 2 转油站，项目投产后，“三合一”加热装置负荷率最大为 64.2%，外输炉运行负荷为 101.6%，因此本次考虑在肇 2 转油站内新建 1 台 0.2MW 外输炉，建成后外输炉总负荷率为 61%，改造后本项目依托可行。	肇 2 转油站建于 2000 年，目前该站管辖油井 186 口（正常生产井 160 口），集油阀组间 8 座。站内采用“三合一+大罐沉降”处理工艺，处理后含水油输往肇一联。站内三合一装置 2 台，设计能力 5600t/d。本次产能新增 7 口油井产液进入肇 2 转油站，项目投产后，“三合一”加热装置负荷率最大为 64.2%，外输炉运行负荷为 101.6%，在肇 2 转油站内新建了 1 台 0.2MW 外输炉，建成后外输炉总负荷率为 61%，满足本项目依托要求。	一致
	肇一联脱 水站	肇一联脱水转油站建于 1999 年，站内采用三相分离器脱水工艺，目前本站管辖油井 224 口（正常生产井 165 口），集油阀组间 10 座。除处理本站自身阀组来液外，还接收处理肇 2 转、肇 3 转、肇 4 转、肇 5 转、肇 6 转及华油公司的来液，外输至宋二联合站。本次产能新增油井 7 口。本项目 7 口油井产液进入该站后，三相分离器最大负荷率为 62.4%，外输炉负荷	肇一联脱水转油站建于 1999 年，站内采用三相分离器脱水工艺，目前本站管辖油井 224 口（正常生产井 165 口），集油阀组间 10 座。除处理本站自身阀组来液外，还接收处理肇 2 转、肇 3 转、肇 4 转、肇 5 转、肇 6 转及华油公司的来液，外输至宋二联合站。本次产能新增油井 7 口。本项目 7 口油井产液进入该站后，三相分离器最大负荷率为 62.4%，外输炉负荷率	一致

	率最大为 98.6%，设备能力满足要求。	最大为 98.6%，满足本项目依托要求。	
肇一联合含油污水处理站	该站采用“两级沉降→两级过滤”工艺，设计处理规模为 4000m ³ /d，出水水质满足“8、3、2”标准（含油量≤8.0mg/L，悬浮固体含量≤3.0mg/L，悬浮物颗粒直径中值≤2.0μm/L），本项目新增污水量最大为 21.7m ³ /d（2023 年、2024 年、2025 年），计入新增污水量后，肇一联合含油污水处理量最高污水处理负荷率为 95.6%，运营期油井采出水能够依托该场站处理。	该站采用“两级沉降→两级过滤”工艺，设计处理规模为 4000m ³ /d，出水水质满足“8、3、2”标准（含油量≤8.0mg/L，悬浮固体含量≤3.0mg/L，悬浮物颗粒直径中值≤2.0μm/L），本项目新增污水量为 21.7m ³ /d，计入新增污水量后，肇一联合含油污水处理量最高污水处理负荷率为 95.6%，满足本项目依托要求。	一致
宋二联脱水站	宋二联脱水站始建于 1994 年，为一段脱水转油站，1997 年扩建增加了电脱水工艺，目前站内除接收宋二转油站集油阀组来液外，还接收宋II-3、宋II-4、宋II-5、肇 8、肇 35 转油站来液，以及转输中亚公司、永一联合站来净化油、肇一联合站来第含水油，设计处理规模 24000t/d，本项目 15 口油井产液进入该站后，游离水脱出器负荷率最大为 60.5%、电脱水器负荷率最大为 94.4%，设备能力满足要求。	宋二联脱水站始建于 1994 年，为一段脱水转油站，1997 年扩建增加了电脱水工艺，目前站内除接收宋二转油站集油阀组来液外，还接收宋II-3、宋II-4、宋II-5、肇 8、肇 35 转油站来液，以及转输中亚公司、永一联合站来净化油、肇一联合站来第含水油，设计处理规模 24000t/d，本项目 15 口油井产液进入该站后，游离水脱出器负荷率最大为 60.5%、电脱水器负荷率最大为 94.4%，满足本项目依托要求。	一致
宋二联合含油污水处理站	该站采用“两级沉降→两级过滤”工艺，设计处理规模为 6000m ³ /d，出水水质满足“8、3、2”标准（含油量≤8.0mg/L，悬浮固体含量≤3.0mg/L，悬浮物颗粒直径中值≤2.0μm/L），本项目新增污水量最大为 46.5m ³ /d（2023 年、2024 年、2025 年），计入新增污水量后，宋二联污水处理量最高污水处理负荷率为 70.4%，运营期油井采出水能够依托该场站处理。	该站采用“两级沉降→两级过滤”工艺，设计处理规模为 6000m ³ /d，出水水质满足“8、3、2”标准（含油量≤8.0mg/L，悬浮固体含量≤3.0mg/L，悬浮物颗粒直径中值≤2.0μm/L），本项目新增污水量为 46.5m ³ /d，计入新增污水量后，宋二联污水处理量最高污水处理负荷率为 70.4%，满足本项目依托要求。	一致
第八采油厂三矿危废暂存间	第八采油厂三矿危废暂存间占地面积 200m ² ，室内净高 4.0m，地面、墙面和顶棚材料全部进行了相应的防腐防渗和硬化处理，满足防渗层为至少 1 m 厚粘土层（渗透系数≤10 ⁻⁷ cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10 ⁻¹⁰ cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）。室内分为五个 40m ² 区域分别存储硒鼓墨盒、废旧电瓶、实验室废液和含油废物，废旧电瓶和实验室废液存储区进行防	第八采油厂三矿危废暂存间占地面积 200m ² ，室内净高 4.0m，地面、墙面和顶棚材料全部进行了相应的防腐防渗和硬化处理，满足防渗层为至少 1 m 厚粘土层（渗透系数≤10 ⁻⁷ cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10 ⁻¹⁰ cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）。室内分为五个 40m ² 区域分别存储硒鼓墨盒、废旧电瓶、实验室废液和含油废物，废旧电瓶和实验室废液存储区进行防腐防酸	一致

		腐防酸处理。该危废暂存间服务范围是整个八厂。目前三矿危废暂存间暂存废防渗布量为 8.47t, 现有负荷为 21.18%, 本项目废防渗布产生量 0.7t/a, 新增本项目废防渗布后负荷为 22.9%, 尚有足够余量能够满足本项目处置需求。	处理。该危废暂存间服务范围是整个八厂。目前三矿危废暂存间暂存废防渗布量为 8.47t, 现有负荷为 21.18%, 本项目废防渗布产生量 0.7t/a, 新增本项目废防渗布后负荷为 22.9%, 满足本项目依托要求。	
	第八采油厂工业固废填埋场	第八采油厂工业固废填埋场于 2013 年建成投运, 填埋总容量为 14000m ³ , 主要处理的工业固体废物包括: 废弃岩棉被、废弃黄夹克、分子筛等。服务年限为 20 年, 目前存储量约 8495m ³ , 剩余填埋量约为 5505m ³ 。设计平均每年垃圾填埋处理量为 581.2m ³ /a, 约合 700t/a。 本工程管道施工废料产生量为 0.05t (约 0.02m ³), 第八采油厂工业固废填埋场剩余能力满足本项目需求。	第八采油厂工业固废填埋场于 2013 年建成投运, 填埋总容量为 14000m ³ , 主要处理的工业固体废物包括: 废弃岩棉被、废弃黄夹克、分子筛等。服务年限为 20 年, 目前存储量约 8495m ³ , 剩余填埋量约为 5505m ³ 。设计平均每年垃圾填埋处理量为 581.2m ³ /a, 约合 700t/a。 本工程管道施工废料产生量为 0.05t (约 0.02m ³), 第八采油厂工业固废填埋场满足本项目依托要求。	一致
	含油污泥处理站	本站作为含油污泥减量化处理站, 将含油污泥减量化处置后的固化物送大庆油田水务工程有限公司八厂污泥处理站, 第八采油厂宋芳屯含油污泥处理站采用预处理+调质+离心的处理工艺, 处理能力 5m ³ /h (年运行 200 天, 每天 24 小时), 年最大处理量为 24000m ³ , 目前处理量约为 19200m ³ /a, 负荷约 80%。宋芳屯含油污泥处理站处理后产生的废水由管道输送至宋一联合站进行处理。本项目含油污泥产生量为 0.219/a, 非正常工况下落地油产生量为 0.5t/a, 含油污泥和落地油合计 0.719t/a (约 0.1m ³ /a), 宋芳屯含油污泥处理站剩余处理量为 4800m ³ /a, 考虑本项目含油污泥产生量较小, 本项目产生的含油污泥和落地油可以依托该站处理。	本项目含油污泥处理站委托大庆市庆兴环保科技有限公司进行处理, 该站采用减量化处理装置生产线和序批式热解析装置生产工艺, 含油污泥后泥渣含油量满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》(DB23/3104-2022) 标准限值 (石油类≤3000mg/kg) 综合利用。目前该站实际处理量约为 8 万 t/a, 负荷率为 44.4%, 本项目含油污泥产生量为 0.219/a, 非正常工况下落地油产生量为 0.5t/a, 含油污泥和落地油合计 0.719t/a (约 0.1m ³ /a), 经大庆市庆兴环保科技有限公司处理, 几乎不改变负荷率, 满足本项目依托要求。	一致
环保工程	废气治理	井场、管线、道路施工现场洒水抑尘, 表土及建材堆放设置挡风板、上覆遮盖材料, 施工运输车辆采取密闭措施或加盖防尘布。车辆和施工机械选用优质汽油及柴油。	井场等施工现场洒水消尘, 表土及建材堆放上覆遮盖了材料, 施工运输车辆采取了密闭措施或加盖防尘布。车辆和施工机械选用优质汽油及柴油。	一致
		15 口油井产液依托肇一联合站、宋二联合站, 场	15 口油井产液依托肇一联合站、宋二联合站, 场	一致

	站加热装置采用清洁能源天然气（油田伴生气），产生的燃烧废气经8-23m高烟囱外排。	站加热装置采用清洁能源天然气（油田伴生气），产生的燃烧废气经8-23m高烟囱外排。	
	井场井口安装密封垫，油气集输过程采用密闭措施，大量减少挥发性有机气体的无组织挥发。	井场井口安装了密封垫，油气集输过程采用了密闭措施，大量减少了挥发性有机气体的无组织挥发。	一致
废水	集油管线试压废水产生量为48.19m ³ ，由罐车拉运至肇一联合含油污水处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）限值：“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2μm”后回注现役油层。	集油管线试压废水由罐车拉运至肇一联合含油污水处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2012）标准要求：“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2μm”后回注现役油层。	一致
	转注井洗井废水量为120m ³ /井次，施工期3口转注井洗井废水量为360m ³ 。由罐车拉运至肇一联合含油污水处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）限值：“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2μm”后回注现役油层。	转注井洗井废水量由罐车拉运至肇一联合含油污水处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2012）标准要求：“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2μm”后回注现役油层。	一致
	施工期共产生生活污水19.2m ³ 。施工期生活污水进入附近芳48集油阀组间、宋II-1-1集油阀组间、宋II-3-10集油阀组间、宋II-3-11集油阀组间、宋II-3-12集油阀组间已建旱厕，定期清掏外运用作农家肥。	施工期生活污水进入附近芳48集油阀组间、宋II-1-1集油阀组间、宋II-3-10集油阀组间、宋II-3-11集油阀组间、宋II-3-12集油阀组间已建旱厕，定期清掏外运用作农家肥。	一致
	油井作业污水由罐车拉运至肇一联合含油污水处理站处理，出水水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）中含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、悬浮物颗粒直径中值≤2μm要求后，回注地下开采油层。 运营期依托的肇一联合站、宋二联合站，均无新增劳动定员，无新增生活污水。运营期15口油井采出液进入肇一联、宋二联脱水站处理，其脱出的含油污水由管道输送至肇一联、宋二联合含油污水处理站，出水水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）中含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、悬浮物颗粒直径中值≤2μm要求后，回注	油井作业污水由罐车拉运至肇一联合含油污水处理站处理，出水水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2012）标准要求含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、悬浮物颗粒直径中值≤2μm要求后，回注地下开采油层。 运营期依托的肇一联合站、宋二联合站，均无新增劳动定员，无新增生活污水。运营期15口油井采出液进入肇一联、宋二联脱水站处理，其脱出的含油污水由管道输送至肇一联、宋二联合含油污水处理站，出水水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标	一致

	地下开采油层。	技术要求及分析方法》(SY/T 5329-2012)标准要求中含油量 $\leq 8\text{mg/L}$ 、悬浮固体含量 $\leq 3\text{mg/L}$ 、悬浮物颗粒直径中值 $\leq 2\mu\text{m}$ 要求后,回注地下开采油层。	
噪声	选用低噪声设备;定期维护保养设备,加强施工管理工作,车辆减速慢行。	合理安排了施工进度,避免了大量高噪声设备同时施工;施工期选用了低噪声设备;定期对施工设备进行了保养维护,保证了设备保持在最佳运行状态,降低了噪声源强度,运输车辆避开了居民区的路线。	一致
	抽油机尽可能选用低噪声设备;并采用减振等降噪措施;注意对设备的维护保养,保证设备保持在最佳运行状态,降低噪声源强度。	抽油机、外输泵、加热炉选用了低噪声设备;并采用了减振、隔声等降噪措施;对设备的维护保养,保证了设备保持在最佳运行状态,降低了噪声源强度。	一致
固废处置	管道施工产生的焊渣量0.03t,为一般固体废物,拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。 转注井拆除现有油井基础、机泵更换过程中过程中会产生建筑垃圾,总计约 4m^3 。 转注井拆除现有油井过程中会产生废井架、废井树(经蒸汽清洗后不含油)3套,机泵更换过程中产生废机泵(经蒸汽清洗后不含油)2台。 生活垃圾总量约0.45t,统一收集至各井场生活垃圾存放点,拉运至肇州县生活垃圾填埋场填埋处理。	管道施工废料属于一般固废,拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。 设备拆除产生的建筑垃圾送市政指定地点填埋。 拆除机泵、油井树等设备(蒸汽清洗后不含油)拉运到大庆模范屯油田有限责任公司资产回收库。 施工人员产生的生活垃圾分类收集后,拉运至肇州县生活垃圾填埋场填埋处理。	一致
	落地油及含油污泥统一收集后拉运至第八采油厂宋芳屯含油污泥处理站减量化处理后,委托大庆市云泰石化产品有限公司处理,处理后泥渣含油量满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》(DB23/T3104-2022)标准限值(石油类 $\leq 3000\text{mg/kg}$)。 含油废弃防渗布统一收集后,暂存在第八采油厂三矿危废暂存间后,委托有资质单位进行处置。	落地油及含油污泥统一收集后拉运委托大庆市庆兴环保科技有限公司进行处理,处理后泥渣含油量满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》(DB23/T3104-2022)标准限值(石油类 $\leq 3000\text{mg/kg}$)。 含油废弃防渗布统一收集后,暂存在第八采油厂三矿危废暂存间后,委托黑龙江兰溪谷环保科技发展有限公司转运处理。	一致
生态恢复	施工期作业带清理、管沟开挖、道路的建设对土壤造成扰动和植被的破坏,项目施工期均在临时占地内进行施工,并且施工结束后及时清理施工现场,对临时占用的 3.443hm^2 耕地进行复垦, 4.514hm^2 草地进行播撒草籽。 临时占地:先挖表土层,单独堆放,底土层另外	施工期作业带清理、管沟开挖、道路的建设对土壤造成扰动和植被的破坏,项目施工期均在临时占地内进行施工,并且施工结束后及时清理施工现场,对临时占用的 3.443hm^2 耕地进行了复垦, 4.514hm^2 草地进行了播撒草籽。 临时占地:先挖表土层,单独堆放,底土层另外	一致

	<p>堆放，复原时先填心、底土，后平覆表土，以便尽快恢复植被。</p> <p>永久占地：按照“占多少，垦多少”的原则，进行耕地补偿，土地复垦。应尽量减少占地面积，并规范行车路线及施工人员行为，严禁随意践踏、碾压施工区范围外的植被，不准乱挖、乱采野生植物。</p>	<p>堆放，复原时先填心、底土，后平覆表土，恢复植被。</p> <p>永久占地：按照“占多少，垦多少”的原则，进行了耕地补偿，土地复垦。尽量减少了占地面积，并规范了行车路线及施工人员行为，未发生随意践踏、碾压施工区范围外的植被的现象，未发生乱挖、乱采野生植物的现象。</p>	
地下水监测	<p>参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目进行分区防渗：</p> <p>地下管道壁厚的腐蚀余量大于2mm并采用管道内防腐；管道的外防腐等级采用特加强级；管道的连接方式采用焊接，防渗性能等效黏土防渗层 $Mb \geq 6m$、$K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的要求。</p> <p>油水井作业井场铺设铺设1.5mm厚、渗透系数为 $1.0 \times 10^{-13} cm/s$ 的防渗土工布进行防渗处理，防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中的防渗技术要求，等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$、$K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$。产生的作业污水经罐车拉运至肇一联合油污水处理站处理达标后回注现役油层。肇2转油站新建外输炉下方表土进行夯实，表土结构层下铺设厚1.5mm高密度聚乙烯（HDPE）土工膜构筑防渗层。防渗性能均满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求：在一般防渗区地面铺设 $Mb \geq 1.5m$，$K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$ 的防渗性能的黏土层。</p> <p>油水井井场采取地面平整夯实，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般地面硬化的要求。</p> <p>依托3口村屯地下水井，定期对地下水进行跟踪监测：</p> <p>在项目区域上游依托张辉屯水井（125.148719；45.864802）布设1个潜水背景值监测水井，在区域内依托温家屯水井（125.135818；45.850905）、区域下</p>	<p>按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目进行了分区防渗：</p> <p>地下管道壁厚的腐蚀余量大于2mm并采用了管道内防腐；管道的外防腐等级采用了特加强级；管道的连接方式采用了焊接，防渗性能等效黏土防渗层 $Mb \geq 6m$、$K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的要求。</p> <p>油水井作业井场铺设铺设1.5mm厚、渗透系数为 $1.0 \times 10^{-13} cm/s$ 的防渗土工布进行了防渗处理，防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中的防渗技术要求，等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$、$K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$。产生的作业污水经罐车拉运至肇一联合油污水处理站处理达标后回注现役油层。肇2转油站新建外输炉下方表土进行了夯实，表土结构层下铺设厚1.5mm高密度聚乙烯（HDPE）土工膜构筑防渗层。防渗性能均满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求：在一般防渗区地面铺设 $Mb \geq 1.5m$，$K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$ 的防渗性能的黏土层。</p> <p>油水井井场采取了地面平整夯实，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般地面硬化的要求。</p> <p>依托3口村屯地下水井，定期对地下水进行跟踪监测：在项目区域上游依托张辉屯水井（125.148719；45.864802）布设1个潜水背景值监测水井，在区域内依托温家屯水井（125.135818；45.850905）、区域下游依托三分场水井（125.101552；45.813277）布设1</p>	一致

	游依托三分场水井（125.101552；45.813277）布设1口潜水跟踪监测水井，定期对地下水进行跟踪监测。	口潜水跟踪监测水井，定期对地下水进行跟踪监测。	
--	----------------------------------------------------------	-------------------------	--

2.3.2 原油集输及供配电系统

本项目原油集输采用单管环状掺水集油工艺。

本次产能基建了油井 15 口，其中 6 口井挂接老平台建设，共形成 10 座井场，全部采用了抽油机采油方式（抽油机型号 CYJY8-3-37HB）。本项目共基建了油井 15 口，均为斜井；其中 9 口油井形成新丛式井平台 4 座，其余 6 口新井挂接老井平台 6 座。本次产能 15 口油井均分布在宋 II-3 转、宋 II-4 转、肇 2 转油站周围，可搭接已建集油系统，全部采用单管环状掺水集油工艺，充分依托已建系统能力。新建单井集油掺水管道 5.27km，其中 $\Phi 76 \times 4.5 \sim 4.45\text{km}$ 、 $\Phi 60 \times 3.5 \sim 0.82\text{km}$ 。更换肇 2-1 集油阀组间至肇 2 转油站间总掺水管线 4.3km（ $\Phi 114 \times 4.5$ ）。

实际新建了 10 座柱上变电站，新建了 1.26km 的 10kV 供电线路。

本项目油水井与集油掺水管道、阀组间分布图见图 2.4.6，管道施工作业面控制在 10m，其中施工便道宽 4m，管沟带宽 2m，置土带 4m。新建了 3.5m 宽砂石路 0.16km，路基宽 4.5m；新建了 3.0m 宽砂石路 0.35km，路基宽 3.5m；新建了 4m 宽土路 0.33km、3.5m 宽土路 0.31km。管道施工断面平面布置图见图 2.4-7。




图 2.4-7 管道施工断面平面布置图



图 2-4-6 (1) 2口井挂接宋 II-3-10 集油阀组间现有管线示意图

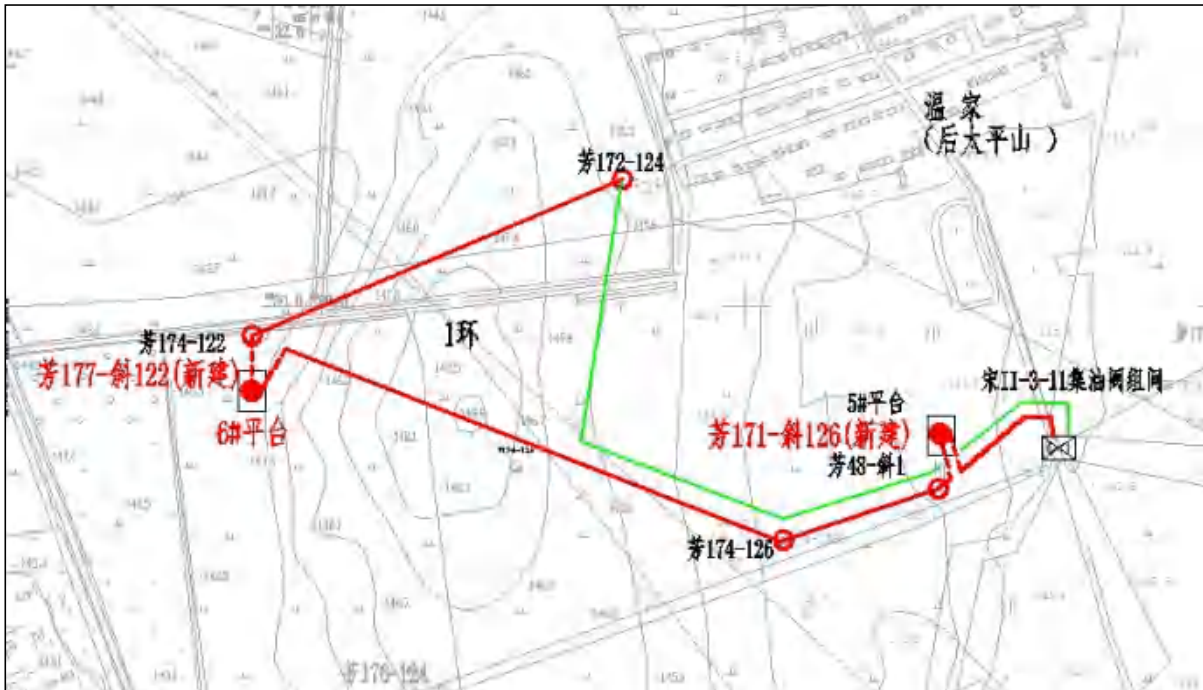


图2-4-6 (2) 2口井挂接宋II-3-11集油阀组间现有管线示意图

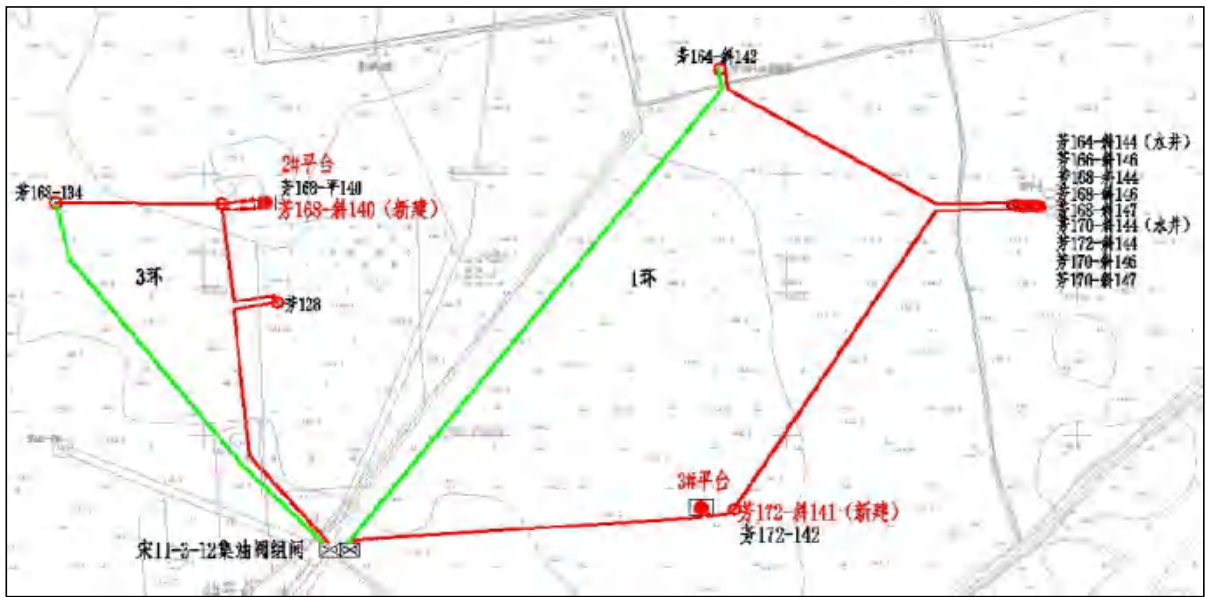


图2-4-6 (3) 2口井挂接宋II-3-12集油阀组间现有管线示意图

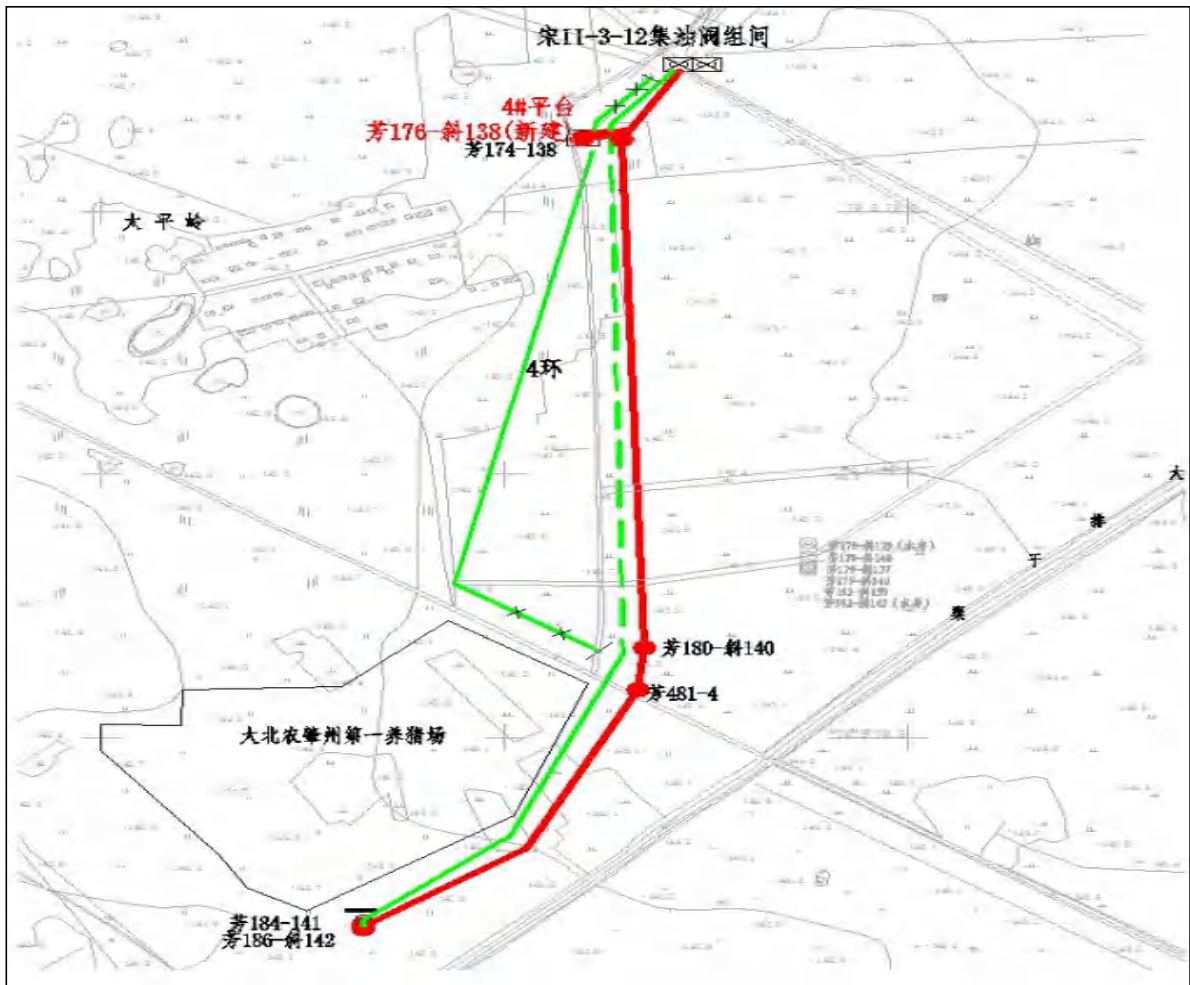


图2-4-6 (4) 1口井挂接宋II-3-12集油阀组间现有管线示意图

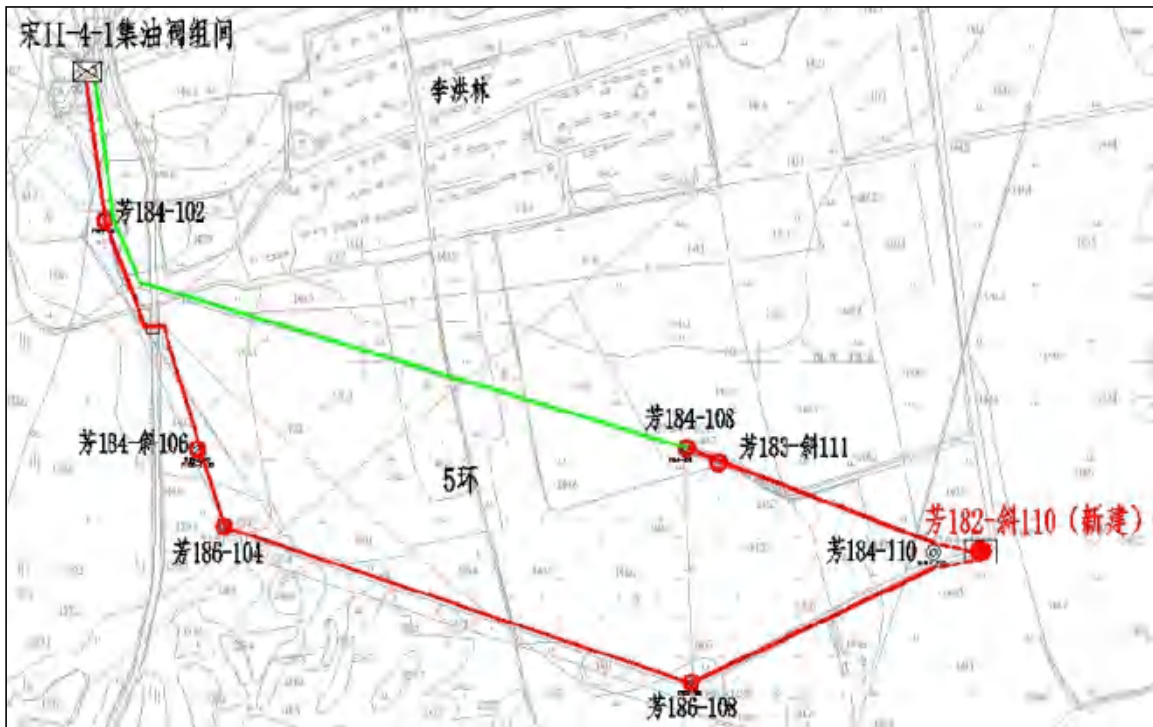


图2-4-6 (5) 1口井挂接宋II-4-1集油阀组间现有管线示意图



图2-4-6 (6) 3口井挂接芳48集油阀组间现有管线示意图

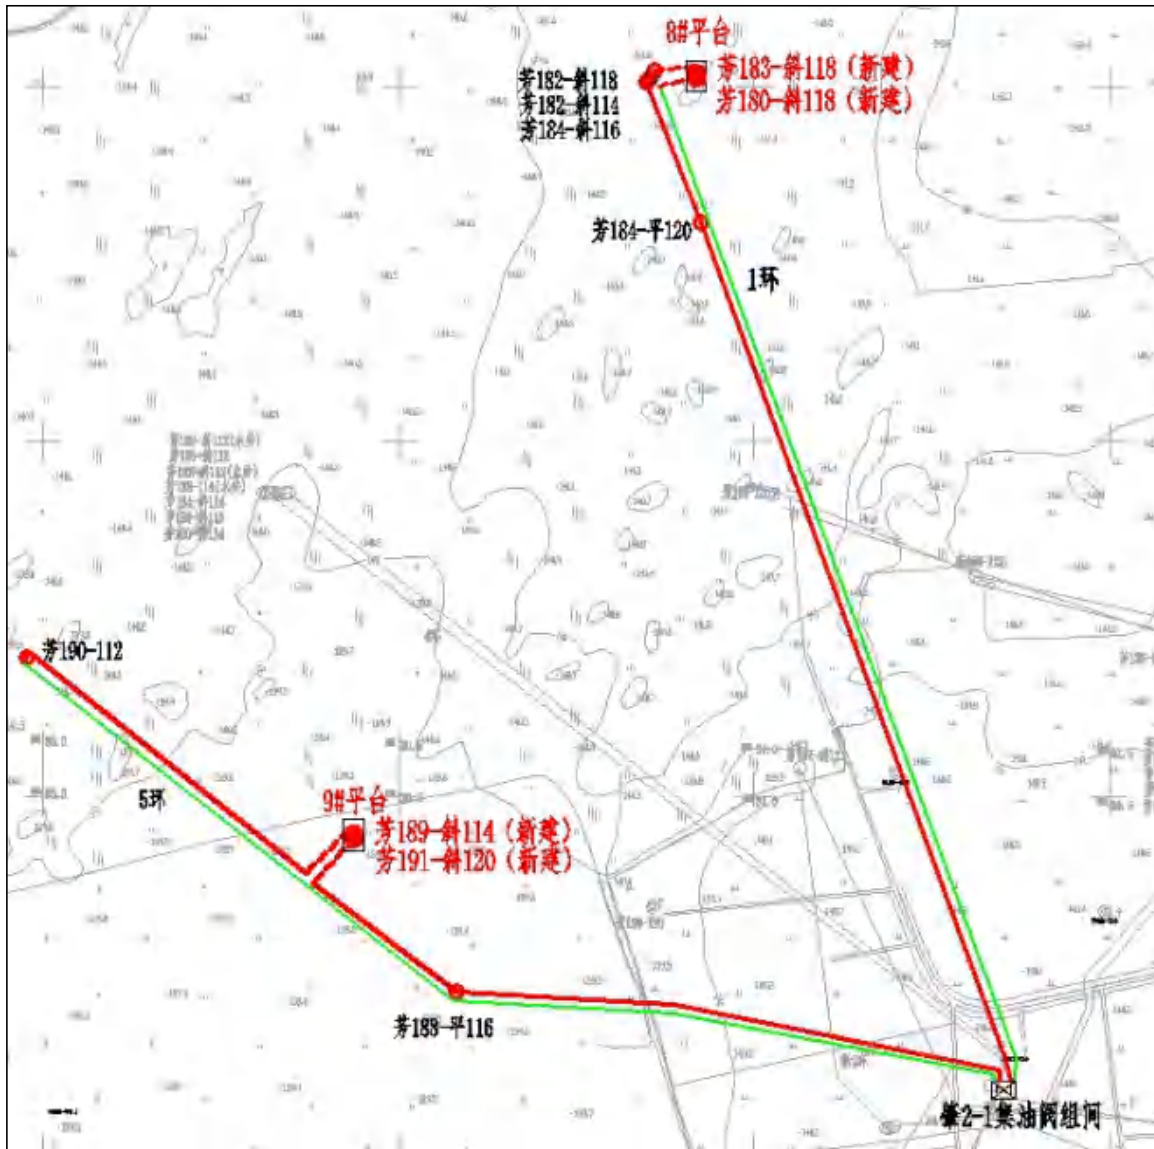


图 2-4-6 (7) 4 口井挂接肇 2-1 集油阀组间现有管线示意图

2.3.3 注水工程

本工程建设了转注水井 3 口，新建了注水管道 0.852km。

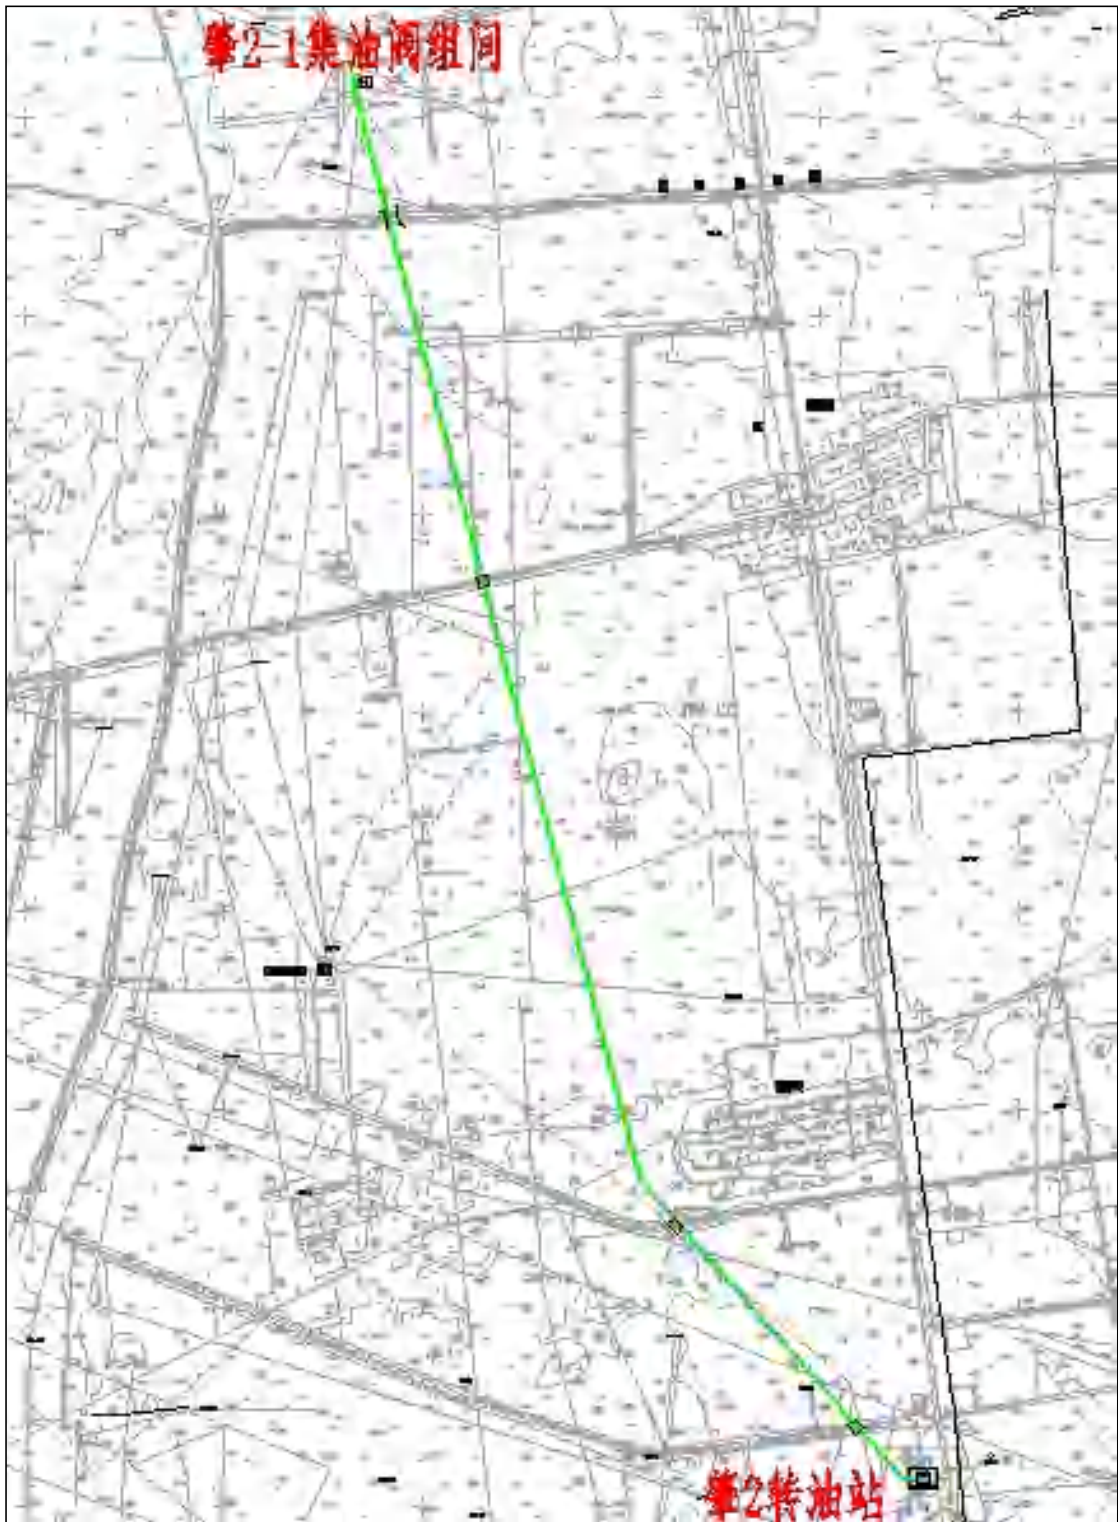


图 2-4-7（1） 更换肇 2-1 集油阀组间至肇 2 转油站间总掺水管线示意图



图 2-4-7 (2) 转注井注水管线路由示意图

2.3.4 场站扩建工程

(1) 宋 II-3 转油站更换 2 台 30m³/h 外输泵

该站已建外输泵 3 台，排量为 25m³/h 扬程 150m。本次将 3 台泵中的 2 台原地更换为 30m³/h 扬程 150m，次高年负荷率为 97.6%。

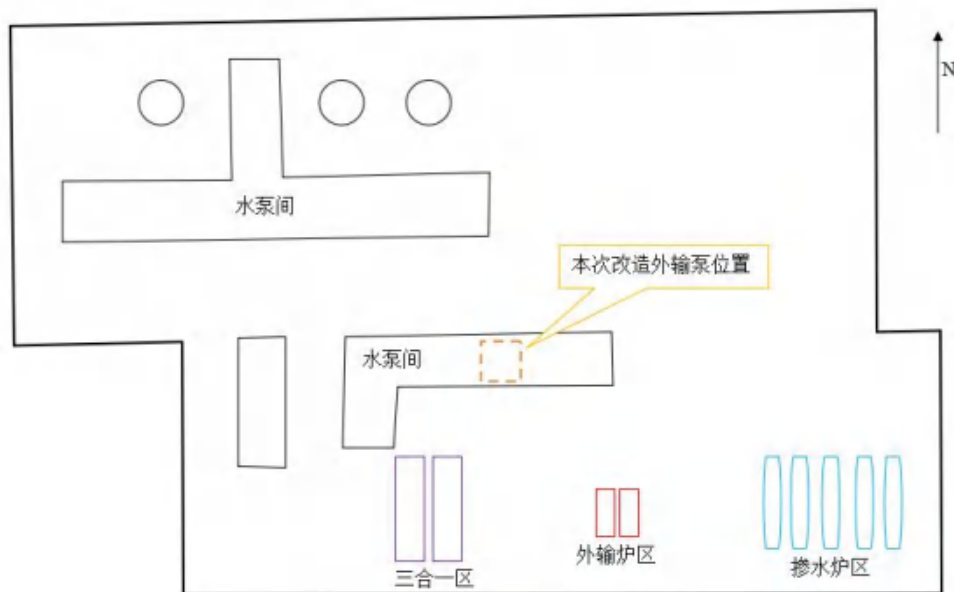


图 2-4-8 宋 II-3 转油站站内改造平面布置图

(2) 肇 2 转油站扩建 1 台 0.2MW 外输炉

肇2转油站目前有1.5MW相变高效掺水炉1台、1.5MW掺水炉1台、2.0MW掺水外输炉2台,2台掺水外输炉单台加热能力2.0MW(其中外输加热能力0.15MW、掺水加热能力1.85MW),用于外输液加热的能力共0.3MW,本次新增7口油井,扩建了0.2MW外输炉1台。

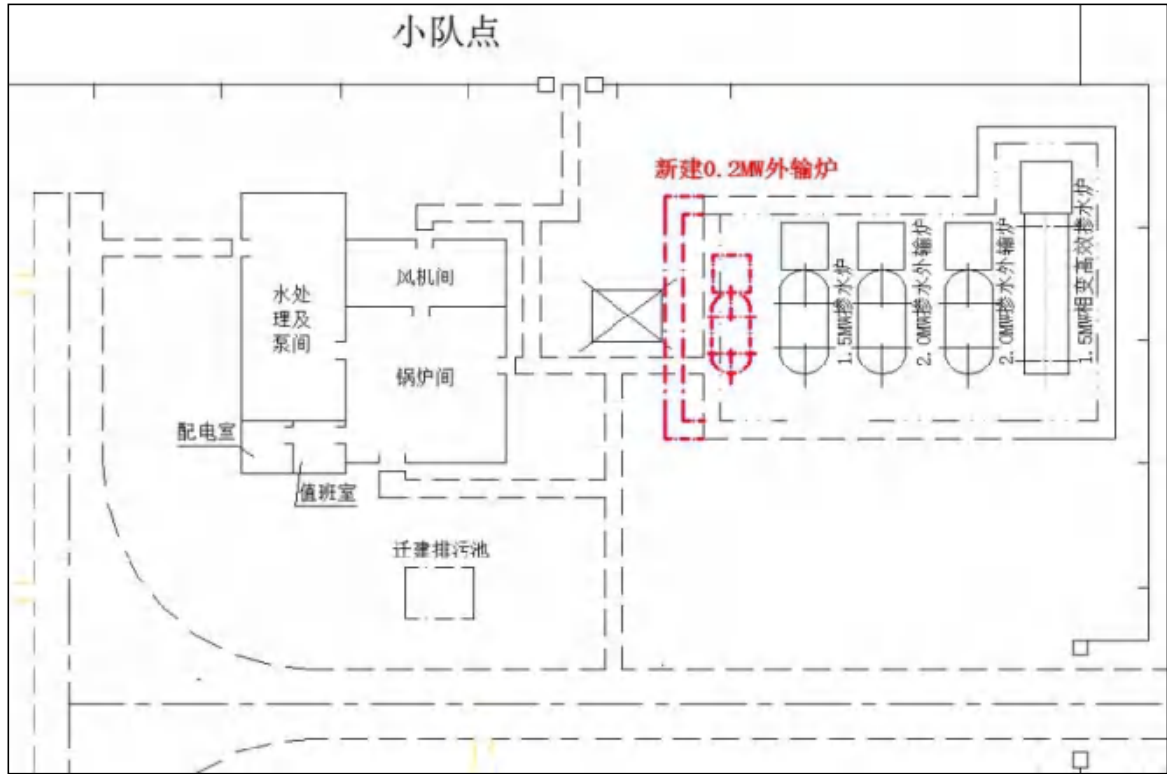


图2-4-9 肇2转油站站内改造平面布置图

2.3.5 道路工程

根据现场调查,本项目实际新建了3m宽砂石路3.3km,新建了4m宽土路0.06km,3.5m宽进井通道0.47km。

2.3.6 依托工程

本项目施工期管道施工产生的焊渣拉运至第八采油厂工业固废填埋场填埋处理,运营期依托场站为宋II-3转油站、宋II-4转油站、肇2转油站、肇一联合站、宋二联合站,依托的含油污泥处理站为大庆市庆兴环保科技有限公司,运营期油井作业产生的含油防渗布暂存在第八采油厂三矿危废暂存间。

2.3.6.1 宋II-3转油站

宋II-3转油站建于1994年,站内采用“三合一”处理工艺,处理后含水油输往宋二联。目前该站管辖油井226口(正常生产井199口),集油阀组间13座。

本次产能新增7口油井产液进入宋II-3转油站,另外2023年宋南零散补充区

块新增 11 口油井产液进入宋 II-3 转油站，新井投产后，该站将管辖油井 224 口，集油阀组间 13 座。投产后“三合一”加热装置负荷率最大为 66.8%，外输炉负荷率最大为 52.1%；外输泵投产第一年负荷率达到 104.5%，目前宋 II-3 转油站已建 3 台外输泵 $Q=25\text{m}^3/\text{h}$ $H=150\text{m}$ ，本次产能将其中 2 台外输泵原地更换为 $Q=30\text{m}^3/\text{h}$ $H=150\text{m}$ ，配套改造泵进出口工艺，更换后次高年负荷率为 97.6%，改造后本项目依托可行。

2.3.6.2 宋 II-4 转油站

宋 II-4 转油站建于 1996 年，站内采用“三合一”处理工艺，处理后含水油输往宋二联。目前管辖油井 216 口（正常生产井 197 口），集油阀组间 6 座。

本次产能新增油井 1 口，2023 年宋南零散区块新增油井 9 口，新井投产后，该站将管辖油井 226 口，集油阀组间 6 座，宋 II-4 转油站内各设备均满足需求，本项目依托可行。

2.3.6.3 肇 2 转油站

肇 2 转油站建于 2000 年，目前该站管辖油井 186 口（正常生产井 160 口），集油阀组间 8 座。站内采用“三合一+大罐沉降”处理工艺，处理后含水油输往肇一联。

本次产能新增 7 口油井产液进入肇 2 转油站，将 2 台外输泵更换为 $55\text{m}^3/\text{h}$ 、扬程 220m，在肇 2 转油站内新建 1 台 0.2MW 外输炉，建成后外输炉总负荷率为 61%，改造后本项目依托可行。

2.3.6.4 肇一联合站

肇一联脱水转油站建于 1999 年，肇一联合站采用三相分离器脱水工艺，除处理本站自身阀组来液外，还接收处理肇 2 转、肇 3 转、肇 4 转、肇 5 转、肇 6 转及华油公司的来液，外输至宋二联。其《肇州油田肇 40 区块葡萄花油层产能建设工程环境影响报告书》于 2008 年通过大庆市环境保护局审批（庆环建[2008]187 号），并于 2020 年通过环保验收（庆环验[2010]149 号）。

本项目新增油井 7 口产液进入肇一联处理后，外输炉负荷率为 98.6%，外输泵负荷率为 64.1%，扩建后设备能力满足要求。

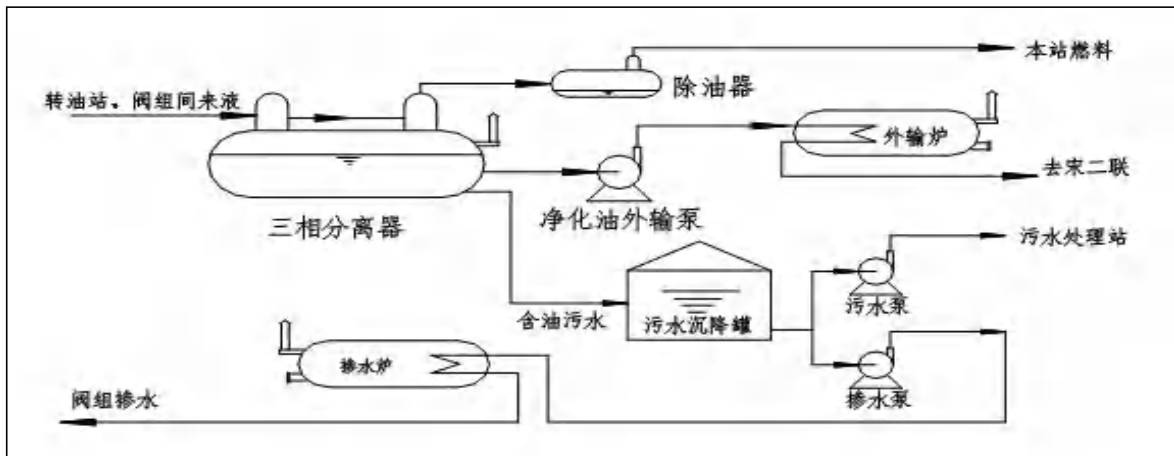


图 2.3-15 肇一联脱水站工艺流程图

肇一联污水站除处理本站自身阀组来液分离含油污水外，还接收处理肇 2 转、肇 3 转、肇 4 转、肇 5 转、肇 6 转及华油公司的来液分离的含油污水，本次油井新增污水量进入肇一联污水站处理，该站采用“两级沉降→两级过滤”工艺，出水水质满足“8、3、2”标准（含油量 $\leq 8.0\text{mg/L}$ ，悬浮固体含量 $\leq 3.0\text{mg/L}$ ，悬浮物颗粒直径中值 $\leq 2.0\mu\text{m/L}$ ），现含油污水处理量约为 $2460\text{m}^3/\text{d}$ ，本项目新增污水量最大为 $21.7\text{m}^3/\text{d}$ ，计入本次新增水量后，肇一联污水处理量最高污水处理负荷率为 95.6%，运营期油井采出水能够依托该场站处理。

2.3.6.5 宋二联合站

宋二联脱水站始建于 1994 年，为一段脱水转油站，1997 年扩建增加了电脱水工艺，目前站内除接收宋二转油站集油阀组来液外，还接收宋 II-3、宋 II-4、宋 II-5、肇 8、肇 35 转油站来液，以及转输中亚公司、永一联合站来净化油、肇一联合站来底含水油。其《肇州油田肇 40 区块葡萄花油层产能建设工程环境影响报告书》于 2008 年通过大庆市环境保护局审批（庆环建[2008]187 号），并于 2020 年通过环保验收（庆环验[2010]149 号）。

本项目 15 口油井产液进入该站后，游离水脱出器负荷率最大为 60.5%、电脱水器负荷率最大为 94.4%，脱水炉负荷率 73.2%，外输泵负荷率 60.9%，设备能力满足要求。

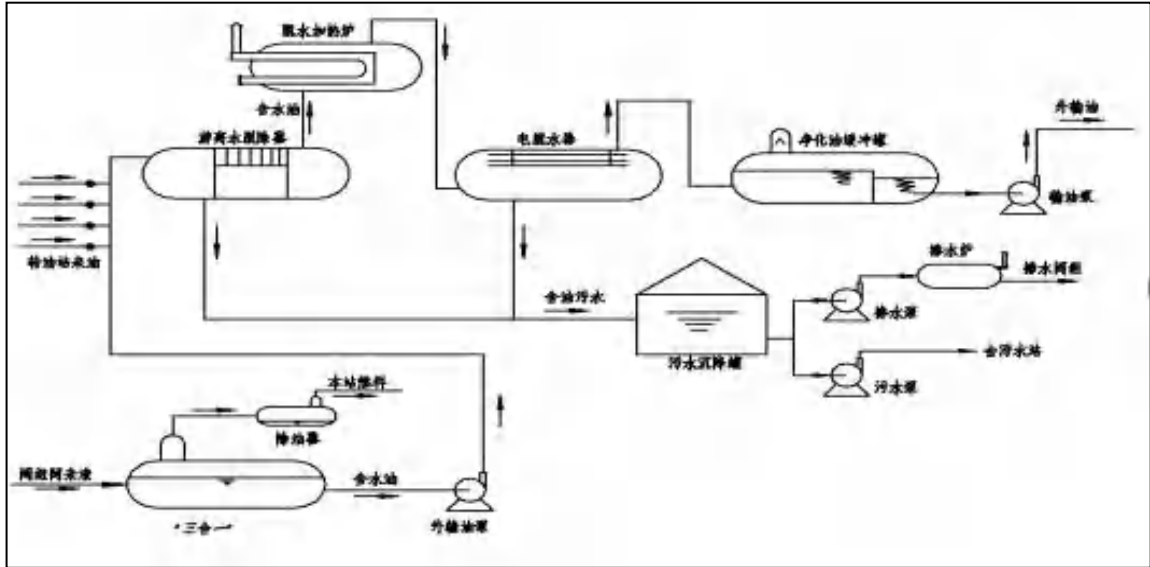


图 2.3-16 宋二联脱水站工艺流程图

宋二联含油污水处理站除处理宋二转油站集油阀组来液分离含油污水外，还接收宋 II-3、宋 II-4、宋 II-5、肇 8、肇 35 转油站、转输中亚公司、永一联合站来净化油、肇一联合站来底含水油分离的含油污水，该站采用“两级沉降→两级过滤”工艺，出水水质满足“8、3、2”标准（含油量 $\leq 8.0\text{mg/L}$ ，悬浮固体含量 $\leq 3.0\text{mg/L}$ ，悬浮物颗粒直径中值 $\leq 2.0\mu\text{m/L}$ ），现含油污水处理量约为 $2460\text{m}^3/\text{d}$ ，本项目新增污水量最大为 $46.5\text{m}^3/\text{d}$ ，计入本次新增水量后，宋二联污水处理量最高污水处理负荷率为 70.4%，运营期油井采出水能够依托该场站处理。

2.3.6.6 含油污泥处理站

本工程产生的含油污泥委托大庆市庆兴环保科技有限公司进行处理，处理协议见附件。

该站采用减量化处理装置生产线和序批式热解析装置生产工艺，含油污泥后泥渣含油量满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》（DB23/3104-2022）标准限值（石油类 $\leq 3000\text{mg/kg}$ ）综合利用。目前该站实际处理量约为 8 万 t/a，负荷率为 44.4%，依托可行。

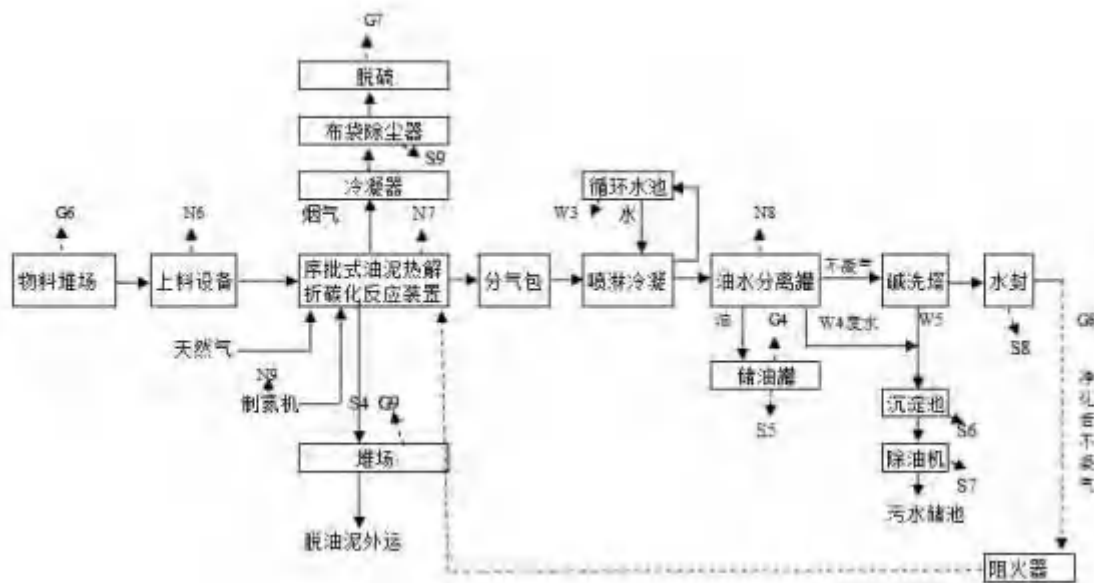


图 2.4-13 含油污泥处理工艺

2.3.6.7 工业固体废物填埋场

本项目施工期产生的一般工业固废依托第八采油厂工业固废填埋场处理。填埋场位于大庆市肇州县新福乡双龙山北侧 1.8km，乐业村东南 1.05km 处。占地 1.91hm²，填埋场总容量为 11624m³。其《第八采油厂工业固废填埋场工程环境影响报告书》于 2011 年通过大庆市环境保护局审批（庆环建[2011]171 号），并于 2014 年通过环保验收（庆环验〔2014〕38 号）。第八采油厂工业固废填埋场该填埋场现阶段运行稳定，目前实际容纳约 8800m³，剩余能力为 2824m³，本项目施工期管道施工废料产生量 0.03t（约 1m³），填埋场剩余容量能够容纳本项目产生的固体废物。第八采油厂工业固体废物填埋场依托可行。

2.3.6.8 第八采油厂三矿危废暂存间

第八采油厂三矿危废暂存间占地面积 200m²，室内净高 4.0m，地面、墙面全部进行了相应的防腐防渗和硬化处理，操作条件下的单位面积渗透量不小于厚度为 6m 粘土层、渗透系数不超过 10⁻⁷cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）。室内分为四个 40m² 区域分别存储硒鼓墨盒、废旧电瓶、实验室废液和含油废物，废旧电瓶和实验室废液存储区进行防腐防酸处理。该危废暂存间服务范围是整个八厂。其《第八采油厂三矿危险废物暂存项目报告表》于 2020 年通过大庆市肇州生态环境局审批（州环发[2020]17 号），已通过自主验收。目前三矿危废暂存间暂存废防渗布量为 8.47t，现有负荷为 21.18%，本项目废防渗布产生量 0.7t/a，新增本项目废防渗布后负荷为 22.9%，尚有足够余量能够满足本项目处置需求。

2.3.6.9 场站运行及实际负荷情况调查

根据调查，本项目验收阶段实际产油量 54.8t/d，实现建成产能 2.00×10^4 t/a（折算全年），油井生产状况正常，与项目有关的主要场站环评及验收情况详见表 2.3-5。

表 2.3-5 依托场站环评及验收情况一览表

序号	名称	环评文件名称	环评批复	竣工环保验收
1	宋 II-3 转油站	《宋芳屯油田芳 808、809 区块产能建设工程环境影响报告书》	庆环审[2015]192号	2019年1月完成自主验收
2	宋 II-4 转油站	《宋芳屯油田南部芳 156 加密区块钻井产能建设地面工程环境影响报告表》	庆环审[2020]19号-	2021年9月完成自主验收
3	肇 2 转油站	《宋芳屯油田宋南加密、248-124 以西产能建设地面工程》	庆环审[2020]21号	2021年8月完成自主验收
4	肇一联合站	《肇州油田肇 40 区块葡萄花油层产能建设工程环境影响报告书》	庆环建[2008]187号	庆环验[2010]149号
5	宋二联合站	《肇州油田肇 40 区块葡萄花油层产能建设工程环境影响报告书》	庆环建[2008]187号	庆环验[2010]149号
6	第八采油厂三矿危废暂存间	《第八采油厂三矿危险废物暂存项目报告表》	州环发[2020]17号	已完成组织验收
7	第八采油厂工业固废填埋场	《第八采油厂工业固废填埋场工程》	庆环建[2011]171号	庆环验（2014）38号

由上表可知，本项目依托的各场站均已进行了环境影响评价以及竣工环境保护验收，具备可依托性，且验收时负荷均可以满足正常生产的需要。

2.3.7 实际占地及取弃土情况调查

2.3.7.1 实际占地情况调查

本工程占地主要为管道、柱上变电站施工发生的临时占地，建设道路、柱上变电站产生的永久占地。

（1）临时占地

本项目新建了集油掺水管道共计 5.27km（集油、掺水管道同沟敷设）、总掺水管道 4.3km，注水管道 0.852km，施工作业面宽度为 10m，管道施工临时占用耕地（基本农田）面积为 3.307hm²、荒草地（非基本草原）面积为 4.48hm²。

单座柱上变电站占地面积 200m²（永久占地约 30m²，临时占地 170m²），本项目新建了 10 座柱上变电站，2 座占地类型为耕地、8 座占地类型为荒草地，柱上变电站占用临时耕地（基本农田）面积为 1360hm²、荒草地（非基本草原）面积为 340hm²。

(2) 永久占地

①道路

新建了3.5m宽砂石路0.16km，路基宽4.5m；新建了3.0m宽砂石路0.35km，路基宽3.5m；新建了4m宽土路0.33km、3.5m宽土路0.31km。其中0.16km砂石路占地为荒草地，其余占地为耕地，道路永久占用耕地（基本农田）0.363hm²、荒草地（非基本草原）面积为0.072hm²。

②柱上变电站

单座柱上变电站永久占地面积30m²，2座柱上变电站永久占用耕地（基本农田）0.006hm²、8座柱上变电站永久占用荒草地（非基本草原）0.034hm²。

本项目实际工程占地情况一览表见表2.4-6，本项目临时用地许可证见附件10。

表2.4-6 实际工程占地情况一览表

序号	建设项目	永久占地		临时占地	
		耕地（基本农田）	荒草地	耕地（基本农田）	荒草地
1	集油掺水管道	/	/	2.455	0.18
2	总掺水管道	/	/	/	4.3
3	注水管道	/	/	0.852	/
4	新建通井路	0.363	0.072	/	/
5	井场柱上变电站	0.024	0.006	0.136	0.034
合计		0.387	0.078	3.443	4.514
		0.465		7.957	
总计		8.422			

本项目实际占地与环评时期占地变化情况见表2.4-7。

表2.4-7 本项目实际占地与环评时期占地变化情况表 单位：hm²

占地		环评时期	实际占用	变化情况
永久占地	耕地	0.387	0.387	0
	草地	0.078	0.078	0
临时占地	耕地	3.443	3.443	0
	草地	4.514	4.514	0
总占地		8.422	8.422	0

2.3.6.2 取弃土情况调查

本项目取土主要用于井场、道路、配水间柱上变电站的垫高或筑高，借方均来自外购，不开辟取土场，本项目不产生弃土，永久占地内剥离表土用于周围土地复垦。工程取弃土情况详见表2.4-8。

表 2.4-8 工程取土情况与环评时期对比表 单位：m³

项目	挖方量		对比情况	填方量		对比情况	借方量		对比情况	弃方量		对比情况
	环评	验收		环评	验收		环评	验收		环评	验收	
管道施工	20000	20000	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0
道路	1204.5	1204.5	0	2409	2409	0	2409	2409	0	1204.5	1204.5	0
柱上变电站	90	90	0	180	180	0	180	180	0	90	90	0
总计	21294.5	21294.5	0	22589	22589	0	2589	2589	0	1294.5	1294.5	0

2.3.7 项目运营情况调查

本次产能实际基建油井 15 口、转注井 3 口，与环评时期一致。

本次验收根据建设单位提供的资料，本项目于 2024 年 5 月投产，实际生产数据与环评预测数据对比情况列于表 2.4-9。

表 2.4-9 项目实际与预测生产数据对比情况

项目	单位	计划值	实际值（折算全年）	变化情况
年产油量	10 ⁴ t/a	0.73	0.73	0
年产液量	10 ⁴ t/a	2.10	2.10	0
综合含水	%	65.0	65.0	0

2.4 污染源调查

根据本项目油田开发工艺流程，可将油田开发分为建设期、运行期二个阶段。不同开发阶段、不同工艺对环境产生的影响各不相同，其中地面工程、各种油水井维护作业和各种事故对环境的影响较大。现对油田各个阶段的主要工艺的污染源分析如下。

2.4.1 施工期污染源调查

2.4.1.1 环境影响因素调查

首先进行井台平整，平整井台后安装抽油机、采油树及电机，主要施工工序有紧固、平衡等。

施工期产污节点图见图 2.5-1。

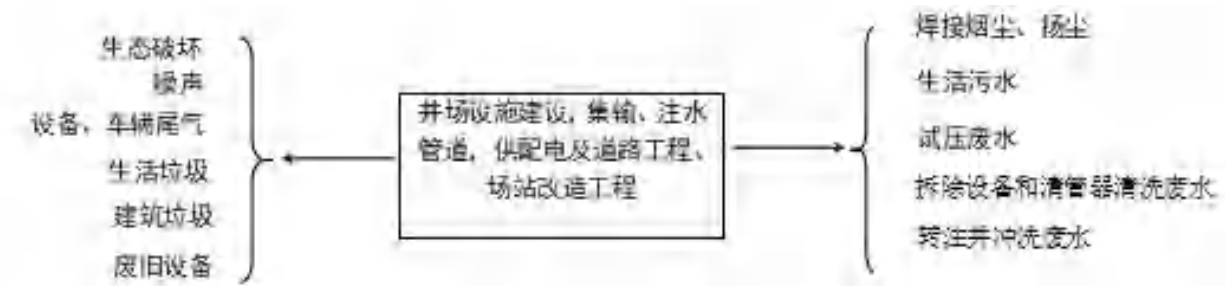


图 2.5-1 施工期工艺流程及产污节点图

2.4.1.2 污染物产生及排放情况调查

(1) 废气

施工期产生的大气污染物主要来源于施工时产生的扬尘、焊接烟尘、车辆尾气排放中的 CO、氮氧化物和碳氢化合物。经现场询问工作人员，本项目施工过程中，对易起尘的建筑材料加盖遮盖物，对进出的运输道路进行洒水抑尘，施工场地设置围护；车辆均为取得环保合格证的车辆，排放的尾气符合尾气排放要求。

由于这些影响都是暂时的，施工一结束就随之消失，对周围空气环境产生的影响较

小。

（2）废水

经调查，施工期废水包括管道试压废水、拆除设备和清管器清洗废水、转注井洗井废水以及生活污水。

①管道试压废水

本项目新建管道试压用水量为 50.73m^3 ，试压废水为用水量的95%，清管试压废水产生量为 48.19m^3 ，由罐车拉运至肇一联含油污水处理站处理，出水满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2012）标准要求：“含油量 $\leq 8\text{mg/L}$ 、悬浮固体含量 $\leq 3\text{mg/L}$ 、悬浮物颗粒直径中值 $\leq 2\mu\text{m}$ ”后回注地下开采油层。

②拆除设备和清管器清洗废水

转注井拆除的3个油井树、2台外输泵经蒸汽锅炉蒸汽清洗后，产生含油污水 4m^3 ，清洗过程中在现场钢槽中进行，清洗废水收集后经罐车拉运至肇一联含油污水处理站处理，出水满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2012）标准要求限值：“含油量 $\leq 8\text{mg/L}$ 、悬浮固体含量 $\leq 3\text{mg/L}$ 、悬浮物颗粒直径中值 $\leq 2\mu\text{m}$ ”后回注地下开采油层。

③转注井洗井废水

转注井洗井污水产生量约 $120\text{m}^3/\text{井}\cdot\text{次}$ ，本工程共3口转注井，约 $360\text{m}^3/\text{施工期}$ ，洗井污水经现场设置的污水回收装置回收后经罐车拉运至肇一联含油污水站处理，处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2012）标准要求：“含油量 $\leq 8\text{mg/L}$ 、悬浮固体含量 $\leq 3\text{mg/L}$ 、粒径中值 $\leq 2\mu\text{m}$ ”要求回注油层，不外排。

④生活污水

根据现场调查及资料查阅，本项目施工期生活污水产生量为 57.6t 。施工期生活污水排入了周边附近芳48集油阀组间、宋II-1-1集油阀组间、宋II-3-10集油阀组间、宋II-3-11集油阀组间、宋II-3-12集油阀组间已建防渗旱厕。

（3）噪声

本项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。具体排放情况见表2.4-2。

表 2.4-2 施工期噪声源统计表

序号	噪声源	距声源 (m)	噪声强度 dB (A)
1	挖掘机	5	82-90
2	吊装机	5	80-86
3	推土机	5	83-88
4	电焊机	5	90-96
5	冲击式钻机	5	88-92
6	压路机	5	80-90
7	混凝土振捣棒	5	80-88
8	重型运输车	5	82-90

(4) 固体废物

施工期间固体废物主要为管道施工废料、机泵更换过程中产生的建筑垃圾、设备拆除过程中产生的废旧设备、施工人员生活垃圾。

①管道施工废料

管道焊接过程中会产生焊渣，产生量约 0.03t，主要为焊接施工中产生废焊条和管道防腐施工过程中产生的废防腐材料施工废料，属于一般工业固废。送至了第八采油厂工业固废填埋场进行了处理。

②建筑垃圾

转注井拆除现有油井基础、机泵更换过程中会产生建筑垃圾，总计约 4m³。拉运至大同区建筑垃圾消纳场处理

③废旧设备

转注井拆除现有油井过程中会产生废井架、废井树（经蒸汽清洗后不含油）3套，机泵更换过程中产生废机泵（经蒸汽清洗后不含油）2台。拆除肇 2-1 计量间至肇 2 转油站间总掺水管道 4.3km。送八厂资产库。

④生活垃圾

本工程施工人员为 30 人，施工期 30 天，每人产生生活垃圾 0.5kg/d，施工期生活垃圾产生量为 0.45t，统一收集送至大庆城控电力有限公司焚烧处理，施工结束后场地无遗留。

2.4.2 运行期污染源调查

2.4.2.1 环境影响因素调查

本工程建设了 15 口油井中，7 口油井产液进入肇一联合站（转油放水站）进行初步脱水处理，低含水油进入宋二联进一步脱水处理，8 口油井产液进入宋二联进行脱水处理；产生的含油污水进入肇一联合站含油污水处理站、宋二联合站含油污水处理站处理站处理达

标后回注地下开采油层，分离产生的伴生气用于场站自耗。运营期正常工况产污节点图见下图 2.4-4。

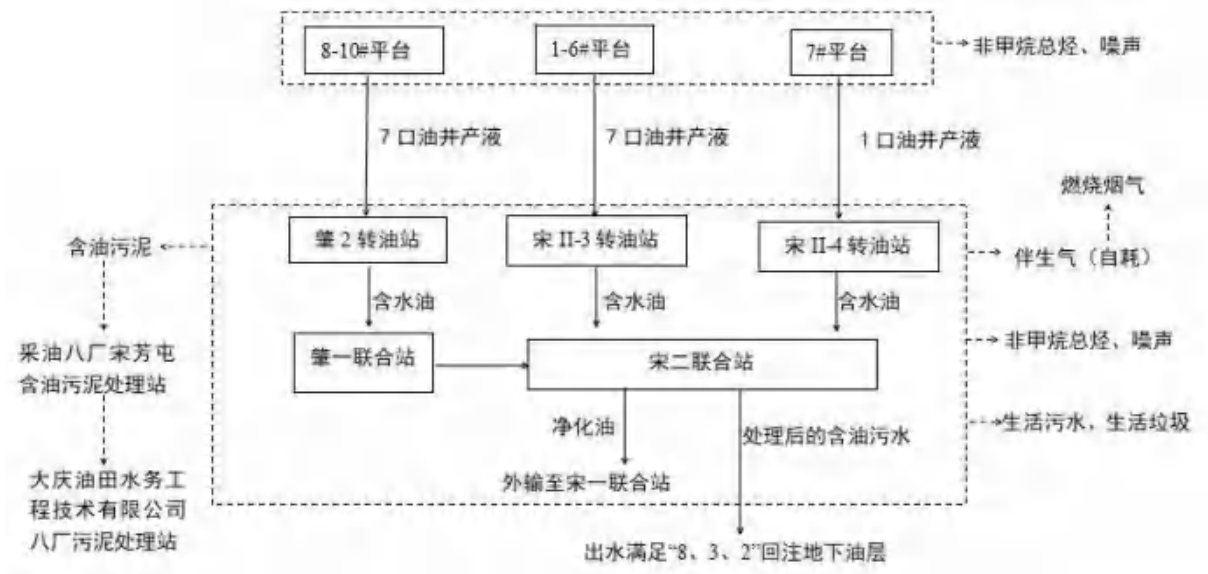


图 2.4-4 运行期工艺流程图

(1) 正常工况

本项目运行期的主要环境影响因素为现有加热炉新增负荷产生的燃烧烟气，油气集输过程中挥发的烃类气体，井场抽油机和站场机泵产生的噪声，本项目产液处理后产生的含油污水、含油污泥等。

(2) 非正常工况

油水井作业产生的作业污水、洗井污水、落地油、含油防渗布等。运营期非正常工况产污节点图见下图 2.5-5。



图 2.5-5 运营期非正常工况产污节点图

2.4.2.2 污染物产生及排放情况调查

(1) 废气

① 烃类气体

本工程油气集输全部采用密闭集油工艺流程，烃类气体的排放主要是某些设备的超压放空、储罐和管线的油气挥发以及天然气使用过程中的泄漏所致，主要排放地点为采

油井场及依托站场。

根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南(试行)》中石油化工业天然原油和天然气开采,石油开采挥发性有机物产生系数1.4175g/kg原油,本项目实际原油产量为 0.73×10^4 t/a,项目非甲烷总烃挥发量为10.35t/a,符合环评阶段提出的排放量控制指标要求。

②加热炉烟气

本工程在肇2转油站新增1台0.2MW外输炉,产生燃烧烟气。本项目油井产液在场站处理,增加了依托场站(宋II-3转油站、宋II-4转油站、肇一联脱水站、宋二联脱水站)加热炉烟气排放量。

本次验收选取各依托场站内加热炉进行现场监测,根据加热装置燃烧烟气的监测结果,NO_x、颗粒物、SO₂、烟气黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃气锅炉标准限值的要求,且烟囱高度均符合标准要求。

污染物排放浓度根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)并结合验收监测结果,污染物排放浓度取加权平均浓度,本项目分担烟气体量按照实际烟气体量计算,依托场站加热炉本项目废气污染物排放量(分担量)见表2.4-4。

表 2.4-4 依托场站加热炉本项目废气污染物排放量(分担量)

站场名称	烟气体量 (10 ⁴ m ³ /a)		污染物加权平均浓度 (mg/m ³)			污染物排放量(t/a)					
			SO ₂	NO _x	颗粒物	SO ₂		NO _x		颗粒物	
	环评	实际				环评	实际	环评	实际	环评	实际
宋II-3转	13.85	13.85	12	116	20	0.046	0.046	0.166	0.166	0.022	0.022
宋II-4转	1.92	1.92	12	116	20	0.004	0.004	0.024	0.024	0.003	0.003
肇2转	12.12	12.12	12	116	20	0.030	0.030	0.141	0.141	0.018	0.018
肇一联	11.09	11.09	12	116	20	0.019	0.019	0.185	0.185	0.032	0.032
宋二联	2.31	2.31	12	116	20	0.004	0.004	0.033	0.033	0.007	0.007
合计	41.29	41.29	/	/	/	0.103	0.103	0.549	0.549	0.082	0.082

(2) 废水

本项目运营期废水为油井采出水、生活污水。

根据建设单位提供资料,本项目油井产油量为 0.73×10^4 t/a(折算),产液量为 2.10×10^4 t/a(折算),则本项目产液分离出的含油污水量为14200t/a。油井采出液分离的含油污水经肇一联含油污水处理站、宋二联含油污水处理站处理达标后(含油 ≤ 8 mg/l,悬浮固体含量 ≤ 3 mg/l)回注地下,不外排。

②作业污水

井下作业是运营期主要污染环节之一。主要包括换泵换杆、修井等作业。产污环节主要是拆卸井口和油管起下过程中产生的污油污水、废液的返排、冒溢及滴漏等。

油井作业周期1.5年，作业污水产生量 $4\text{m}^3/\text{井次}$ ；水井作业周期2年，作业污水产生量 $60\text{m}^3/\text{井次}$ 。油井15口，水井3口，作业污水每年产生量为 $130\text{m}^3/\text{a}$ ，主要污染物为石油类、悬浮物，此部分污水通过作业污油污水回收装置回收，由罐车拉运到肇一联合油污水处理站处理达标后回注地下，不外排。

③洗井污水

本区块水井洗井周期1年，产生洗井污水为 $120\text{m}^3/\text{井次}$ ，共产生洗井污水量 $360\text{m}^3/\text{a}$ ，主要污染物为石油类、悬浮物，此部分污水通过作业污油污水回收装置回收，由罐车拉运到肇一联合油污水处理站处理达标后回注地下，不外排。

根据建设单位提供的资料，本工程于2024年5月投产，经与建设单位核实，本项目投产至今，尚未有油水井进行作业、洗井。

（3）地下水防渗

本项目集油管道采用了内缠胶带硬质聚氨酯泡沫黄夹克管，注水管道采用了防腐无缝钢管，连接方式为焊接，防渗性能满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区防渗要求：等效黏土防渗层 $M_b \geq 6.0\text{m}$ ， $K \leq 1.0 \times 10^{-7}\text{cm/s}$ 。

油水井作业时按照重点防渗区要求进行重点防渗，铺设2mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗布，使其防渗性能达到等效黏土防渗层：等效黏土防渗层 $M_b \geq 6\text{m}$ ， $K \leq 1.0 \times 10^{-7}\text{cm/s}$ 。井场地面、配水间内部地面属于简单防渗，井场地面平整夯实、配水间地面一般硬化。

（4）噪声

本项目噪声源主要是抽油机、依托场站等各类机泵产生的噪声等，噪声源强为70-100dB（A）。井场抽油机设置减震基础、依托场站机泵设置减震基础、隔声门窗。

（5）固体废物

油田运营过程中产生的固体废弃物为油井作业产生的落地油、废防渗布，各种处理设施产生的油泥（砂）等。本项目不新增加生产人员，不增加生活垃圾的产生量和排放量。

①油泥（砂）

根据现场调查及建设单位提供的资料，生产万吨原油的排泥量（固相）约为0.3t，本项目实际折算全年原油产量为 $0.73 \times 10^4\text{t/a}$ ，则油泥（砂）产生量约为0.219t/a（折算

全年）。

本项目依托站场产生油泥落地油拉运委托大庆市庆兴环保科技有限公司进行处理，处理后泥渣含油量满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》（DB23/T3104-2022）标准限值（石油类 $\leq 3000\text{mg/kg}$ ）。

②落地油

根据建设单位提供的资料，本工程 15 口油井于 2024 年 5 月投产，经与建设单位核实，本项目投产至今，尚未有油井进行作业，因此未产生落地油。

待日后产生后，落地油回收后经罐车运至大庆市庆兴环保科技有限公司进行处理。

③含油防渗布

油水井作业、水井洗井时候均需敷设防渗布，防止原油、含油污水散落于井场内，循环使用，一旦发生泄漏等情况，防渗布沾染油品，则作为含油废防渗布处理。

根据建设单位提供的资料，本工程于 2024 年 5 月投产，经与建设单位核实，本项目投产至今，尚未有油水井进行作业、洗井作业，未产生含油防渗布。

待后期作业产生的含油废防渗布统一回收后，收集后在钢制危废暂存桶，油井作业结束后，暂存在第八采油厂三矿危废暂存间，定期委托黑龙江兰溪谷环保科技发展公司转运处理。

2.4.3 污染源产生及排放情况

本项目主要污染物产生及排放情况见表 2.4-7。

表 2.4-7 本项目主要污染物产生及排放情况表

类型	污染源	污染物名称	环评阶段		验收阶段
			排放浓度及排放量	环保措施	
大气污染物	施工现场	扬尘	场界扬尘外浓度 <1.0mg/m ³	洒水抑尘，加盖防尘布，车辆采取密闭措施	与环评一致
	依托场站 (分担量)	SO ₂	0.103t/a	使用天然气或伴生气为原料，燃气加热炉排气筒不低于 8m	0.103t/a
		NO _x	0.549t/a		0.549t/a
		颗粒物	0.082t/a		0.082t/a
井场无组织排放	NMHC	10.35t/a	集输设备加强密封、及时更换垫片	10.35t/a，处置措施与环评一致	
水污染物	施工现场	试压废水	48.19t	由罐车拉运至肇一联合含油污水处理站处理	48.19t，处置措施与环评一致
		设备清洗废水	4m ³	经罐车拉运至肇一联合含油污水处理站处理	4m ³ ，处置措施与环评一致
		洗井废水	360m ³	经罐车拉运至肇一联合含油污水站处理	360m ³ ，处置措施与环评一致
	施工营地	生活污水	57.6t	进入周边肇 4-4 计量间、肇 5-1 计量间、肇 6-6 计量间等已建防渗旱厕	57.6t，处置去向与环评时期一致
	运营期	油田采出水	14200m ³ /a	含油污水分别管输至肇一联合含油污水处理站、宋二联合含油污水处理站处理达标后回注	14200m ³ /a，处置措施与环评一致
		油水井作业污水	130m ³ /a	经现场设置的污水回收装置回收后经罐车拉运至肇一联合含油污水站处理	本项目投产至今，油水井未进行作业；作业污水、洗井污水待产生后送至肇一联合含油污水处理站处理达标后回注
洗井污水		360m ³ /a			
固体废物	管道施工	管道施工废料	0.03t	拉运至第八采油厂工业固体废物填埋场填埋处理。	0.03t，处置去向与环评一致
	施工场地	建筑垃圾	4m ³	拉运至第八采油厂工业固体废物填埋场填埋处理。	4m ³ ，处置去向与环评一致
		废旧设备	2 台机泵、3 套井架	回收至第八采油厂物资资产库	2 台机泵、3 套井架，处置去向与环评一致
		生活垃圾	0.45t	拉运至肇州县生活垃圾场填埋处理	0.45t，处置去向与环评一致
	井场作业	落地油	/	拉运至第八采油厂宋芳屯含油污泥处理站减量化处	油井未进行作业，尚未产生落地油，待产生后

2023年州20区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目竣工环境保护验收调查报告

				理后，拉运至大庆市云泰石化产品有限公司八厂污泥处理站处理	拉运至大庆市庆兴环保科技有限公司进行处理
		含油废防渗布	/	集中收集后，委托资质单位处理	油井未进行作业，尚未产生含油废防渗布，待产生后委托大庆市庆兴环保科技有限公司进行处理
噪声	<p>施工过程中施工机械主要有挖掘机、电焊机以及运输车辆，这些机械运行时产生的噪声源强为70-100dB（A）。经合理安排施工时间、隔声、距离衰减后等措施后满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准。运行期井场抽油机选用低噪音设备、定期维护，依托站场各种机泵置于厂房内，并采取减振降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。</p>				与环评一致，根据现场调查，项目建设期间无噪声扰民投诉事件
生态	<p>临时占用土地进行平整翻松，表土留存，分层回填，对占地覆土平整，不改变原有地势</p>				临时占地已平整恢复，土地不改变原貌

2.5 项目变更情况调查

本项目实际工程量变化情况见表 2.5-1。

表 2.5-1 本项目实际工程量变化情况

类别	环评计划建设内容	实际建设内容	变化情况
产能	<p>本项目基建油井 15 口，形成 10 座丛式平台井。其中，芳 168-斜 140、芳 172-斜 141、芳 176-斜 138、芳 171-斜 126、芳 177-斜 122、芳 182-斜 110 挂接在老平台建设。</p> <p>油井采用抽油机采油方式（CYJY8-3-37HB 型抽油机 15 台），建成后产能 $0.73 \times 10^4 \text{t/a}$。</p> <p>本次产能共基建注水井 3 口（转注井），注入水质为深度处理水，10 年内最高井口注水压力为 14.5MPa，平均单井注水量为 $13\text{-}15 \text{m}^3/\text{d}$。</p>	<p>本项目实际基建了油井 15 口，形成了 10 座丛式平台井。其中，芳 168-斜 140、芳 172-斜 141、芳 176-斜 138、芳 171-斜 126、芳 177-斜 122、芳 182-斜 110 挂接在老平台建设。</p> <p>油井采用了抽油机采油方式（CYJY8-3-37HB 型抽油机 15 台），建成后产能 $0.73 \times 10^4 \text{t/a}$。</p> <p>本次产能实际基建了注水井 3 口（转注井），注入水质为深度处理水，10 年内最高井口注水压力为 14.5MPa，平均单井注水量为 $13\text{-}15 \text{m}^3/\text{d}$。</p>	与环评时期一致，基建油井总数不变，折算全年产能不变。
规模	<p>本项目采用单管环状集油掺水工艺，新建井产液就近接入周围已建集油阀组间。新建单井集油掺水管道 5.27km（$\Phi 76 \times 4.5\text{-}4.45 \text{km}$、$\Phi 60 \times 3.5\text{-}0.82 \text{km}$）。</p> <p>其中：1#平台~6#平台共计 7 口油井产液进入宋 II-3 转油站初步处理后，进入宋二联脱水站进行脱水处理。7#平台 1 口油井产液进入宋 II-4 转油站初步处理后，进入宋二联脱水站进行脱水处理。</p> <p>8#平台~10#平台共 7 口油井产液进入肇 2 转油站初步处理后，进入肇一联脱水站处理，低含水油进入宋二联脱水站进行脱水处理。</p> <p>集油掺水管道埋深 2.0m，管道材质为内缠胶带硬质聚氨酯泡沫黄夹克管，管道铺设涉及钢顶穿跨越 6 处乡道。</p> <p>新建单井注水管道 0.852km（$\Phi 48 \times 6$），管道材质采用防腐钢管，管道埋深 2.5m。</p> <p>更换肇 2 转油站至肇 2-1 集油阀组间总掺水管道 4.3km（$\Phi 114 \times 4.5$），管道埋深 2.5m，管道敷设利旧钢过桥 1 处，钢顶穿越 6 处乡道。</p>	<p>本项目采用了单管环状集油掺水工艺，新建了井产液就近接入周围已建集油阀组间。新建了单井集油掺水管道 5.27km（$\Phi 76 \times 4.5\text{-}4.45 \text{km}$、$\Phi 60 \times 3.5\text{-}0.82 \text{km}$）。</p> <p>其中：1#平台~6#平台共计 7 口油井产液进入宋 II-3 转油站初步处理后，进入宋二联脱水站进行脱水处理。7#平台 1 口油井产液进入宋 II-4 转油站初步处理后，进入宋二联脱水站进行脱水处理。</p> <p>8#平台~10#平台共 7 口油井产液进入肇 2 转油站初步处理后，进入肇一联脱水站处理，低含水油进入宋二联脱水站进行脱水处理。</p> <p>集油掺水管道埋深 2.0m，管道材质为内缠胶带硬质聚氨酯泡沫黄夹克管，管道铺设涉及钢顶穿跨越 6 处乡道。</p> <p>新建了单井注水管道 0.852km（$\Phi 48 \times 6$），管道材质采用了防腐钢管，管道埋深 2.5m。</p> <p>更换了肇 2 转油站至肇 2-1 集油阀组间总掺水管道 4.3km（$\Phi 114 \times 4.5$），管道埋深 2.5m，管道敷设利旧钢过桥 1 处，钢顶穿越 6 处乡道。</p>	与环评时期相一致。
地点	黑龙江省大庆市肇州县新福乡境内。	黑龙江省大庆市肇州县新福乡境内。	与环评时

			期相一致，不涉及保护目标增加。
生产工艺	<p>本项目共基建油井15口，均为斜井；其中9口油井形成新丛式井平台4座，其余6口新井挂接老井平台6座。本次产能15口油井均分布在宋II-3转、宋II-4转、肇2转油站周围，可搭接已建集油系统，全部采用单管环状掺水集油工艺。</p>	<p>本项目共基建了油井15口，均为斜井；其中9口油井形成新丛式井平台4座，其余6口新井挂接老井平台6座。本次产能15口油井均分布在宋II-3转、宋II-4转、肇2转油站周围，可搭接已建集油系统，全部采用单管环状掺水集油工艺。</p>	与环评时期相一致。
环保工程	<p>(1) 井场、管线、道路施工现场洒水抑尘，表土及建材堆放设置挡风板、上覆遮盖材料，施工运输车辆采取密闭措施或加盖防尘布。车辆和施工机械选用优质汽油及柴油。</p> <p>15口油井产液依托肇一联合站、宋二联合站，场站加热装置采用清洁能源天然气（油田伴生气），产生的燃烧废气经8-23m高烟囱外排。</p> <p>井场井口安装密封垫，油气集输过程采用密闭措施，大量减少挥发性有机气体的无组织挥发。</p> <p>(2) 集油管线试压废水产生量为48.19m³，由罐车拉运至肇一联合站污水处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）限值：“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2μm”后回注现役油层。</p> <p>转注井洗井废水量为120m³/井次，施工期3口转注井洗井废水量为360m³。由罐车拉运至肇一联合站污水处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）限值：“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2μm”后回注现役油层。</p> <p>施工期共产生生活污水19.2m³。施工期生活污水进入附近芳48集油阀组间、宋II-1-1集油阀组间、宋II-3-10集油阀组间、宋II-3-11集油阀组间、宋II-3-12集油阀组间已建旱厕，定期清掏外运用作农家肥。</p> <p>油井作业污水由罐车拉运至肇一联合站污水处理站处理，出水水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）中含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、悬浮物颗粒直径中值≤2μm要求后，回注地下开采油</p>	<p>(1) 井场等施工现场洒水消尘，表土及建材堆放上覆遮盖了材料，施工运输车辆采取了密闭措施或加盖防尘布。</p> <p>15口油井产液依托肇一联合站、宋二联合站，场站加热装置采用清洁能源天然气（油田伴生气），产生的燃烧废气经8-23m高烟囱外排。</p> <p>井场井口安装了密封垫，油气集输过程采用了密闭措施，大量减少了挥发性有机气体的无组织挥发。</p> <p>集油管线试压废水由罐车拉运至肇一联合站污水处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2012）标准要求：“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2μm”后回注现役油层。</p> <p>转注井洗井废水量由罐车拉运至肇一联合站污水处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2012）标准要求：“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2μm”后回注现役油层。</p> <p>施工期生活污水进入附近芳48集油阀组间、宋II-1-1集油阀组间、宋II-3-10集油阀组间、宋II-3-11集油阀组间、宋II-3-12集油阀组间已建旱厕，定期清掏外运用作农家肥。</p> <p>油井作业污水由罐车拉运至肇一联合站污水处理站处理，出水水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2012）标准中含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、悬浮物颗粒直径中值≤2μm要求后，回注地</p>	与环评时期相一致。

<p>层。</p> <p>运营期依托的肇一联合站、宋二联合站，均无新增劳动定员，无新增生活污水。运营期15口油井采出液进入肇一联、宋二联脱水站处理，其脱出的含油污水由管道输送至肇一联、宋二联含油污水处理站，出水水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）中含油量$\leq 8\text{mg/L}$、悬浮固体含量$\leq 3\text{mg/L}$、悬浮物颗粒直径中值$\leq 2\mu\text{m}$要求后，回注地下开采油层。</p> <p>（3）选用低噪声设备；定期维护保养设备，加强施工管理工作，车辆减速慢行。</p> <p>抽油机尽可能选用低噪声设备；并采用减振等降噪措施；注意对设备的维护保养，保证设备保持在最佳运行状态，降低噪声源强度。</p> <p>（4）管道施工产生的焊渣量0.03t，为一般固体废物，拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。</p> <p>转注井拆除现有油井基础、机泵更换过程中会产生建筑垃圾，总计约4m^3。</p> <p>转注井拆除现有油井过程中会产生废井架、废井树（经蒸汽清洗后不含油）3套，机泵更换过程中产生废机泵（经蒸汽清洗后不含油）2台。</p> <p>生活垃圾总量约0.45t，统一收集至各井场生活垃圾存放点，拉运至肇州县生活垃圾填埋场填埋处理</p> <p>落地油及含油污泥统一收集后拉运至第八采油厂宋芳屯含油污泥处理站减量化处理后，委托大庆市云泰石化产品有限公司处理，处理后泥渣含油量满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》（DB23/T3104-2022）标准限值（石油类$\leq 3000\text{mg/kg}$）。</p> <p>含油废弃防渗布统一收集后，暂存在第八采油厂三矿危废暂存间后，委托有资质单位进行处置。</p> <p>（5）施工期作业带清理、管沟开挖、道路的建设对土壤造成扰动和植被的破坏，项目施工期均在临时占地内进行施工，并且施工结束后及时清理施工现场，对临时占用的</p>	<p>下开采油层。</p> <p>运营期依托的肇一联合站、宋二联合站，均无新增劳动定员，无新增生活污水。运营期15口油井采出液进入肇一联、宋二联脱水站处理，其脱出的含油污水由管道输送至肇一联、宋二联含油污水处理站，出水水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2012）标准要求含油量$\leq 8\text{mg/L}$、悬浮固体含量$\leq 3\text{mg/L}$、悬浮物颗粒直径中值$\leq 2\mu\text{m}$要求后，回注地下开采油层。</p> <p>（3）施工期：合理安排了施工进度，避免了大量高噪声设备同时施工；施工期选用了低噪声设备，距离本项目较近的敏感目标为肇51-33转注井北侧50m赵文华屯、肇一联合站至宋二联合站外输油管道东侧140m小场子附近施工时设置了2m高移动式隔声屏障（隔声量大于20dB(A)）；定期对施工设备进行了保养维护，保证了设备保持在最佳运行状态，降低了噪声源强度，运输车辆避开了居民区的路线。</p> <p>运营期：抽油机、外输泵、加热炉选用了低噪声设备；并采用了减振、隔声等降噪措施；对设备的维护保养，保证了设备保持在最佳运行状态，降低了噪声源强度。</p> <p>（4）管道施工废料属于一般固废，拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。</p> <p>设备拆除产生的建筑垃圾送市政指定地点填埋。</p> <p>拆除机泵、油井树等设备（蒸汽冲洗后不含油）拉运到大庆模范屯油田有限责任公司资产回收库。</p> <p>施工人员产生的生活垃圾分类收集后，拉运至肇州县生活垃圾填埋场填埋处理。</p> <p>落地油及含油污泥统一收集后拉运委托大庆市庆兴环保科技有限公司进行处理，处理后泥渣含油量满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》（DB23/T3104-2022）标准限值（石油类$\leq 3000\text{mg/kg}$）。</p> <p>含油废弃防渗布统一收集后，暂存在第八采油厂三矿危废暂存间后，委托黑龙江兰溪谷环保科技发展公司转运处理。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>18.449hm²耕地进行复垦，1.567hm²草地进行播撒草籽。</p> <p>(6) 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目进行分区防渗：</p> <p>地下管道壁厚的腐蚀余量大于2mm并采用管道内防腐；管道的外防腐等级采用特加强级；管道的连接方式采用焊接，防渗性能等效黏土防渗层 Mb≥6m、K≤1.0×10⁻⁷cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中重点防渗区的要求。</p> <p>油水井作业井场铺设1.5mm厚、渗透系数为1.0×10⁻¹³cm/s的防渗土工布进行防渗处理，防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7中的防渗技术要求，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、K≤1.0×10⁻⁷cm/s。产生的作业污水经罐车拉运至肇一联含油污水处理站处理达标后回注现役油层。肇2转油站新建外输炉下方表土进行夯实，表土结构层下铺设厚1.5mm高密度聚乙烯(HDPE)土工膜构筑防渗层。防渗性能均满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求：在一般防渗区地面铺设 Mb≥1.5m，K≤1.0×10⁻⁷cm/s的防渗性能的黏土层。</p> <p>油水井井场采取地面平整夯实，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中一般地面硬化的要求。</p> <p>依托3口村屯地下水井，定期对地下水进行跟踪监测：</p> <p>在项目区域上游依托张辉屯水井(125.148719；45.864802)布设1个潜水背景值监测水井，在区域内依托温家屯水井(125.135818；45.850905)、区域下游依托三分场水井(125.101552；45.813277)布设1口潜水跟踪监测水井，定期对地下水进行跟踪监测。</p>	<p>(5) 施工期作业带清理、管沟开挖、道路的建设对土壤造成扰动和植被的破坏，项目施工期均在临时占地内进行施工，并且施工结束后及时清理施工现场，对临时占用的18.449hm²耕地进行了复垦，1.567hm²草地进行了播撒草籽。</p> <p>(6) 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目进行了分区防渗：</p> <p>地下管道壁厚的腐蚀余量大于2mm并采用了管道内防腐；管道的外防腐等级采用了特加强级；管道的连接方式采用了焊接，防渗性能等效黏土防渗层 Mb≥6m、K≤1.0×10⁻⁷cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中重点防渗区的要求。</p> <p>油水井作业井场铺设1.5mm厚、渗透系数为1.0×10⁻¹³cm/s的防渗土工布进行了防渗处理，防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7中的防渗技术要求，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、K≤1.0×10⁻⁷cm/s。产生的作业污水经罐车拉运至肇一联含油污水处理站处理达标后回注现役油层。肇2转油站新建外输炉下方表土进行了夯实，表土结构层下铺设厚1.5mm高密度聚乙烯(HDPE)土工膜构筑防渗层。防渗性能均满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求：在一般防渗区地面铺设 Mb≥1.5m，K≤1.0×10⁻⁷cm/s的防渗性能的黏土层。</p> <p>油水井井场采取了地面平整夯实，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中一般地面硬化的要求。</p> <p>依托3口村屯地下水井，定期对地下水进行跟踪监测：在项目区域上游依托张辉屯水井(125.148719；45.864802)布设1个潜水背景值监测水井，在区域内依托温家屯水井(125.135818；45.850905)、区域下游依托三分场水井(125.101552；45.813277)布设1口潜水跟踪监测水井，定期对地下水进行跟踪监测。</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

本项目实际建设与环评阶段相比，综合整体建设情况本项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护措施与环评一致，且运行期未有新增污染源。对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）有关规定中对于建设项目重大变动的界定“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动”。及根据《石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）：“陆地油气开采区块项目环评批复后，产能总规模、新钻井总数量增加 30%及以上，回注井增加，占地面积范围内新增环境敏感区，井位或站场位置变化导致评价范围内环境敏感目标数量增加，开发方式、生产工艺、井类别变化导致新增污染物种类或污染物排放量增加，与经批复的环境影响评价文件相比危险废物实际产生种类增加或数量增加、危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重，主要生态环境保护措施或环境风险防范措施弱化或降低等情形，依法应当重新报批环评文件”。

本项目不属于重大变动，可以开展项目验收调查工作。

3 环境影响报告书结论及批复回顾

3.1 环境影响报告书主要结论

2022年3月，黑龙江环盛环保科技开发有限公司编制了《2023年州20区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目环境影响报告书》，其主要结论及批复如下：

3.1.1 工程建设基本内容及投资

大庆模范屯油田有限责任公司拟建的2023年州20区块（合作）葡萄花油层产能建设工程（合作）项目，为改扩建工程，位于大庆市肇州县新福乡境内，油田开发区域中心坐标：E125.131431，N45.845292。

工程内容基建油水井18口（其中油井15口，共形成10座丛式平台井，其中6口井挂接老平台；转注井3口），建成后产能 $0.73 \times 10^4 \text{t/a}$ 。新建集油掺水管道5.27km、注水管道0.852km、更换肇2-1集油阀组间至肇2转油站间总掺水管道4.3km，新建通井路等道路31.15km，新建井场柱上变10座，新建10kV线路1.26km，扩建宋II-3转油站（更换2台 $30 \text{m}^3/\text{h}$ 外输泵），扩建肇2转油站（扩建1台0.2MW外输炉）等，永久占地 0.465hm^2 ，临时占地 7.957hm^2 ，总投资1950万元，其中环保投资86.7993万元。

3.1.2 环境现状评价结论

（1）空气环境质量现状

本项目位于达标区，评价区域环境空气监测点位 SO_2 、 NO_2 、 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、 CO 、 O_3 、TSP浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，非甲烷总烃浓度优于《大气污染物综合标准详解》中规定的小时均值 $2.0 \text{mg}/\text{m}^3$ 要求，工程所在地区环境空气质量总体状况良好。

（2）地表水环境

西大干渠 $\text{pH}7.8-8.0$ ， $\text{COD}_{\text{Cr}}101-111 \text{mg}/\text{L}$ ，氨氮 $0.763-0.774 \text{mg}/\text{L}$ ，高锰酸盐指数 $8.5-8.8 \text{mg}/\text{L}$ ，石油类、硫化物、挥发酚均未检出。

（3）地下水环境

根据现状地下水监测数据可知，第四系孔隙潜水水质除部分监测点位锰超标外均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准要求。地下水承压水水环境质量均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准；石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值（ $\leq 0.05 \text{mg}/\text{L}$ ）。

（4）声环境

监测结果显示，评价区域内声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，太平岭、东太平山村、三新村声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，现状良好。

（5）土壤

本次评价期间对拟建井场及周边农田土壤环境进行监测，结果表明项目拟建井场占地内土壤满足《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用土壤污染风险筛选值（基本项目）中第二类用地筛选值标准，以及表2（其他项目）中第二类用地筛选值标准；评价范围内耕地土壤满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤风险筛选值（基本项目）中标准。

（6）生态

该区以农田生态系统为主，兼有草原的复合生态系统，与原生草原生态系统相比，整个生态系统的生产力有较大程度的提高，农田土壤肥力增强，但由于人工耕作，农药等有毒有害成份有所增加。由于本地区气候干旱、多风沙等气候特点，对土壤固持能力降低，春季干旱时调节气候的能力降低。

3.1.3 环境影响评价结论

（1）大气环境影响

施工期产生的扬尘通过洒水抑尘、临时土方等加盖苫布等措施，扬尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，污染对敏感点影响较小，且这种影响将随着施工期的结束而消失。

运营期挥发性有机物满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值；油气集输过程无组织挥发的烃类气体，采取集输采用密闭流程，加强对设备和管道的检查和维护，控制各部位无组织挥发的烃类总量，本项目井场、改造场站（肇2转油站、宋II-3转油站）及依托场站（宋II-4转油站、肇一联合站、宋二联合站）厂界外VOCs（以非甲烷总烃计）执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中的相关标准要求。本项目扩建肇2转油站1台外输炉、依托宋II-3转油站、宋II-4转油站、肇一联合站、宋二联合站加热装置燃料均采用清洁能源天然气（即油田伴生气），产生的烟气经已建的烟囱排放，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉标准值要求（颗粒物 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 、NO $_x$ $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 、SO $_2$ $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ ，烟气黑度 ≤ 1 ）。

通过估算模式的计算结果可知，本工程大气环境评价等级为一级，对周围空气环境的影响较小。

（2）地表水环境影响

施工期废水排放主要来自于施工人员生活废水、拆除设备和清管器清洗废水、转注井洗井废水、管道试压废水。施工人员生活污水进入周边芳 48 集油阀组间、宋 II-1-1 集油阀组间、宋 II-3-10 集油阀组间、宋 II-3-11 集油阀组间、宋 II-3-12 集油阀组间等已建防渗旱厕，防渗旱厕定期清掏，对水环境影响很小；管道试压废水、拆除设备和清管器清洗废水、转注井洗井废水由罐车拉运至肇一联合油污水处理站处理，处理达标后回注，不外排，不会对水环境造成不利影响。

运营期正常工况条件下，本工程油田采出水在含油污水处理站处理后回注油田，不外排；非正常工况下产生的油水井作业污水、水井洗井废水通过污油污水回收装置回收后送含油污水处理站处理后回注，不外排，对水环境影响较小。

（3）地下水环境

本工程在正常且各项环境保护措施落实到位情况下无废水排放，对地下水环境影响较小，但在事故状态下如管道泄漏、油水井发生套损等可能对地下水环境造成影响，但在各项地下水污染防治措施及应急措施落实到位的情况下，对地下水环境影响较小。

（4）声环境影响

在采取选用低噪声设备，采用减振、消音、隔声等降噪措施，注意对设备的维护保养适当的降噪措施后，本工程施工期场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

在采取适当的降噪措施后，井场厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），对区域声环境影响较小。

（5）固体废物影响

施工期管道施工产生的焊渣拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理；设备拆除产生的建筑垃圾，送城市建筑垃圾消纳场处理；拆除机泵、油井树等设备（蒸汽冲洗后不含油）及拆除的旧总掺水管道，拉运到大庆模范屯油田有限责任公司资产回收库；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，拉运至肇州县生活垃圾填埋场填埋处理。

运营期固体废物包括含油污泥、落地油、含油废弃防渗布和生活垃圾。含油污泥、落地油为危险废物，HW08，危废代码为 071-001-08（石油开采和联合站贮存产生的油泥和油脚），统一收集拉运至第八采油厂宋芳屯含油污泥处理站减量化处理后，委托大

庆市云泰石化产品有限公司处理，处理后泥渣含油量满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》（DB23/T3104-2022）标准限值（石油类 $\leq 3000\text{mg/kg}$ ）；含油废弃防渗布为危险废物，类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，油水井作业施工结束后，由施工单位将废弃的含油防渗布集中收集暂存在第八采油厂三矿危废暂存间，定期委托有危废处置资质的单位进行处置。生活垃圾运至肇州县生活垃圾填埋场填埋处理。

本工程对施工期和运行期产生的各类固体废弃物均进行了合理的处置，均不直接排入外环境，能够实现固废的减量化、资源化和无害化，对环境影响较小。

（6）土壤环境影响

本工程所在地土壤环境现状较好，根据土壤环境影响分析结果，正常工况下本工程对土壤环境的影响较小，非正常工况如产生落地油等，可能会对土壤造成影响，但项目施工过程中均铺设防渗布，落地油不会污染土壤，因此项目对土壤环境影响较小。

（7）生态环境影响

本项目在井场施工、集输管道敷设、柱上变电站施工等过程对土地的侵占，对植被的破坏，将使油田开发区域内的第一生产者的生物量有一定程度的下降，在施工建设过程中采取必要的保护措施，则能最大程度减小对生态环境的不利影响，使生态环境在尽可能短的时间内得到恢复。

项目永久占用部分耕地，使土地利用类型转变为工业用地，但永久占地面积很小，占地后按照“占一补一”原则开垦与所占用耕地的数量与质量相当的耕地，并采用分层剥离的方式保存所占用农田耕作层土壤，用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良等农田保护措施，对区域内农田分布不会造成较大影响，对临时占用的草地进行播撒草籽进行恢复。

在制定相应的生态保护及恢复措施，并能够确保其切实执行的前提下，工程建设不会对现有生态环境造成太大的影响，在生态上是可行的。

（8）环境风险

本工程的主要环境风险是原油和天然气泄漏，对区域内的大气环境、地表水环境、地下水环境和生态环境有潜在危害性。在工程采取一系列风险防范措施、应急措施和建立环境风险防控体系后，原油及天然气泄漏影响可控，可以降低事故的发生率和事故情况下对周围环境的影响。

3.1.4 评价综合结论

综上所述，2023 年州 20 区块加密与注采系统调整产能建设工程（合作）项目，在产业政策方面，本工程为石油开采项目，符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委员会令第 49 号修改，2021 年 12 月 30 日）要求，属于鼓励类建设项目。

在规划政策方面，本工程符合《地下水管理条例》、《黑龙江省主体功能区划》、《黑龙江省生态功能区划》、《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《大庆市城市总体规划（2011-2020 年）》、《大庆市土地利用总体规划（2006-2020）》、《大庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（庆政发[2021]13 号）、《大庆市水土保持规划》（2015-2030）、《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》、《大庆市生态环境保护“十四五”规划》等主体功能区划要求，符合当地城市总体规划、土地利用规划等。

同时，本工程满足《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14 号）、《大庆市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（庆政规[2021]3 号）、《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（黑政规[2018]19 号）等政策要求，在石油开采行业管理方面，满足《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910 号）、《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》（黑环发[2019]153 号）、《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环保部公告 2012 年第 18 号）等管控要求。

油田正常生产情况下对环境的影响较小，工程施工及生产运行过程中可能出现的各类风险事故，在相应的污染防治措施、生态保护措施及事故应急措施得以切实有效实施的前提下，能够确保区域环境不受污染。从环境保护角度分析，本工程是可行的。

3.2 环境影响报告书批复意见

一、项目基本情况

该项目建设性质属于改扩建，项目代码为 2212-230621-04-P2-140601，建设地点位于大庆市肇州县新福乡境内，项目总占地面积为 8.422 hm²，其中永久占地面积为 0.465 hm²，临时占地面积为 7.957 hm²。该项目基建 15 口油井、3 口转注井，建成后产能 0.73 × 10⁴t/a。新建单井集油掺水管道 5.27km、站间掺水管道 4.3km、单井注水管道 0.852km、新建通井路等道路 1.15km，新建井场柱上变 11 座，新建 10KV 线路 1.26km，宋 II-3 转

油站更换2台外输泵，肇2转油站新建1台0.2 MW外输炉。项目总投资1950万元，其中环保投资106.883万元。

在全面落实《2023年州20区块葡萄花油层产能建设工程(合作)项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意该《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境保护措施

(一)生态保护措施。施工期，加强管理，规范施工人员行为，严禁随意践踏、碾压施工区范围之外的植被。埋设管线时，尽量窄控，采取平埋方式进行，以便尽快恢复植被。施工过程中不打乱土层，按要求实施表土剥离和利用。对于临时占地，施工结束后，及时恢复被破坏的地表形态和植被。对永久占用耕地，按照“占一补一”原则进行占补平衡。运营期，严格控制油井作业占地，普通井下作业不新征临时占地，作业时在井场周围堆筑临时围堰，防止作业时产生的油水进入周围环境。划定施工活动范围，所有车辆采用“一”字型作业法。作业时严格执行环保措施，控制污染物的外排量，保证“工完料净场地清”，污泥回收后做无害化处理。

(二)水环境保护措施。施工期，拆除设备清洗过程中在现场钢槽中进行，清洗废水收集后经罐车拉运至肇一联含油污水处理站处理，转注井洗井废水经现场设置的污水回收装置回收后经罐车拉运至肇一联含油污水站处理，管线试压废水由罐车拉运至肇一联含油污水站处理，废水处理均满足《大庆油田地面工程建设设计规定》(Q/SYDQ0639-2015)限值要求后，回注油层。生活污水排入依托场站及阀组间临时防渗旱厕，定期清掏用作农家肥。运营期，油井采出液分离出的含油污水管输至肇一联、宋二联含油污水处理站处理，作业污水密闭罐车拉运至肇--联含油污水处理站处理，以上废水处理均满足《大庆油田地面工程建设设计规定》(Q/SYDQ0639-2015)限值要求后回注油层。拉运污水集中接收场站要建设监控装置，并接入市生态环境局监控平台，污水拉运过程要建立台账，并接受视频监管。

(三)地下水及土壤污染防治措施。地下水实施分区防控，集输管道采取重点防渗措施，采用无缝钢管，设计壁厚的腐蚀余量约为2 mm并进行内防腐，外防腐等级采用特加强级，连接方式采用焊接。运营期油井作业井场永久占地内采取重点防渗措施，应使用有效防渗材料，确保防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中重点防渗区防渗要求。肇2转油站新建外输炉区域采取一般防渗措施，应使用有效防

渗材料,确保防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中一般防渗区防渗要求。油水井场采取简单防渗措施,应使用有效防渗材料,确保防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中简单防渗区防渗要求。作业时必须保证含油污泥不落地,具备条件的井场应铺设防渗布并设置钢制污油回收槽,暂不具备条件的井场应铺设防渗布。保留防渗工程施工期影像资料备查。加强防渗设施的日常维护,对出现破损的防渗设施应及时修复和加固,确保防渗设施牢固安全,防止污染地下水和土壤。

建立完善的地下水和土壤监测制度。设置3口潜水跟踪监测井:即在地下水流向上游依托张辉屯苏家水井设置1口背景监测井,地下水流向下游依托温家屯苏家水井、三分场白家水井设置2个跟踪监测井,定期进行监测,发现问题及时处理。严格落实地下水和土壤监测计划。一旦出现土壤和地下水污染,立即采取应急措施,减少对水体和土壤的不利环境影响。

(四)大气环境保护措施。施工期,土方开挖应采取遮盖、围挡、洒水等防尘措施,大风天气停止土方工程施工作业。合理规划道路运输路线,运料车辆采取苫布遮盖措施,以防物料洒落在地,形成二次扬尘。施工场界颗粒物应满足“大气污染物综合排放标准”(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值标准要求。运营期,原油集输采用密闭流程,加强对设备和管道的检查和维护,加强井下作业管理,提高落地油回收率,减少烃类气体挥发。井场、依托场站厂界非甲烷总烃应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中标准限值要求。厂界内产生的挥发性有机物(非甲烷总烃)应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)排放限值要求。依托工程以及本项目新建的加热炉均以天然气为燃料,SO₂、NO_x、颗粒物、烟气黑度均应满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)限值要求。

(五)声环境保护措施。施工期,施工现场合理布局,减少高噪声设备同时施工时间。注意对设备的维护和保养。运输车辆选择合理路线,合理安排施工进度,减少施工时间,禁止在夜间高噪声施工。施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。运营期,选用低噪声设备,采用相应的减振、隔声等降噪措施,注意对设备的维护保养。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2个类标准要求。

(六)固体废物污染防治措施。施工期,管道施工过程中产生的废焊条和废防腐材料废料拉运至第八采油厂工业固废填埋场。建筑垃圾送大庆市建筑垃圾消纳场处理。废旧

设备送大庆模范屯油田有限责任公司财务资产库回收，生活垃圾收集后及时拉运至肇州县生活垃圾填埋场填埋处理。运营期，落地油及含油污泥属于危险废物(HW08)，送至宋芳屯含油污泥处理站进行减量化处置，处置后污泥委托大庆市云泰石化产品有限公司进行无害化处理，处理后的泥渣满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》(DB23/3104-2022)要求后，用于在油田作业区域内用于通井路和井场建设、筑路和铺路、作业场地地面覆盖、围堰等材料的活动；或者在油田作业区域外用于物流仓储用地、工业厂区道路与交通设施用地以及危险废物填埋场、固体废物填埋场封场等材料的活动。作业产生的含油废防渗布属于危险废物(HW08)，暂存在第八采油厂三矿危废暂存间，定期委托资质单位处理。

(七)环境风险防控措施。加强管理，保证施工质量，加强监理，确保焊接和涂层等施工质量。建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平。提高管道防腐等级，进行水压试验，增加管道安全性。建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平。制定操作规程、操作手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免重大污染事故的发生。加强员工安全教育，提高安全意识。设置应急预案和紧急切断措施，加强自动控制系统的管理和控制。定期检测管道的内外腐蚀及防腐层破损情况，及时更换或维修。在开工建设前应制定突发环境事件应急预案并到项目所在地生态环境主管部门备案。加强风险防控预警体系建设，定期开展应急演练，提高突发事件的应急处理能力。

三、应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自本批复文件发布之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、由大庆市生态环境保护综合执法局组织开展该项目“三同时”监督检查和管理工作。

(环评批复具体内容见附件1)

4 环境保护措施落实情况调查

4.1 环境影响报告书及批复落实情况调查

具体落实情况见表 4.1-1 至表 4.1-6。

表 4.1-1 水环境环保措施落实情况汇总表

时段	环评提出的措施	环评批复提出的措施	落实情况
施工期	<p>施工期废水排放主要来自于施工人员生活废水、拆除设备和清管器清洗废水、转注井洗井废水、管道试压废水。施工人员生活污水进入周边芳 48 集油阀组间、宋 II-1-1 集油阀组间、宋 II-3-10 集油阀组间、宋 II-3-11 集油阀组间、宋 II-3-12 集油阀组间等已建防渗旱厕，防渗旱厕定期清掏，对水环境影响很小；管道试压废水、拆除设备和清管器清洗废水、转注井洗井废水由罐车拉运至肇一联合油污水处理站处理，处理达标后回注，不外排，不会对水环境造成不利影响。</p>	<p>施工期，拆除设备清洗过程中在现场钢槽中进行，清洗废水收集后经罐车拉运至肇一联合油污水处理站处理，转注井洗井废水经现场设置的污水回收装置回收后经罐车拉运至肇一联合油污水处理站处理，管线试压废水由罐车拉运至肇一联合油污水处理站处理，废水处理均满足《大庆油田地面工程建设设计规定》(Q/SYDQ0639-2015)限值要求后，回注油层。生活污水排入依托场站及阀组间临时防渗旱厕，定期清掏用作农家肥。</p>	<p>已落实。</p> <p>集油管线试压废水由罐车拉运至肇一联合油污水处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》(Q/SYDQ0639-2015)、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T 5329-2012)标准要求：“含油量$\leq 8\text{mg/L}$、悬浮固体含量$\leq 3\text{mg/L}$、粒径中值$\leq 2\mu\text{m}$”后回注现役油层。</p> <p>转注井洗井废水量由罐车拉运至肇一联合油污水处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》(Q/SYDQ0639-2015)、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T 5329-2012)标准要求：“含油量$\leq 8\text{mg/L}$、悬浮固体含量$\leq 3\text{mg/L}$、粒径中值$\leq 2\mu\text{m}$”后回注现役油层。</p> <p>施工期生活污水进入附近芳 48 集油阀组间、宋 II-1-1 集油阀组间、宋 II-3-10 集油阀组间、宋 II-3-11 集油阀组间、宋 II-3-12 集油阀组间已建旱厕，定期清掏外运用作农家肥。</p>
运	运营期正常工况条件下，本工程油	运营期，油井采出液分离出的含油污水管输至	已落实。

<p>行期</p>	<p>田采出水在含油污水处理站处理后回注油田，不外排；非正常工况下产生的油水井作业污水、水井洗井废水通过污水回收装置回收后送含油污水处理站处理后回注，不外排，对水环境影响较小。</p>	<p>肇一联、宋二联合油污水处理站处理，作业污水密闭罐车拉运至肇一联合油污水处理站处理，以上废水处理后均满足《大庆油田地面工程建设设计规定》(Q/SYDQ0639-2015)限值要求后回注油层。拉运污水集中接收场站要建设监控装置，并接入市生态环境局监控平台，污水拉运过程要建立台账，并接受视频监控。</p>	<p>油井作业污水由罐车拉运至肇一联合油污水处理站处理，出水水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》(Q/SYDQ0639-2015)、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T 5329-2012)标准要求中含油量$\leq 8\text{mg/L}$、悬浮固体含量$\leq 3\text{mg/L}$、悬浮物颗粒直径中值$\leq 2\mu\text{m}$要求后，回注地下开采油层。</p> <p>运营期依托的肇一联合站、宋二联合站，均无新增劳动定员，无新增生活污水。运营期15口油井采出液进入肇一联、宋二联脱水站处理，其脱出的含油污水由管道输送至肇一联、宋二联合油污水处理站，出水水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》(Q/SYDQ0639-2015)、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T 5329-2012)标准要求中含油量$\leq 8\text{mg/L}$、悬浮固体含量$\leq 3\text{mg/L}$、悬浮物颗粒直径中值$\leq 2\mu\text{m}$要求后，回注地下开采油层。</p>
	<p>本工程在正常且各项环境保护措施落实到位情况下无废水排放，对地下水环境影响较小，但在事故状态下如管道泄漏、油水井发生套损等可能对地下水环境造成影响，但在各项地下水污染防治措施及应急措施落实到位的情况下，对地下水环境影响较小。</p>	<p>地下水和土壤污染防治措施。</p> <p>地下水实施分区防控，集输管道采取重点防渗措施，采用无缝钢管，设计壁厚的腐蚀余量约为2mm并进行内防腐，外防腐等级采用特加强级，连接方式采用焊接。运营期油井作业井场永久占地内采取重点防渗措施，应使用有效防渗材料，确保防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中重点防渗区防渗要求。肇2转油站新建外输炉区域采取一般防渗措施，应使用有效防渗材料，确保防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中一般防渗区防渗要求。油水井场采取简单防渗措施，应使用有效防渗材料，确保防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中简单防渗区防渗</p>	<p>已落实。</p> <p>(1)按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目进行了分区防渗：</p> <p>地下管道壁厚的腐蚀余量大于2mm并采用了管道内防腐；管道的外防腐等级采用了特加强级；管道的连接方式采用了焊接，防渗性能等效黏土防渗层$M_b \geq 6\text{m}$、$K \leq 1.0 \times 10^{-7}\text{cm/s}$，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中重点防渗区的要求。</p> <p>油水井作业井场铺设铺设1.5mm厚、渗透系数为$1.0 \times 10^{-13}\text{cm/s}$的防渗土工布进行了防渗处理，防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7中的防渗技术要求，等效黏土防渗</p>

		<p>要求。作业时必须保证含油污泥不落地，具备条件的井场应铺设防渗布并设置钢制污油回收槽，暂不具备条件的井场应铺设防渗布。保留防渗工程施工期影像资料备查。加强防渗设施的日常维护，对出现破损的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全，防止污染地下水和土壤。</p> <p>建立完善的地下水和土壤监测制度。设置3口潜水跟踪监测井：即在地下水流向上游依托张辉屯苏家水井设置1口背景监测井，地下水流向下游依托温家屯苏家水井、三分场白家水井设置2口跟踪监测井，定期进行监测，发现问题及时处理。严格落实地下水和土壤监测计划。一旦出现土壤和地下水污染，立即采取应急措施，减少对水体和土壤的不利环境影响。</p>	<p>层 $M_b \geq 6.0m$、$K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$。产生的作业污水经罐车拉运至肇一联合含油污水处理站处理达标后回注现役油层。肇2转油站新建外输炉下方表土进行了夯实，表土结构层下铺设厚1.5mm高密度聚乙烯（HDPE）土工膜构筑防渗层。防渗性能均满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求：在一般防渗区地面铺设 $M_b \geq 1.5m$、$K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$ 的防渗性能的黏土层。</p> <p>油水井井场采取了地面平整夯实，满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中一般地面硬化的要求。</p> <p>（2）依托3口村屯地下水井，定期对地下水进行跟踪监测：在项目区域上游依托张辉屯水井（125.148719；45.864802）布设1个潜水背景值监测水井，在区域内依托温家屯水井（125.135818；45.850905）、区域下游依托三分场水井（125.101552；45.813277）布设1口潜水跟踪监测水井，定期对地下水进行跟踪监测。</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

表 4.1-2 大气环境环保措施落实情况汇总表

时段	环评提出的措施	环评批复中提出的措施	落实情况
施工期	<p>施工期产生的扬尘通过洒水抑尘、临时土方等加盖苫布等措施，扬尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，污染对敏感点影响较小，且这种影响将随着施工期的结束而消失。</p>	<p>施工期，土方开挖应采取遮盖、围挡、洒水等防尘措施，大风天气停止土方工程施工作业。合理规划道路运输路线，运料车辆采取苫布遮盖措施，以防物料洒落在地，形成二次扬尘。施工场界颗粒物应满足“大气污染物综合排放标准”（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值标准要求。</p>	<p>已落实。</p> <p>井场、管线、道路施工现场进行了洒水抑尘，表土及建材堆放设置了挡风板、上覆遮盖材料，施工运输车辆采取了密闭措施或加盖防尘布。</p> <p>本项目未在大风天进行施工，施工期对土堆、进出车辆等均进行了遮盖，减少了扬尘的污染。经对本项目周围村屯的走访调查，施工期没有发生环境污染事件。</p>
运行期	<p>运营期挥发性有机物满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值；油气集输过程无组织挥发的烃类气体，采取集输采用密闭流程，加强对设备和管道的检查和维护，控制各部位无组织挥发的烃类总量，本项目井场、改造场站（肇2转油站、宋II-3转油站）及依托场站（宋II-4转油站、肇一联合站、宋二联合站）厂界外VOCs（以非甲烷总烃计）执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中的相关标准要求。本项目扩建肇2转油站1台外输炉、依托宋II-3转油站、宋II-4转油站、肇一联合站、宋二联合站加热装置燃料均采用清洁能源天然气（即油田伴生气），产生的烟气经已建的烟囱排放，能够达到《锅炉大气污染物排放</p>	<p>运营期，原油集输采用密闭流程，加强对设备和管道的检查和维护，加强井下作业管理，提高落地油回收率，减少烃类气体挥发。井场、依托场站厂界非甲烷总烃应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中标准限值要求。厂界内产生的挥发性有机物（非甲烷总烃）应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值要求。依托工程以及本项目新建的加热炉均以天然气为燃料，SO₂、NO_x、颗粒物、烟气黑度均应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求。</p>	<p>已落实。</p> <p>（1）15口油井产液分别依托宋II-3转油站、宋II-4转油站、肇2转油站、肇一联合站、宋二联合站，上述涉及场站加热装置均采用了清洁能源天然气（油田伴生气），产生的燃烧废气经8-25m高烟囱外排。本项目依托场站加热炉燃料均采用了清洁能源天然气，锅炉烟气均通过高于8m的排气筒排放，锅炉烟气污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准要求。</p> <p>根据验收监测数据可知：依托场站均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉标准限值的要求。</p> <p>（2）井场井口安装了密封垫，油气集输过程采用了密闭措施，大量减少了挥发性有机气体的无组织挥发。根据验收监测数据可知：井场及现有场站厂界非甲</p>

	标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉标准值要求（颗粒物 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $\text{NO}_x \leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $\text{SO}_2 \leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ ，烟气黑度 ≤ 1 ）。		烷总烃均满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）边界限值要求。 依托场站均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中监控点处1h平均浓度值 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ ，监控点处任意一次浓度值 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ 要求。
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



肇一联合站加热装置现状



宋二联合站加热装置现状

图 4.1-2 大气环境保护措施落实情况

表 4.1-3 声环境环保措施落实情况汇总表

时段	环评提出的措施	环评批复中提出的措施	落实情况
施工期	在采取选用低噪声设备，采用减振、消音、隔声等降噪措施，注意对设备的维护保养适当的降噪措施后，本工程施工期场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。	施工期，施工现场合理布局，减少高噪声设备同时施工时间。注意对设备的维护和保养。运输车辆选择选择合理路线，合理安排施工进度，减少施工时间，禁止在夜间高噪声施工。施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。	已落实。 合理安排了施工进度，避免了大量高噪声设备同时施工；施工期选用了低噪声设备；定期对施工设备进行了保养维护，保证了设备保持在最佳运行状态，降低了噪声源强度，运输车辆避开了居民区的路线。施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定的标准限值要求。经调查，本项目施工期间没有发生噪声扰民事件。
运行期	在采取适当的降噪措施后，井场厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），对区域声环境影响较小。	运营期，选用低噪声设备，采用相应的减振、隔声等降噪措施，注意对设备的维护保养。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2个类标准要求。	已落实。 经调查，本项目井场电机和场站机泵均选用了低噪声设备且设置了减振基础，井场工作人员每天对油水井进行巡查，保障油水井正常稳定运行。场站工作人员每两个月对设备进行维护保养，保障设备正常稳定运行，场站机泵均集中布置在泵房内，并且加装了隔声门窗，根据本次验收监测结果，井场厂界噪声经距离衰减后可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，依托场站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。



6#平台抽油机减震基础



州 23-斜 1 抽油机减震基础



联合站站内机泵



联合站隔声门窗

图 4.1-3 声环境保护措施落实情况

表 4.1-4 固体废物防治措施落实情况汇总表

时段	环评提出的措施	环评批复中提出的措施	落实情况
施工期	<p>施工期管道施工产生的焊渣拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理；设备拆除产生的建筑垃圾，送城市建筑垃圾消纳场处理；拆除机泵、油井树等设备（蒸汽冲洗后不含油）及拆除的旧总掺水管道，拉运到大庆模范屯油田有限责任公司资产回收库；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，拉运至肇州县生活垃圾填埋场填埋处理。</p>	<p>施工期，管道施工过程中产生的废焊条和废防腐材料废料拉运至第八采油厂工业固废填埋场。建筑垃圾送大庆市建筑垃圾消纳场处理。废旧设备送大庆模范屯油田有限责任公司财务资产库回收，生活垃圾收集后及时拉运至肇州县生活垃圾填埋场填埋处理。</p>	<p>已落实。 管道施工废料属于一般固废，拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。 设备拆除产生的建筑垃圾送市政指定地点填埋。 拆除机泵、油井树等设备（蒸汽冲洗后不含油）拉运到大庆模范屯油田有限责任公司资产回收库。 施工人员产生的生活垃圾分类收集后，拉运至肇州县生活垃圾填埋场填埋处理。</p>
运行期	<p>运营期固体废物包括含油污泥、落地油、含油废弃防渗布和生活垃圾。含油污泥、落地油为危险废物，HW08，危废代码为 071-001-08（石油开采和联合站贮存产生的油泥和油脚），统一收集拉运至第八采油厂宋芳屯含油污泥处理站减量化处理后，委托大庆市云泰石化产品有限公司处理，处理后泥渣含油量满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》（DB23/T3104-2022）标准限值（石油类≤3000mg/kg）；含油废弃防渗布为危险废物，类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物，危废代码为 900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，油水井作业施工结束后，由施工单位将废弃的含油防渗布集中收集暂存在第八采油厂三矿危废暂存间，定期委托有危废处置资质的单位进行处置。生活垃圾运至肇州县生活垃圾填埋场填埋处理。</p>	<p>运营期，落地油及含油污泥属于危险废物（HW08），送至宋芳屯含油污泥处理站进行减量化处置，处置后污泥委托大庆市云泰石化产品有限公司进行无害化处理，处理后的泥渣满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》（DB23/3104-2022）要求后，用于在油田作业区域内用于通井路和井场建设、筑路和铺路、作业场地地面覆盖、围堰等材料的活动；或者在油田作业区域外用于物流仓储用地、工业厂区道路与交通设施用地以及危险废物填埋场、固体废物填埋场封场等材料的活动。作业产生的含油防渗布属于危险废物（HW08），暂存在第八采油厂三矿危废暂存间，定期委托资质单位处理。</p>	<p>已落实。 落地油及含油污泥统一收集后拉运委托大庆市庆兴环保科技有限公司进行处理，处理后泥渣含油量满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》（DB23/3104-2022）标准限值（石油类≤3000mg/kg）。 含油废弃防渗布统一收集后，暂存在第八采油厂三矿危废暂存间后，委托黑龙江兰溪谷环保科技发展公司转运处理。</p>

表 4.1-5 生态环境环保措施落实情况汇总表

时段	环评提出的措施	环评批复中提出的措施	落实情况
施工期	<p>本项目在井场施工、集输管道敷设、柱上变电站施工等过程对土地的侵占，对植被的破坏，将使油田开发区域内的第一生产者的生物量有一定程度的下降，在施工建设过程中采取必要的保护措施，则能最大程度减小对生态环境的不利影响，使生态环境在尽可能短的时间内得到恢复。</p>	<p>施工期，加强管理，规范施工人员行为，严禁随意践踏、碾压施工区范围之外的植被。埋设管线时，尽量窄控，采取平埋方式进行，以便尽快恢复植被。施工过程中不打乱土层，按要求实施表土剥离和利用。对于临时占地，施工结束后，及时恢复被破坏的地表形态和植被。对永久占用耕地，按照“占一补一”原则进行占补平衡。</p>	<p>已落实。</p> <p>(1)施工期作业带清理、管沟开挖、道路的建设对土壤造成扰动和植被的破坏，项目施工期均在临时占地内进行施工，并且施工结束后及时清理施工现场，对临时占用的 3.443hm² 耕地进行了复垦，4.514hm² 草地进行了播撒草籽。</p> <p>(2)严格执行了《土地复垦规定》，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时进行了修整，恢复原貌。</p> <p>(3)经调查，本项目施工期结束后，建设单位已对临时占地进行了平整。当地农民已对耕地进行了复耕，与周围无差异。</p> <p>(4)加强了对施工队伍的环境教育，规范了施工人员行为。教育职工爱护环境，保护施工场所周围的植被，没有砍伐、破坏施工区以外的植被。</p>
运行期	<p>项目永久占用部分耕地，使土地利用类型转变为工业用地，但永久占地面积很小，占地后按照“占一补一”原则开垦与所占用耕地的数量与质量相当的耕地，并采用分层剥离的方式保存所占用农田耕作层土壤，用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良等农田保护措施，对区域内农田分布不会造成较大影响，对临时占用的草地进行播撒草籽进行恢复。</p>	<p>运营期，严格控制油井作业占地，普通井下作业不新征临时占地，作业时在井场周围堆筑临时围堰，防止作业时产生的油水进入周围环境。划定施工活动范围，所有车辆采用“一”字型作业法。作业时严格执行环保措施，控制污染物的外排量，保证“工完料净场地清”，污泥回收后做无害化处理。</p>	<p>已落实。</p> <p>(1)根据调查，本项目油水井尚未进行作业，待油水井作业时，尽量在永久占地内进行施工，减少临时占地面积。</p> <p>(2)加强了对井下作业队伍的管理，严格执行占地标准，规范行车路线，严禁随意碾压耕地。作业结束后清理井场油污，并要对井场场地进行平整，禁止落地油洒落。</p> <p>(3)临时占地：先挖表土层，单独堆放，底土层另外堆放，复原时先填心、底土，后平覆表土，以便尽快恢复植被。</p>

			<p>(4)永久占地：按照“占多少，垦多少”的原则，进行耕地补偿，土地复垦。应尽量减少占地面积，并规范行车路线及施工人员行为，严禁随意践踏、碾压施工区范围外的植被，不准乱挖、乱采野生植物。</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------



1#平台占地恢复情况



2#平台占地恢复情况



3#平台占地恢复情况



4#平台占地恢复情况



5#占地恢复情况



8#平台占地恢复情况



9#平台占地恢复情况



州23-斜1占地恢复情况



11#平台占地恢复情况



12#平台占地恢复情况



肇 72-32 占地恢复情况



4#平台通井路占地恢复情况



11#平台通井路占地恢复情况



肇60-斜23通井路占地恢复情况

图 4.1-4 生态恢复情况


表 4.1-6 环境风险防范措施及环境管理措施落实情况汇总表

类别	环评提出的措施	环评批复中提出的措施	落实情况
风险预防措施	<p>本工程的主要环境风险是原油和天然气泄漏，对区域内的大气环境、地表水环境、地下水环境和生态环境有潜在危害性。在工程采取一系列风险防范措施、应急措施和建立环境风险防控体系后，原油及天然气泄漏影响可控，可以降低事故的发生率和事故情况下对周围环境的影响。</p>	<p>加强管理，保证施工质量，加强监理，确保焊接和涂层等施工质量。建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平。提高管道防腐等级，进行水压试验，增加管道安全性。建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平。制定操作规程、操作手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免重大污染事故的发生。加强员工安全教育，提高安全意识。设置应急预警和紧急切断措施，加强自动控制系统的管理和控制。定期检测管道的内外腐蚀及防腐层破损情况，及时更换或维修。在开工建设前应制定突发环境事件应急预案并到项目所在地生态环境主管部门备案。加强风险防控预警体系建设，定期开展应急演练，提高突发事件的应急处理能力。</p>	<p>已落实。</p> <p>通过现场调查企业生产管理情况，企业在油田开发过程中做到了：</p> <p>(1) 大庆模范屯油田有限责任公司已建立较完善的应急预案体系，预案为《大庆模范屯油田有限责任公司环境突发事件专项应急预案》，在大庆市油田有限责任公司应急管理办公室进行了备案，并在2021年9月在肇州县生态环境局进行备案，备案编号230621-2021-013-L，《大庆模范屯油田有限责任公司环境突发事件专项应急预案》根据环境突发事件的发生过程、性质和机理，将大庆模范屯油田有限责任公司环境突发事件主要风险分为五类，分别为：原油泄漏污染、污水泄漏污染、给排水系统泄漏污染、天然气泄漏污染和施工时发生井喷造成污油、污水排放污染。适用范围为大庆模范屯油田有限责任公司所发生的一级（I级）环境突发事件的应急救援工作，作为指导大庆模范屯油田有限责任公司所属各单位相关应急预案编制依据。各项应急预案针对不同的事故采取相应的措施，合理有效。并有计划的制定应急演练计划，进行记录。</p> <p>(2) 加强对管线和油井的监测、检查和管理，采取积极的防范措施，防止泄漏等风险事故的发生。具有完善HSE管理体系，停电、泄漏、火灾、爆炸事故的应急响应预案切实可行并定期演练，确保了在事故发生时能够严格执行，工程投产至今未来发生过任何环境污染事故；联合站等依托场站定期开展安全环保教育，定期开展各类型应急演练，并形成记录，提高职工的安全环保意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施。</p> <p>(3) 依托的转油站、联合站已根据其日常管理工作等安全环保行为建立相应档案。</p> <p>(4) 大庆模范屯油田有限责任公司生产部门和环保</p>


			<p>部门建立安全环保管理工作考核细则，实行量化考核，每季度进行考核排名。</p> <p>（5）大庆模范屯油田有限责任公司定期组织人员到辖区村屯进行油田生产安全宣传教育活动，并和辖区村屯村委会建立了良好的合作关系</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------




应急物资情况

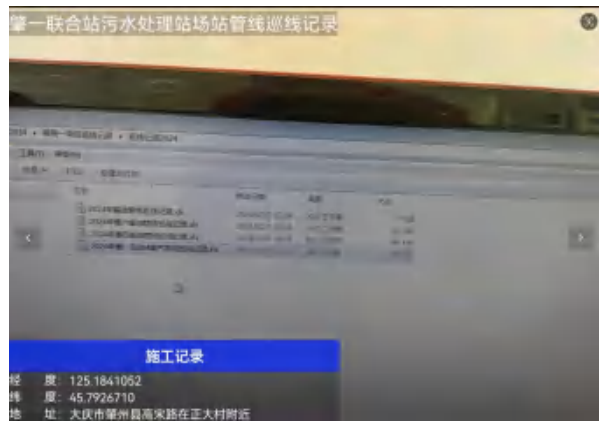


管线巡查记录

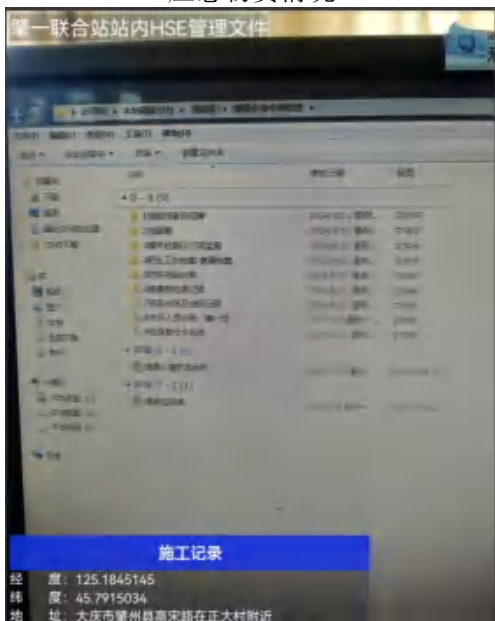

HSE档案

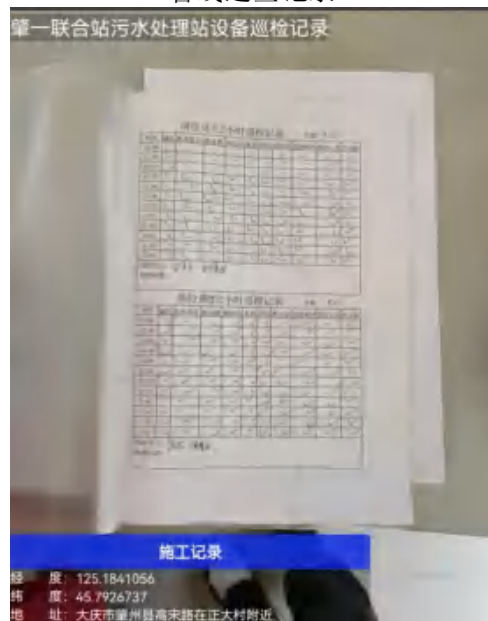

设备巡检记录

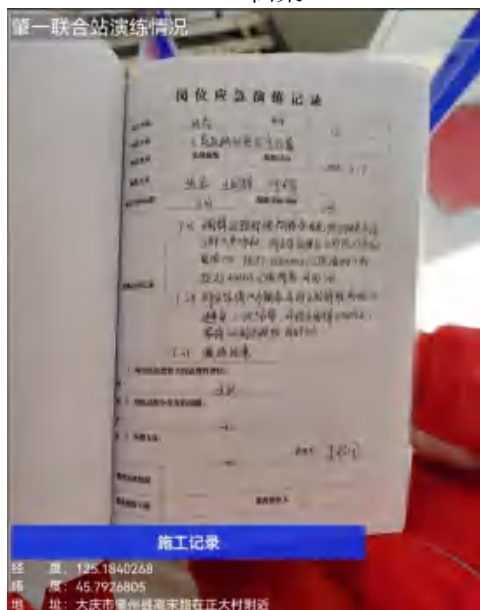

应急演练记录



应急演练记录

图 4.1-5 依托场站风险防范措施



应急演练现场照片



应急演练现场照片

图 4.1-6 应急演练

4.2 环境保护措施落实情况分析

本项目在油田开发过程中采取了一系列环保措施，从工艺上采取密闭流程与含油污水处理后回注的工艺，并根据油田特点连通注水系统，以减少污染物的排放；在污染物治理方面，运营期依托场站为宋 II-3 转油站、宋 II-4 转油站、肇 2 转油站、肇一联合站、宋二联合站，依托的含油污泥处理站为大庆市庆兴环保科技有限公司，运营期油井作业产生的含油防渗布暂存在第八采油厂三矿危废暂存间。由于采取了有效的环保措施，降低了油田开发活动对当地环境的影响，油田开采过程中产生的含油污水、烃类废气、含油污泥等基本上得到了有效的控制。

本项目的建设基本落实了环评批复及环境影响报告中提出的各项环保措施，各项目环保措施能够稳定运行，通过本次验收监测可知，各项目污染物经上述措施处理后能够实现达标排放。

4.3 建议

1、加强井场设备的更新和维护，发现设备运行故障及时解决，避免因设备故障运行对周边居民的正常生活造成不利影响。

2、本项目油水井尚未进行作业，应加强运行期井下作业现场的管理和监督，作业污水、洗井污水应按照模范屯油田现有的措施，作业时铺设防渗布，油水井作业时设井口收集槽，收集井口溢流污水，然后泵入作业污油污水回收装置或罐车回收处理，作业结束后及时清理井场，尽量避免落地油的产生，并对少量落地油土及时清理、回收处理，减轻对井场及其周围土壤的影响。

5 生态环境影响调查与分析

根据现场调查，项目调查区域内无自然保护区、风景名胜区等特殊及重要生态敏感区，无饮用水水源地保护区等环境敏感区。2023年州20区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目在设计、施工和建设过程中有针对性地采取了一些环境保护措施，减轻了对生态环境的影响。然而，油田开发建设属于区域开发，油田设施虽然是点线相连，实际占地面积比例也较小，但是油田设施点线相连成网，油田开发建设对生态环境的影响还是很大的。油田开发及生产过程中，钻井、修路、埋设管线、大量的运输车辆及其它人为活动，不可避免地对油田开发区域的生态环境产生影响，这种影响包括生物多样性减少、景观以及地形、地貌、植被、土壤等生态因子的改变等。

5.1 自然环境概况

5.1.1 气候气象

大庆市气象局近20年气象观测资料显示，项目所在区属北温带大陆性季风气候，四季分明，受蒙古内陆冷空气和海洋暖流季风影响较大，冬季漫长而寒冷干燥，夏季短暂而温湿多雨，春秋季风交替，气温变化大，冰封期长，无霜期短，冻土深达2-2.2m。年平均气温3.3℃，年极端最高气温38.9℃，年极端最低气温-36.2℃。平均风速3.7m/s，年最大风速为22.7m/s，SW。该地区冬季WNW-NW-NNW风向出现风频率为37%；夏季多为S-SSW-SW风向，风频率为26%；年风向频率较大为S-NW-NNW。风场的特征是春、秋、夏以S风为主，冬季以NW-NNW风为主，全年静风频率为6%。年平均442.0mm，年最大降水量651.2mm。年平均水气压8.2hpa。平均积雪158d，最大积雪深度220.0mm。年平均蒸发量1531.4mm，年最大蒸发量1711.0mm，年最小蒸发量1378.4mm，年平均风速3.7m/s。

5.1.2 地形地貌

评价区处于松花江及嫩江冲积平原北部，地形呈北高南低的广阔波状平原。评价区位于肇州县，区块内地势总体上较平坦，起伏不大，地表径流排泄条件一般。地貌成因类型及形态特征为冲湖积微波状起伏低平原，其沼泽湿地及盐碱低地较为发育。

5.1.3 地下水资源

本项目位于松辽盆地的北部，区域地质构造位置属于徐家围子向斜构造一部分，位于向斜构造的南端。中生界白垩系沉积了巨厚的碎屑岩，第四系则覆盖全区，不整合于

白垩系地层之上。在各组岩层中沉积有厚薄不均的砂、砂砾石层及砂岩、砂砾岩层，为地下水的赋存提供了良好的条件。

根据地下水的埋藏条件及含水层介质、水力性质等，区内地下水类型可划分为第四系上更新统松散层孔隙潜水、白垩系上统明水组孔隙裂隙承压水。

第四系上更新统松散层孔隙潜水分布于全区，含水层岩性为上更新统哈尔滨组粉细砂组成，厚度 0-3.5m。地下水水位埋深 2.4-5.5m，弱富水性，单井涌水量在 300-100m³/d，地下水化学类型以 HCO₃—Na、HCO₃—Na·Ca 型水为主。该层水为大气降水的垂直入渗补给，无开采供水条件。

第四系白土山组孔隙承压水第四系白土山组孔隙承压含水层主要由河流相沉积的灰白色、杂色砂砾石组成。偶夹白色高岭土透镜体。主要分布于区域的南部，含水层厚度小于 30.0m。含水层顶板埋深为 25.0-30.0m，呈由东向西增大态势。

白土山组孔隙承压含水层颗粒粗大，分选较好，孔隙连通，有效孔隙度大，透水性强，富水性好。单井涌水量（237mm 井管）一般都能达到 1000-1500m³/d，水质为重碳酸钠型水。

第三系大安组孔隙裂隙承压水上部，灰白色灰绿色粉砂岩和灰绿色青灰色层泥岩。中部深灰色粘土页岩和泥岩。下部灰白色含砾砂岩和砂砾岩。主要分布在区域的东南部，含水层为砂岩粉砂岩。含水层厚度一般为 0-48.5m，顶板埋深东西条带为 15-30m，井涌水量 860-1250t/d。

第三系泰康组孔隙裂隙承压水上部，灰绿色、青绿色泥质粉砂岩，灰白色砂岩局部地区含朽木碎片，分布不稳定局部地区缺失；下部，灰白色厚层砂砾岩夹薄层中细砂岩，含砾中粗砂，一般上部颗粒粗，下部颗粒细。西部广泛分布，含水层为砂砾岩层。区域含水层厚度一般 20-40m，含水层板埋深 0-30m 左右。单井涌水量 3000-5000t/d。

明水组二段：岩性主要是含中粗砂岩组成，质软，成岩性较差，含水层分布不均，连续性较差，透水性一般、富水性一般，含砾砂岩含水层单层厚度较薄，层数较多，一般由 4-6 个层组成，单层厚度 3.0-20.0m，含水层顶板埋深 50-70m，二段含水层组单井涌水量一般可达 800-1200m³/d（273mm）。

明水组一段：岩性主要是含砾砂岩和砂砾岩组成，质软，成岩性较差，含水层分布稳定性较好，透水性一般、富水性一般，一段含砾砂岩含水层单层厚度较薄，层数一般 3-5 层，单层厚度 3.0-29.0m，累计含水层厚度 10.0-45.0m，含水层顶板埋深 60-120m。单井涌水量（237mm 井管）一般都能达到 1000-1500m³/d，水质为重碳酸钠型水。

明水组含水层的矿化度为480-860g/L，总硬度为66-95mg/L（以CaCO₃计），水质类型为重碳酸钠型水。

5.1.4 土壤类型与植被分布

评价区属嫩江的冲积地带，区内土壤早期为洪积、冲、风积而成。是第四全新统疏松沉积物所覆盖，质地粘重，地形平坦，祇稍现坡状起伏。此地土壤受气候、地形、地质、水文地质、生物等影响，逐步形成现在土壤类型。根据调查本项目评价范围内土壤类型主要为草甸土。

草甸土是温带低洼地区受地下水浸润作用，在腐殖质积累和潜育化过程下形成的具有腐殖质表层和潜育层的半水成土壤。主要分布在东北平原、内蒙古和西北地区的河谷平原或湖盆地区，其自然植被为湿生型与中生型草甸植被。草甸土类是区域内比较肥沃的土壤，包含三个亚类：石灰性草甸土，盐化草甸土，碱化草甸土。草甸土的植被，除了农田以外，草原植被以羊草和拂子茅为优势种，伴生有萎菱菜、地榆、胡枝子、蒿属、虎尾草、星星草等。

5.1.5 植被及野生动物分布

区内自然植被以草本植物占绝对优势，主要为碱草、星星草、碱蓬、碱蒿等，覆盖度在50-70%。农作物主要以玉米为主。

调查区域内野生动物种类和数量均较少，为典型农区，伴随人类生存的耕地小型鼠类、麻雀、家燕等种群数量较多，使陆生动物区系具有典型的耕地动物群色彩。

主要分布有小家鼠（*Mus musculus L.*）、大仓鼠（*Cricetulus triton*）、普通田鼠（*Microtus arvalis*）等啮齿目动物。由于人类活动的干扰，较大型哺乳类动物基本绝迹，但小型哺乳类特别是鼠类仍为常见种。鸟类的种类和分布亦较少。经调查，本区无国家和地方受保护的珍稀濒危野生动物，常见鸟类主要为喜鹊（*P. pica sericea Gould*）、小嘴乌鸦（*C. corone orientalis Evers*）、麻雀（*P. montanus montanus*）、家燕（*H. rustica gutturalis Scopoli*）等村栖型鸟类。

区域内无珍稀濒危动植物分布。

5.2 生态敏感目标调查

根据《黑龙江省湿地名录》（黑龙江省林业和草原局，2022年3月18日），本项目生态评价范围内不涉及湿地。根据《大庆市水土保持规划（2015-2030年）》，本项目位于肇州县新福乡，不属于市级水土流失重点治理区和重点预防区。根据黑龙江省防

沙治沙工作领导小组《关于印发<关于贯彻落实《沙化土地封禁保护修复制度方案》的实施意见>的通知》，本项目位于肇州县新福乡，肇州县不属于沙化土地所在县（区）。根据现场调查，结合黑龙江“三线一单”信息服务 APP，生态调查范围内涉及基本农田。

5.3 施工期生态环境影响调查

本项目对项目区植被的影响主要发生在项目施工期，其中新建道路、埋设管线对植被影响较大。

5.3.1 埋设管线

管线采用的是地理的方式。在施工过程中，严格划定了施工作业范围和路线，不得随意扩大；管沟开挖严格要求执行“分层开挖、分层堆放、分层回填”的操作规程，尽可能保持了植被的原有生存环境；回填时，留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失；施工结束后及时进行了地貌恢复工作。管道建成后进行了回填、迹地平整。

本项目全部采用平埋方式敷设管线，一般采取窄挖、回填压实等措施，本项目临时占地均采用自然恢复。敷设管线占用的耕地进行复耕。

5.3.2 项目实际临时占地及恢复情况调查

本项目施工期临时占地主要由管道、柱上变电站施工发生的临时占地组成。本项目实际临时占用耕地面积为 3.443hm²，目前耕地已复耕；本项目施工期对区域内的耕地生态系统的影响均较小。

5.4 运行期生态环境影响调查

5.4.1 项目实际永久占地调查

本项目实际永久占地主要由道路、柱上变电器的建设等方面组成。实际永久占用耕地面积为 0.387hm²。

5.4.2 土壤环境质量调查

（1）监测布点：根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）中 6.3.4“进行环境质量检测时，土壤环境质量监测至少布设三个采样点，每个采样点至少采集 1 个样品”。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“7.4.3 现状监测点数量要求”、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）中“6.3.2 环境影响质量监测规定”及《建设项目竣工环境保护验收技

术规范石油天然气开采》（HJ612-2011）中“5.5.2.3 样方调查及土壤监测”，为全面了解该项目所在地土壤环境质量现状，将该项目所在地布12个监测点，监测点位置见表5.4-1。环境质量现状监测点见图5-1。

表5.4-1 土壤环境监测点位

序号	监测点	占地类型	采样深度
T1	10#平台井场永久占地内	工矿用地	0.2m
T2	10#平台井场永久占地外 10m	耕地	
T3	10#平台井场永久占地外 20m		
T4	10#平台井场永久占地外 30m		
T5	10#平台井场永久占地外 50m		
T6	8#平台永久占地内		
T7	10#平台永久占地北侧 300m 耕地	耕地	
T8	8#平台永久占地南侧 300m 草地	草地	
T9	10#平台集油掺水管道临时占地	耕地	
T10	10#平台集油掺水管道临时占地外 30m	耕地	
T11	肇 2-1 集油阀组间至肇 2 转油站间总掺水管线临时占地	草地	
T12	肇 2-1 集油阀组间至肇 2 转油站间总掺水管线临时占地外 30m	草地	

(2) 监测项目

T1 监测项目：pH、As、Cd、Cr（六价）、Cu、Pb、Hg、Ni、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C₁₀-C₄₀）、石油类。

T2-T5、T10、T12 监测项目：pH、石油烃（C₁₀-C₄₀）、石油类。

T6 监测项目：pH、As、Cd、Cr（六价）、Cu、Pb、Hg、Ni、石油烃（C₁₀-C₄₀）、石油类。

T7-T9、T11 监测项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C₁₀-C₄₀）、石油类。

(3) 监测频次：2024年8月14日监测1次。

(4) 监测方法：

按照《环境监测分析方法》和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB15618-2018）中规定的方法，具体见表 5.4-2。

表 5.4-2 土壤中监测因子及监测方法一览表

序号	监测因子	分析方法名称及方法标准号	分析仪器、型号及编号
1	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	精密酸度计 pHS-2F JRD-006
2	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪 8860 JRD-140
3	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	原子荧光光度计 RGF-6800 JRD-015
4	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	原子荧光光度计 RGF-6800 JRD-015
5	铅、镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
6	铜、镍、锌	土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法 NY/T 1613-2008	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
7	铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
8	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
9	苯胺	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
10	2-氯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
11	硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
12	苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
13	甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
14	乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
15	苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
16	邻-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025

17	间+对-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
18	氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
19	1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
20	1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
21	氯甲烷	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
22	二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
23	1,1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
24	1,2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
25	1,1,1-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
26	1,1,2-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
27	1,1,1,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
28	1,1,1,2,2-五氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
29	1,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
30	1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
31	氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
32	1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
33	顺式-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025

34	反式-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
35	三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
36	四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
37	四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
38	三氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
39	苯并（a）蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
40	蒽、萘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
41	苯并（b）荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
42	苯并（k）荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
43	苯并（a）芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
44	二苯并（a,h）蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
45	茚并（1,2,3,-c,d）芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
46	二苯并[a, h]蒽	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
47	茚并[1,2,3-cd]芘	土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
48	石油类	土壤 石油类的测定红外分光光度法 HJ 1051-2019	红外分光测油仪 OIL450 JRD-018

(5) 监测结果:

监测统计结果见表 5.4-3，评价结果见表 5.4-4。

表 5.4-3 土壤环境质量监测结果

采样日期	检测项目	单位	检测结果
			10#平台井场永久占地内

2024.08.14	pH 值	无量纲	8.23			
	砷	mg/kg	3.43			
	镉	mg/kg	1.80			
	六价铬	mg/kg	未检出			
	铜	mg/kg	17.3			
	铅	mg/kg	19.3			
	汞	mg/kg	0.247			
	镍	mg/kg	18.2			
	三氯甲烷	μg/kg	未检出			
	四氯化碳	μg/kg	未检出			
	氯甲烷	μg/Kg	未检出			
	1,1-二氯乙烷	μg/kg	未检出			
	1,2-二氯乙烷	μg/kg	未检出			
	1,1-二氯乙烯	μg/kg	未检出			
	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	未检出			
	反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	未检出			
	二氯甲烷	μg/kg	未检出			
	1,2-二氯丙烷	μg/kg	未检出			
	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	未检出			
	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	未检出			
	四氯乙烯	μg/kg	未检出			
	1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	未检出			
	1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	未检出			
	三氯乙烯	μg/kg	未检出			
	1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	未检出			
	氯乙烯	μg/kg	未检出			
	苯	μg/kg	未检出			
	氯苯	μg/kg	未检出			
	1,2-二氯苯	μg/kg	未检出			
	1,4-二氯苯	μg/kg	未检出			
	乙苯	μg/kg	未检出			
	苯乙烯	μg/kg	未检出			
	甲苯	μg/kg	未检出			
	间+对-二甲苯	μg/kg	未检出			
	邻-二甲苯	μg/kg	未检出			
	硝基苯	mg/kg	未检出			
	苯胺	mg/kg	未检出			
	2-氯苯酚	mg/kg	未检出			
	苯并（a）蒽	mg/kg	未检出			
	苯并（a）芘	mg/kg	未检出			
	苯并（b）荧蒽	mg/kg	未检出			
苯并（k）荧蒽	mg/kg	未检出				
二苯并（a,h）蒽	mg/kg	未检出				
蒽	mg/kg	未检出				
茚并（1,2,3-cd）芘	mg/kg	未检出				
萘	mg/kg	未检出				
石油类	mg/kg	33.1				
石油烃（C10-C40）	mg/kg	106				
采样日期	检测项目	单位	检测结果			
			10#平台	10#平台井	10#平台	10#平台

			井场永久占地外10m	场永久占地外20m	井场永久占地外30m	井场永久占地外50m
2024.08.14	pH值	无量纲	8.24	8.41	8.03	8.11
	石油类	mg/kg	140	100	90.5	59.0
	石油烃（C10-C40）	mg/kg	161	64	24	17
采样日期	检测项目	单位	检测结果			
			10#平台集油掺水管 道临时占地外30m	肇2-1集油阀组间至肇 2转油站间总掺水管 线临时占地外30m		
2024.08.14	pH值	无量纲	8.12		7.86	
	石油类	mg/kg	105		115	
	石油烃（C10-C40）	mg/kg	17		157	
采样日期	检测项目	单位	检测结果			
			8#平台永久占地内	10#平台永久占地北侧 300m耕地	8#平台永久占地南侧 300m草地	10#平台集油掺水管 道临时占地
2024.08.14	pH值	无量纲	8.20	7.81	7.73	7.90
	砷	mg/kg	2.96	3.25	3.19	3.91
	镉	mg/kg	1.58	0.15	0.20	0.24
	铬	mg/kg	/	36	39	37
	铜	mg/kg	18.3	18.7	18.7	17.6
	铅	mg/kg	19.1	17.6	20.3	18.3
	汞	mg/kg	0.228	0.247	0.183	0.131
	镍	mg/kg	17.5	18.2	17.5	19.0
	锌	mg/kg	/	22.5	21.5	20.8
	石油烃（C10-C40）	mg/kg	97	23	21	6L
	石油类	mg/kg	32.8	28.1	58.3	165
	六价铬	mg/kg	未检出	/	/	/
采样日期	检测项目	单位	检测结果			
			肇2-1集油阀组间至肇2转油站间总掺水管 线临时占地			
2024.08.14	pH值	无量纲	7.93			
	砷	mg/kg	3.61			
	镉	mg/kg	0.20			
	铬	mg/kg	36			
	铜	mg/kg	17.6			
	铅	mg/kg	20.4			
	汞	mg/kg	0.209			
	镍	mg/kg	19.0			
	石油烃（C10-C40）	mg/kg	17			
	石油类	mg/kg	330			
锌	mg/kg	24.5				

表 5.4-4 土壤环境质量评价结果

项目	检测时间：2024.8.14	
	10#平台井场永久占地内	8#平台永久占地内
砷	0.0572	0.0493
镉	0.0277	0.0243
六价铬	未检出	未检出

2023年州20区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目竣工环境保护验收调查报告

铜	0.0010	0.0010		
铅	0.0241	0.0239		
汞	0.0065	0.0060		
镍	0.0202	0.0194		
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	0.024	0.022		
四氯化碳	未检出	未检出		
氯仿	未检出	未检出		
氯甲烷	未检出	未检出		
1,1-二氯乙烷	未检出	未检出		
1,2-二氯乙烷	未检出	未检出		
1,1-二氯乙烯	未检出	未检出		
顺-1,2-二氯乙烯	未检出	未检出		
反-1,2-二氯乙烯	未检出	未检出		
二氯甲烷	未检出	未检出		
1,2-二氯丙烷	未检出	未检出		
1,1,1,2-四氯乙烷	未检出	未检出		
1,1,1,2,2-四氯乙烷	未检出	未检出		
四氯乙烯	未检出	未检出		
1,1,1-三氯乙烷	未检出	未检出		
1,1,2-三氯乙烷	未检出	未检出		
三氯乙烯	未检出	未检出		
1,2,3-三氯丙烷	未检出	未检出		
氯乙烯	未检出	未检出		
苯	未检出	未检出		
氯苯	未检出	未检出		
1,2-二氯苯	未检出	未检出		
1,4-二氯苯	未检出	未检出		
乙苯	未检出	未检出		
苯乙烯	未检出	未检出		
甲苯	未检出	未检出		
间二甲苯+对二甲苯	未检出	未检出		
邻二甲苯	未检出	未检出		
硝基苯	未检出	未检出		
苯胺	未检出	未检出		
2-氯酚	未检出	未检出		
苯并（a）蒽	未检出	未检出		
苯并（a）芘	未检出	未检出		
苯并（b）荧蒽	未检出	未检出		
苯并（k）荧蒽	未检出	未检出		
蒽	未检出	未检出		
二苯并（a,h）蒽	未检出	未检出		
茚并（1,2,3-cd）芘	未检出	未检出		
萘	未检出	未检出		
监测项目	检测时间：2024.8.14			
	10#平台井场永久占地外 10m	10#平台井场永久占地外 20m	10#平台井场永久占地外 30m	10#平台井场永久占地外 50m
石油烃	0.036	0.0140	0.005	0.004
监测项目	检测时间：2024.8.14			
	10#平台集油掺水管道临时占地外 30m	肇2-1集油阀组间至肇2转油站间总掺水		

				管线临时占地外 30m
石油烃	0.004			0.0350
监测项目	检测时间：2024.7.30			
	10#平台永久占地北侧 300m 耕地	8#平台永久占地南侧 300m 草地	10#平台集油掺水管道临时占地	肇 2-1 集油阀组间至肇 2 转油站间总掺水管线临时占地
镉 (Cd)	0.25	0.33	0.40	0.10
汞 (Hg)	0.07	0.05	0.04	0.003
砷 (As)	0.13	0.13	0.16	0.13
铅 (Pb)	0.10	0.12	0.11	0.11
铬 (Cr)	0.14	0.16	0.15	0.16
铜 (Cu)	0.19	0.19	0.18	0.11
镍 (Ni)	0.10	0.09	0.10	0.10
锌 (Zn)	0.08	0.07	0.07	/
石油烃	0.005	0.0045	未检出	0.004

由上表可知，在本次验收调查监测期间，本项目区域内土壤环境质量铅、铬、汞、砷、铜、镉、镍、锌、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C₁₀~C₄₀）满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值中第二类用地标准和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618—2018）风险筛选值标准。

本项目井场内及井场外 10m、20m、30m、50m 处的油田特征污染物石油烃相差不大，说明本项目运行期落地油对井场土壤影响不大。

（6）本次验收阶段与环评阶段土壤监测数据对比

对环评阶段的土壤环境监测数据与验收监测数据进行了对比，具体见表 5.4-5。

表 5.4-5 环评阶段、验收阶段土壤现状对比表 单位：mg/kg

监测项目	环评时期		验收时期	
	拟建井场建设用 地内	拟建井场占地外 (农用地)	井场建设用 地内	井场占地外 (农用地)
pH	7.84-8.32	7.84-8.06	8.23	7.86-8.41
镉 (Cd)	0.07-0.12	0.10	1.58-1.80	0.15-0.24
汞 (Hg)	0.015-0.023	0.019	0.228-0.247	0.15-0.24
砷 (As)	3.26-3.33	3.34	2.96-3.43	3.19-3.91
铅 (Pb)	20-25	17	19.1-19.3	17.6-20.3
铬 (六价)	未检出	/	未检出	/
铜 (Cu)	14-19	19	17.3-18.3	17.6-18.7

镍 (Ni)	22-26	24	17.5-18.2	17.5-19.0
石油烃	10-17	10-13	97-106	未检出-161
铬 (Cr)	/	52	/	36-39
锌 (Zn)	/	49	/	20.8-24.5

验收阶段土壤环境质量监测数据与环评阶段土壤环境质量监测数据对比分析未发生显著性变化，表明建设项目运营对土壤环境质量未构成显著性不良影响。

5.4.3 对农业生态环境影响调查

本项目占地中有一定量的农田，该区域农田是人工生态系统，植被是人工栽培的各种农作物，主要以玉米为主。

本项目运行期永久占用耕地 0.387hm²，使农作物的产量一定程度上的减小，但农田损失面积较小，且对占用的农田均按有关规定给予了补偿，因此永久占地对当地农业生产没有造成明显的不利影响。

5.5 防沙治沙影响调查

根据《关于贯彻落实〈沙化土地封禁保护修复制度方案〉的实施意见》的通知（黑防沙发[2020]3号），肇州县不是防沙治沙区。

根据现场调查，项目占地区域主要为耕地（非基本农田），为保护区域生态环境，采取了下列生态环境影响减缓措施和防沙治沙措施。

（1）施工结束后及时有效地对占地区域土地进行平整，并压实，利于植被自然恢复。

（2）施工时要特别注意保护原始地表与天然植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围。

（3）施工作业避免在大风天施工。

（4）路基边坡采取种草措施护坡固土，维护路基稳定和道路安全运行。

5.6 水土流失影响调查

根据《大庆市水土保持规划》（2015-2030年），大庆市划定了市级水土流失重点预防区和重点治理区，本项目不属于市级水土流失重点治理区。该区域的工作重点是采取工程、林草、封育治理和耕作等措施，进行水、田、林、草、路统一规划、综合治理，增强防洪排涝、抗御干旱等自然灾害的能力。推广先进适用的科技成果，加快治理进度。治理后应强化监督管理和管护，巩固治理成果促进区域生态环境恢复和经济发展

油田的管道敷设对土壤进行开挖和填埋，破坏土壤结构，混合土壤层次，改变土壤

质地，造成土壤养分流失，另外道路建设和油井作业使土壤紧实度增高，加上井场、道路修建造成局部大片裸地出现，这些容易引起土壤风蚀和水土流失。

对于临时占地，在对土壤进行开挖施工时要采取措施降低土壤风蚀，减少水土流失：对土壤要分层开挖、分别堆放，按原土层回填（先填心土，后覆盖表土）平埋方式（不起土坝）进行，以便其尽快恢复植被生长。本工程水土保持采取生物治理和工程质量相结合的措施，重点是施工临时占地植被恢复。

5.7 生态环境保护措施有效性分析

2023 年州 20 区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目在施工和生产过程中，按照项目“环境影响报告书”及“环境影响报告书批复”的要求，采取了一系列生态保护和恢复措施，没有改变项目区域的生态系统结构与功能，项目区域的生态组分及生物多样性未受影响，生态格局变化不大；本项目除了占地直接减少了粮食的数量外，对农业的影响较小；新增加的景观敏感度高的油水井、场站、供电线路、油田道路等，使项目区域的油田景观更加突出，但是，项目区域原有的景观格局没有发生大的改变。

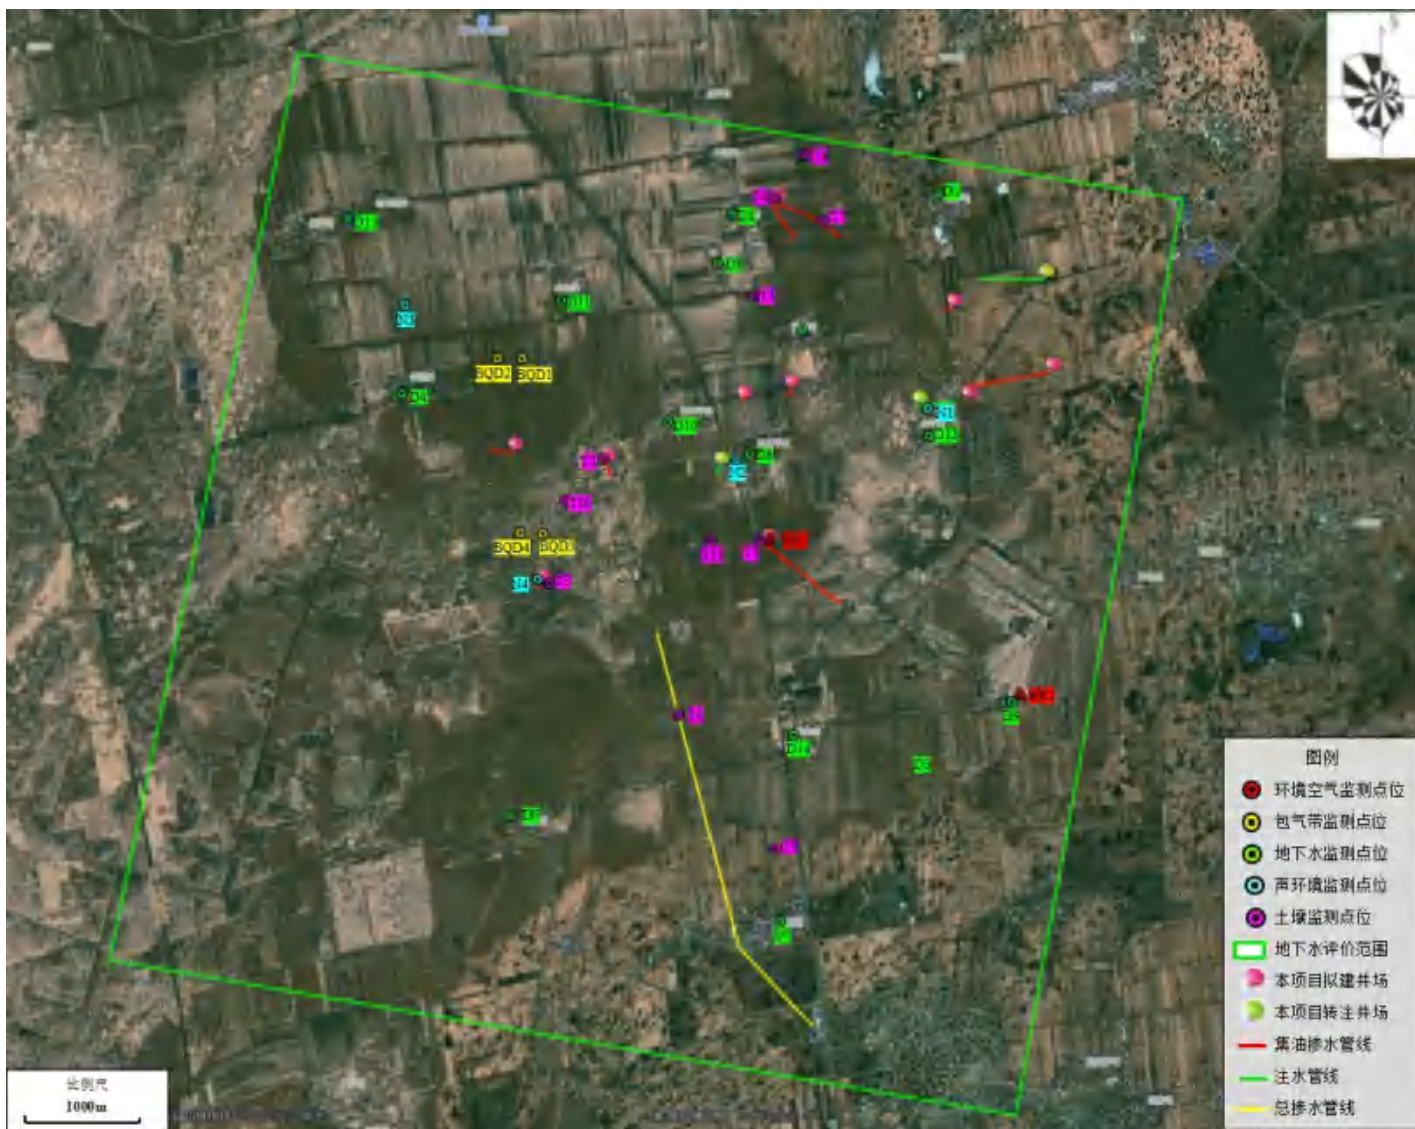


图 5-1 环境质量现状监测点位图

6 水环境影响及环境保护措施调查

6.1 污染源及防治措施调查

6.1.1 施工期水环境影响及防治措施调查

施工期管道试压废水、拆除设备和清管器清洗废水、转注井洗井废水由罐车拉运至肇一联合含油污水处理站处理，出水水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2012）标准要求中含油量 $\leq 8\text{mg/L}$ 、悬浮固体含量 $\leq 3\text{mg/L}$ 、悬浮物颗粒直径中值 $\leq 2\mu\text{m}$ 要求后，回注地下开采油层，未对区域水环境造成影响。

施工人员生活污水进入周边芳48集油阀组间、宋II-1-1集油阀组间、宋II-3-10集油阀组间、宋II-3-11集油阀组间、宋II-3-12集油阀组间等已建防渗旱厕，防渗旱厕定期清掏，未对区域内水环境造成影响。

6.1.2 运行期水环境影响及防治措施调查

本项目运行期产生的废水主要有油水分离后产生的含油污水、油井和注水井作业污水和注水井洗井污水。

由于水井尚未进行过洗井作业，通过对生产现场调查，油水井作业污水、水井洗井污水由罐车拉运至肇一联合含油污水处理站处理，出水水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2012）标准要求中含油量 $\leq 8\text{mg/L}$ 、悬浮固体含量 $\leq 3\text{mg/L}$ 、悬浮物颗粒直径中值 $\leq 2\mu\text{m}$ 要求后，回注地下开采油层。

运营期依托的宋II-3转油站、宋II-4转油站、肇2转油站、肇一联合站、宋二联合站，均无新增劳动定员，无新增生活污水。运营期15口油井采出液进入肇一联、宋二联脱水站处理，其脱出的含油污水由管道输送至肇一联、宋二联合含油污水处理站，出水水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2012）标准要求中含油量 $\leq 8\text{mg/L}$ 、悬浮固体含量 $\leq 3\text{mg/L}$ 、悬浮物颗粒直径中值 $\leq 2\mu\text{m}$ 要求后，回注地下开采油层。

6.2 地下水环境质量现状调查

（1）监测布点：为了解本项目开发后对区域内地下水质量的影响程度，根据项目特点、项目所在区域水文地质条件、区域地下水流向以及原环评阶段地下水监测点布设情

况，本次验收在调查区块内共布设6个监测点。监测点位见表6.2-1，监测点位图见图5-1。

表 6.2-1 地下水监测点位

监测点位	监测点位	井深 m	备注
D1	上游监测井（依托张辉屯水井）	15	潜水
D2	区块内监测井（依托温家屯水井）	15	潜水
D3	下游监测井（依托乐园良种场三分场水井）	15	潜水
D4	代家村水井	15	潜水
D5	李洪林村水井	15	潜水
D6	东太平山水井	15	承压水

(2) 监测因子及监测方法

监测因子： K^+ 、 Na^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 、 Cl^- 、 SO_4^{2-} 、pH、氨氮、挥发性酚类、石油类、总硬度、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞、硫化物、氰化物、铬（六价）、铁、锰、铅、镉、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数。

监测方法：地下水监测分析方法执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）有关规定。具体监测方法见表6.2-2。

表 6.2-2 地下水监测因子及监测方法一览表

序号	监测因子	分析方法名称及方法标准号	分析仪器、型号及编号
1	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 pHB-4 JRD-056
2	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标（11.1 溶解性总固体 称量法）GB/T 5750.4-2023	电子天平 FA2004 JRD-145
3	无机阴离子	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-8618 JRD-016
4	铁、锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-89	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
5	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法 1 萃取分光光度法） HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
6	高锰酸盐指数（耗氧量）	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-89	滴定管 25mL
7	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
8	汞、砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 RGF-6800 JRD-015
9	铅、镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 第二部分整合萃取法	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128

10	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
11	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-87	离子计 PXSJ-270F JRD-149
12	氰化物	氰化物的测定 容量法和分光光度法(方法 2 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法) HJ 484-2009	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
13	总大肠菌群	总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析 方法》(第四版)国家环境保护总局(2002 年)	电热恒温培养箱 DHP-360 型 JRD-003
14	细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018	电热恒温培养箱 DHP-360 型 JRD-003
15	钾、钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-89	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
16	钙、镁	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-89	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
17	碳酸根、碳酸氢根	碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析 方法》(第四版)国家环境保护总局(2002 年)	滴定管 25mL
18	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970-2018	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
19	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
20	钙和镁总量 (总硬度)	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB 7477-87	滴定管 25mL

(3) 监测时间及监测频次

监测时间：2024年8月14日-15日

监测频次：监测2天，每天2次。

(4) 监测结果

监测统计结果见表6.2-3，地下水评价结果见表6.2-4。

表 6.2-3 验收监测地下水监测结果统计

采样日期	检测项目	检测结果					
		上游监测井(依托张 辉屯水井)		区内监测井(依托 温家屯水井)		下游监测井(依托乐 园良种场三分场水 井)	
		DX24081 4Y0101	DX24081 4Y0102	DX24081 4Y0103	DX24081 4Y0104	DX24081 4Y0105	DX240814 Y0106
2024.08.14	pH 值 (无量纲)	7.4	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2
	钙和镁总量	320	316	304	310	322	318

	(总硬度,mg/L)						
	溶解性总固体 (mg/L)	495	487	479	463	511	474
	Cl ⁻ (mg/L)	4.58	4.60	6.39	6.37	6.31	6.47
	NO ₂ ⁻ (mg/L)	0.308	0.296	0.447	0.419	0.508	0.443
	NO ₃ ⁻ (mg/L)	3.69	3.95	1.62	1.65	1.33	1.73
	SO ₄ ²⁻ (mg/L)	10.7	10.8	2.22	2.10	2.28	2.02
	铁 (mg/L)	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L
	锰 (mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
	挥发酚 (mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
	高锰酸盐指数 (耗氧量, mg/L)	1.4	1.6	1.8	2.0	1.9	2.3
	氨氮 (mg/L)	0.235	0.230	0.248	0.251	0.288	0.291
	铅 (μg/L)	10L	10L	10L	10L	10L	10L
	汞 (μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
	砷 (μg/L)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
	镉 (μg/L)	1L	1L	1L	1L	1L	1L
	六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
	氟化物 (mg/L)	0.44	0.42	0.65	0.62	0.62	0.67
	氰化物 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
	总大肠菌群 (MPN/L)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
	细菌总数 (CFU/ml)	40	60	50	70	80	60
	石油类 (mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
	钾 (mg/L)	1.13	1.19	1.13	1.13	1.33	1.56
	钠 (mg/L)	30.0	26.4	29.9	38.5	35.1	26.0
	钙 (mg/L)	42.7	41.6	43.9	44.7	44.1	45.8
	镁 (mg/L)	14.2	15.3	16.5	16.4	13.4	15.3
	CO ₃ ²⁻ (mg/L)	0	0	0	0	0	0
	HCO ₃ ⁻ (mg/L)	464	414	406	420	467	460
	硫化物 (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
采样日期	检测项目	检测结果					
		代家村水井		李洪林村水井		东太平山水井	
		DX24081 4Y0107	DX24081 4Y0108	DX24081 4Y0109	DX24081 4Y0110	DX24081 4Y0111	DX240814 Y0112
2024.08.14	pH值 (无量纲)	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.4
	钙和镁总量 (总硬度,mg/L)	300	312	304	308	310	315
	溶解性总固体 (mg/L)	453	472	469	481	477	492
	Cl ⁻ (mg/L)	4.57	4.47	4.99	5.20	6.37	6.40
	NO ₂ ⁻ (mg/L)	0.418	0.305	0.407	0.339	0.423	0.437
	NO ₃ ⁻ (mg/L)	1.17	1.17	1.11	1.26	1.36	1.55
	SO ₄ ²⁻ (mg/L)	11.3	11.5	8.83	9.05	6.61	6.66
	铁 (mg/L)	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L
	锰 (mg/L)	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06
挥发酚 (mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	

	高锰酸盐指数 (耗氧量, mg/L)	1.8	2.1	2.0	1.9	2.2	2.1
	氨氮 (mg/L)	0.360	0.363	0.342	0.344	0.419	0.416
	铅 ($\mu\text{g/L}$)	10L	10L	10L	10L	10L	10L
	汞 ($\mu\text{g/L}$)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
	砷 ($\mu\text{g/L}$)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
	镉 ($\mu\text{g/L}$)	1L	1L	1L	1L	1L	1L
	六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
	氟化物 (mg/L)	0.28	0.34	0.49	0.52	0.66	0.65
	氰化物 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
	总大肠菌群 (MPN/L)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
	细菌总数 (CFU/ml)	70	60	80	70	70	60
	石油类 (mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
	钾 (mg/L)	1.15	1.12	1.14	1.14	1.14	1.12
	钠 (mg/L)	27.1	28.9	30.6	35.6	32.6	30.0
	钙 (mg/L)	45.0	43.9	45.8	41.3	41.6	45.6
	镁 (mg/L)	16.4	16.3	15.4	16.3	15.3	15.3
	CO_3^{2-} (mg/L)	0	0	0	0	0	0
	HCO_3^- (mg/L)	406	409	419	422	432	425
	硫化物 (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
采样日期	检测项目	检测结果					
		上游监测井(依托张 辉屯水井)	区内监测井(依托 温家屯水井)		下游监测井(依托乐 园良种场三分场水 井)		
2024.08.15	pH 值 (无量纲)	7.2	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4
	钙和镁总量 (总硬度,mg/L)	314	322	303	314	324	318
	溶解性总固体 (mg/L)	479	491	503	485	471	463
	Cl^- (mg/L)	4.65	4.66	6.44	6.48	6.47	6.44
	NO_2^- (mg/L)	0.270	0.290	0.424	0.402	0.479	0.435
	NO_3^- (mg/L)	4.07	4.04	1.56	1.44	1.55	1.53
	SO_4^{2-} (mg/L)	11.0	11.1	2.03	2.02	2.13	2.02
	铁 (mg/L)	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L
	锰 (mg/L)	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06
	挥发酚 (mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
	高锰酸盐指数 (耗氧量, mg/L)	1.5	1.7	1.8	2.3	1.6	1.8
	氨氮 (mg/L)	0.243	0.240	0.267	0.264	0.294	0.296
	铅 ($\mu\text{g/L}$)	10L	10L	10L	10L	10L	10L
	汞 ($\mu\text{g/L}$)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
	砷 ($\mu\text{g/L}$)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
	镉 ($\mu\text{g/L}$)	1L	1L	1L	1L	1L	1L
	六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
氟化物 (mg/L)	0.44	0.45	0.66	0.69	0.64	0.66	
氰化物 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	

	总大肠菌群 (MPN/L)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
	细菌总数 (CFU/ml)	50	80	60	60	70	70
	石油类 (mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
	钾 (mg/L)	1.23	1.27	1.28	1.41	1.14	1.18
	钠 (mg/L)	31.4	33.4	33.2	32.2	38.2	31.0
	钙 (mg/L)	42.7	42.5	43.3	42.7	46.7	41.3
	镁 (mg/L)	14.7	15.1	13.4	13.8	15.1	16.1
	CO ₃ ²⁻ (mg/L)	0	0	0	0	0	0
	HCO ₃ ⁻ (mg/L)	400	418	438	429	411	409
	硫化物 (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
采样日期	检测项目	检测结果					
		代家村水井		李洪林村水井		东太平山水井	
2024.08.15	pH 值 (无量纲)	7.1	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3
	钙和镁总量 (总硬度,mg/L)	330	328	310	305	309	311
	溶解性总固体 (mg/L)	454	475	499	483	508	484
	Cl ⁻ (mg/L)	4.34	4.37	5.24	5.08	6.47	6.25
	NO ₂ ⁻ (mg/L)	0.291	0.251	0.372	0.371	0.487	0.392
	NO ₃ ⁻ (mg/L)	1.03	1.03	1.44	1.23	1.34	1.33
	SO ₄ ²⁻ (mg/L)	11.1	11.3	9.16	8.79	6.60	5.94
	铁 (mg/L)	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L
	锰 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06
	挥发酚 (mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
	高锰酸盐指数 (耗氧量, mg/L)	2.0	2.2	2.1	2.4	2.3	2.1
	氨氮 (mg/L)	0.360	0.358	0.350	0.352	0.395	0.398
	铅 (μg/L)	10L	10L	10L	10L	10L	10L
	汞 (μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
	砷 (μg/L)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
	镉 (μg/L)	1L	1L	1L	1L	1L	1L
	六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
	氟化物 (mg/L)	0.44	0.45	0.51	0.51	0.63	0.60
	氰化物 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
	总大肠菌群 (MPN/L)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
	细菌总数 (CFU/ml)	80	70	70	80	60	70
	石油类 (mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
	钾 (mg/L)	1.12	1.21	1.34	1.43	1.51	1.22
钠 (mg/L)	25.8	29.4	29.1	29.2	29.6	26.9	
钙 (mg/L)	43.3	42.5	45.6	42.7	42.5	42.7	
镁 (mg/L)	13.9	14.0	14.4	14.7	14.7	14.8	
CO ₃ ²⁻ (mg/L)	0	0	0	0	0	0	
HCO ₃ ⁻ (mg/L)	418	422	409	416	450	448	
硫化物 (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	

表 6.2-4 验收监测地下水评价结果表

监测项目	监测点位（最大标准指数）		
	上游监测井（依托张辉屯水井）	区块内监测井（依托温家屯水井）	下游监测井（依托乐园良种场三分场水井）
pH	0.40	0.40	0.33
总硬度（以CaCO ₃ 计）	0.72	0.70	0.72
溶解性总固体	0.50	0.50	0.51
耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)	0.57	0.77	0.77
挥发性酚类	未检出	未检出	未检出
氰化物	未检出	未检出	未检出
氟化物	0.45	0.69	0.67
氨氮	0.49	0.53	0.59
六价铬	未检出	未检出	未检出
砷	未检出	未检出	未检出
铅	未检出	未检出	未检出
铁	未检出	未检出	未检出
汞	未检出	未检出	未检出
锰	0.70	0.60	0.70
镉	未检出	未检出	未检出
石油类	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	未检出	未检出	未检出
菌落总数	0.80	0.70	0.80
监测项目	监测点位（最大标准指数）		
	代家村水井	李洪林村水井	东太平山水井
pH	0.33	0.40	0.40
总硬度（以CaCO ₃ 计）	0.73	0.69	0.70
溶解性总固体	0.48	0.50	0.51
耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)	0.73	0.80	0.77
挥发性酚类	未检出	未检出	未检出
氰化物	未检出	未检出	未检出
氟化物	0.45	0.51	0.66
氨氮	0.73	0.70	0.84
六价铬	未检出	未检出	未检出
砷	未检出	未检出	未检出
铅	未检出	未检出	未检出
铁	未检出	未检出	未检出
汞	未检出	未检出	未检出
锰	0.60	0.70	0.70
镉	未检出	未检出	未检出
石油类	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	未检出	未检出	未检出
菌落总数	0.80	0.80	0.70

从本次验收监测结果可以看出，周边村屯评价区域第四系孔隙潜水水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准要求。地下水承压水水环境质量均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准；石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值（≤0.05mg/L）。

(5) 本次验收阶段与环评阶段监测数据对比

本次验收，对环评阶段的监测数据与验收监测数据进行了对比，具体见表 6.2-5。

表 6.2-5 环评阶段验收阶段地下水现状对比表

监测项目	村屯地下水	
	环评时期	验收时期
K ⁺	1.24-3.01	1.12-1.56
Na ⁺	43.9-61.3	25.8-38.5
Ca ²⁺	34.8-52.2	41.3-46.7
Mg ²⁺	7.46-11.1	13.4-16.5
HCO ₃ ⁻	176-244	400-467
CO ₃ ²⁻	0	0
Cl ⁻	34.6-51.4	4.34-6.47
SO ₄ ²⁻	24.5-46.7	2.02-11.5
pH	7.5-7.9	7.1-7.6
总硬度	118-176	300-330
溶解性总固体	384-556	453-511
耗氧量	1.8-2.3	1.4-2.4
挥发酚	未检出	未检出
氰化物	未检出	未检出
氟化物	0.466-0.604	0.28-0.69
硝酸盐	1.69-2.72	1.03-4.07
亚硝酸盐	未检出	0.251-0.508
氨氮	0.179-0.289	0.230-0.419
六价铬	未检出	未检出
砷	未检出	未检出
铅	未检出	未检出
铁	0.22-0.28	未检出
汞	未检出	未检出
锰	0.04-0.13	0.05-0.07
镉	未检出	未检出
石油类	未检出	未检出
总大肠菌群	未检出	未检出
菌落总数	7-12	40-80
硫化物	未检出	未检出

注：pH 无量纲、总大肠菌群 MPN/100mL、菌落总数 CFU/mL、其余 mg/L

与原环评阶段监测结果对比可知，本次验收监测地下水水质整体与原环评阶段变化不大，油田开发特征污染物石油类与挥发酚均未检出，可见本工程的建设对地下水环境影响不大。

(6) 地下水化学类型分析

项目所在地地下水水质八大离子浓度评价结果见下表 6.2-6。

表 6.2-6 项目所在地地下水水质八大离子浓度评价结果

监测井点位	离子名称	毫克当量 (mg/L)	毫克当量百分比 (%)	离子毫克当量合计 (mg/L)		相对误差%	矿化度
				阴离子	阳离子		
D1	HCO ₃ ⁻	464.0	0.603	8.0	4.7	-0.262	0.5673
	CO ₃ ²⁻	0	0.000				
	Ca ²⁺	42.7	0.169				
	Mg ²⁺	14.2	0.094				
	Cl ⁻	4.58	0.010				
	SO ₄ ²⁻	10.7	0.018				
	K ⁺	1.13	0.002				
	Na ⁺	30	0.103				
D2	HCO ₃ ⁻	406	0.565	6.9	4.9	-0.168	0.5060
	CO ₃ ²⁻	0	0.000				
	Ca ²⁺	43.9	0.186				
	Mg ²⁺	16.5	0.117				
	Cl ⁻	6.39	0.015				
	SO ₄ ²⁻	2.22	0.004				
	K ⁺	1.13	0.002				
	Na ⁺	29.9	0.110				
D3	HCO ₃ ⁻	467	0.600	7.9	4.9	-0.235	0.5695
	CO ₃ ²⁻	0	0.000				
	Ca ²⁺	44.1	0.173				
	Mg ²⁺	13.4	0.087				
	Cl ⁻	6.31	0.014				
	SO ₄ ²⁻	2.28	0.004				
	K ⁺	1.33	0.003				
	Na ⁺	35.1	0.120				
D4	HCO ₃ ⁻	406	0.562	7.0	4.8	-0.185	0.5115
	CO ₃ ²⁻	0	0.000				
	Ca ²⁺	45	0.190				
	Mg ²⁺	16.4	0.115				
	Cl ⁻	4.57	0.011				

	SO ₄ ²⁻	11.3	0.020				
	K ⁺	1.15	0.002				
	Na ⁺	27.1	0.099				
D5	HCO ₃ ⁻	419	0.566	7.2	4.9	-0.186	0.5258
	CO ₃ ²⁻	0	0.000				
	Ca ²⁺	45.8	0.189				
	Mg ²⁺	15.4	0.106				
	Cl ⁻	4.99	0.012				
	SO ₄ ²⁻	8.83	0.015				
	K ⁺	1.14	0.002				
	Na ⁺	30.6	0.110				
D6	HCO ₃ ⁻	432	0.580	7.4	4.8	-0.213	0.5356
	CO ₃ ²⁻	0	0.000				
	Ca ²⁺	41.6	0.170				
	Mg ²⁺	15.3	0.105				
	Cl ⁻	6.37	0.015				
	SO ₄ ²⁻	6.61	0.011				
	K ⁺	1.14	0.002				
	Na ⁺	32.6	0.116				

通过对区域内地下水八大离子监测结果可知，本项目所在区域地下水化学类型以 HCO₃-Na+Ca, 4-A 型淡水型为主，地下水矿化度较低，水质情况较好。根据上表可知，项目区域水质总阳离子（钠、钾、钙、镁）与阴离子（硫酸盐、氯化物、碳酸盐、重碳酸盐）毫克当量浓度相对误差不大于 5%，阴阳离子平衡。

6.3 包气带现状调查

本次验收选取本项目新建井场以及调查区域外清洁对照点开展包气带污染现状监测,选取4个点进行分层取样监测。根据项目污染源特征和包气带岩性和结构特征,在0~20cm,20~40cm埋深范围内取两个样品,对样品进行浸溶实验,项目的监测点见表6.3-1及监测布点见图5-1。

表 6.3-1 包气带监测点布设

调查点	采样深度	备注
10#平台永久占地内	取1个柱状样(0~20cm,20~40cm)	污染调查点
10#平台永久占地北侧300m耕地	取1个柱状样(0~20cm,20~40cm)	清洁对照点
8#平台永久占地内	取1个柱状样(0~20cm,20~40cm)	污染调查点
8#平台永久占地南侧300m草地	取1个柱状样(0~20cm,20~40cm)	清洁对照点

(1) 监测因子: pH、汞、砷、铅、铬、石油类、挥发酚、镉、镍、铜

(2) 监测时间及频次: 2024年8月14日一次性监测。

(3) 监测结果: 监测结果统计见表6.3-2。

表 6.3-2 包气带现状调查结果

采样时间	检测项目	单位	检测结果			
			10#平台永久占地内(0-20cm)	10#平台永久占地内(20-40cm)	10#平台永久占地北侧300m耕地(0-20cm)	10#平台永久占地北侧300m耕地(20-40cm)
2024.08.14	pH值	无量纲	7.3	7.6	7.6	7.5
	砷	($\mu\text{g/L}$)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
	镉	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	铬	(mg/L)	0.16	0.16	0.16	0.19
	铜	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	铅	(mg/L)	5.3	5.3	5.2	5.3
	汞	($\mu\text{g/L}$)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
	镍	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	锌	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	六价铬	(mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
	石油类	(mg/L)	0.19	0.16	0.17	0.14
	挥发酚	(mg/L)	0.0048	0.0028	0.0043	0.0023
采样时间	检测项目	单位	检测结果			
			8#平台永久占地内(0-20cm)	8#平台永久占地内(20-40cm)	8#平台永久占地南侧300m草地(0-20cm)	8#平台永久占地南侧300m草地(20-40cm)
2024.08.14	pH值	无量纲	7.6	7.5	7.4	7.4
	砷	($\mu\text{g/L}$)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
	镉	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	铬	(mg/L)	0.19	0.16	0.13	0.13

铜	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
铅	(mg/L)	5.6	4.6	4.9	5.1
汞	(μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
镍	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
锌	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
六价铬	(mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
石油类	(mg/L)	0.24	0.22	0.17	0.18
挥发酚	(mg/L)	0.0016	0.0025	0.0018	0.0029

通过表 6.3-2 可知，在本次验收监测中，污染调查点中井场和场站的污染监测点与清洁对照点各项监测指标无明显差别，与建设区域外清洁对照点各项监测指标无明显差别，且不同取样深度监测指标无明显差别，说明本项目评价区域内包气带未受到影响。

6.4 地表水环境现状调查

本项目不排放废水，外输油管道跨越西大干渠，为了解项目建设后对区域内地表水影响，本次调查对西大干渠水质进行监测。

(1) 监测点位

本次评价在跨越西大干渠处布设 1 个地表水监测点，监测点布设情况见表 6.4-1。

表 6.4-1 监测点布设情况

编号	监测点位	地理坐标
1#	西大干渠	125.117399, 45.826705

(2) 监测因子

pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、石油类、水温。

(3) 监测频次

2024 年 7 月 30 日、8 月 2 日，每天一次。

(4) 监测结果

水质监测数据见表 6.4-2。

表 6.4-2 地表水监测数据表 单位：mg/L (pH 无量纲)

采样时间	检测点位	检测项目	检测结果
2024.07.30	西大干渠	pH 值 (无量纲)	7.2
		化学需氧量 (mg/L)	38
		氨氮 (mg/L)	0.731
		高锰酸盐指数 (mg/L)	11.6
		硫化物 (mg/L)	0.01L
		石油类 (mg/L)	0.01L
		水温 (°C)	26.2
采样时间	检测点位	检测项目	检测结果
2024.08.02	西大干渠	pH 值 (无量纲)	7.1
		化学需氧量 (mg/L)	40
		氨氮 (mg/L)	0.726
		高锰酸盐指数 (mg/L)	13.3

	硫化物（mg/L）	0.01L
	石油类（mg/L）	0.01L
	水温（℃）	24.8

（5）本次验收阶段与环评阶段监测数据对比

本次验收，对环评阶段的监测数据与验收监测数据进行了对比，具体见表 6.4-3。

表 6.4-3 环评阶段验收阶段地表水现状对比表

监测项目	西大干渠	
	环评时期	验收时期
pH 值（无量纲）	7.8-8.0	7.1-7.2
化学需氧量（mg/L）	101-111	38-40
氨氮（mg/L）	0.763-0.774	0.726-0.731
高锰酸盐指数（mg/L）	8.5-8.8	11.6-13.3
硫化物（mg/L）	0.0003L	0.01L
石油类（mg/L）	0.01L	0.01L

与原环评阶段监测结果对比可知，本次验收监测地表水水质整体与原环评阶段变化不大，油田开发特征污染物石油类与硫化物均未检出，可见本工程的建设对地表水环境影响不大。

6.5 含油污水污染防治措施调查

根据例行监测报告可知，肇一联合含油污水处理站、宋二联合含油污水处理站含油污水处理站出水水质含油量浓度为 0.84-1.11mg/L，悬浮固体含量浓度为 2-3mg/L，悬浮物颗粒直径中值为 1 μ m，出水满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2012）标准要求：含油量 \leq 8mg/L、悬浮固体含量 \leq 3.0mg/L、粒径中值 \leq 2 μ m。

6.6 水环境保护措施有效性分析

根据现场调查可知，项目在环评和批复中提出的各项水污染控制措施在工程开发建设中都得到了落实。本项目产生的生产污水处理达标后全部回注油田，项目没有设置工业污水排放口，生产污水不外排。本项目的水污染防治措施符合环评文件及其批复的要求。对地表水、地下水环境影响不大。根据现有环境监测数据表明，企业采取的污染治理措施能够使废水达标后回注，环境污染可控。

7 大气环境影响及环境保护措施调查

7.1 污染源及防治措施调查

7.1.1 施工期大气污染物调查

本工程施工期对大气环境的影响主要是钻井时柴油机烟气及施工车辆排放的尾气，道路、井场、管道施工产生的扬尘、管道焊接烟尘，由于这些影响都是暂时性的，施工一结束就随之消失，对周围空气环境产生的影响较小。

由于本工程周围较空旷，施工周期较短，工程施工过程中未对周围大气环境造成影响。

7.1.2.运行期大气污染源调查

本项目运行期排放的废气主要是依托场站内加热炉产生的锅炉烟气和井场、依托场站无组织排放的非甲烷总烃。各场站加热炉均以天然气为燃料，本项目油气集输均采用了密闭流程，最大限度降低了烃类气体的挥发，同时加强了油田气放空的管理：定期对设备进行维修保养，保证油气处理设施的平稳运行，最大程度上减少了事故性油田气放空。

7.2 大气环境质量现状调查

(1) 监测布点

为了解油田开发后对区域内大气环境质量的影响程度，结合环评阶段环境空气质量现状监测点位的布设原则，并根据油田开发与居民区分布情况，本次验收在评价区域内及周围布设1个环境空气质量监测点，详见表7.2-1，图5-1。

表 7.2-1 大气监测点位置表

监测点名称	监测因子	备注
小场子屯	非甲烷总烃	与环评一致

(2) 监测因子与监测方法

监测因子：非甲烷总烃。

监测方法：监测方法执行《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样气相色谱法》（HJ 604-2017）中相关规定，监测同时监测气温、气压、风向和风速等气象（具体见检测报告）。具体监测方法见表7.2-2。

表 7.2-2 环境空气监测因子及监测方法一览表

序号	监测因子	监测方法	方法来源	检出限
1	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样--气相色谱法	HJ 604-2017	0.07 mg/m ³

(3) 监测时间与监测频次

监测时间：2024年8月14日-15日。

监测频次：非甲烷总烃每天4次，连续2天。

4、监测结果

监测结果见表 7.2-3，本次验收监测与环评监测数据对比情况见表 7.2-4。

表 7.2-3 环境空气质量验收监测数据 单位：mg/m³

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			
2024.08.14	小场子屯	非甲烷总烃	0.63	0.67	0.64	0.65
2024.08.15	小场子屯		0.61	0.64	0.68	0.74

表 7.2-4 环境空气质量验收监测数据与环评监测数据对比表

监测点位	监测项目	环评监测数据 (mg/m ³)	验收监测数据 (mg/m ³)
		(浓度变化范围)	(浓度变化范围)
小场子屯	非甲烷总烃	0.49-0.82	0.61-0.74

监测结果表明，在本次验收调查监测期间，各监测点非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求，区域空气环境质量良好。根据表 7.2-4 的对比结果可知，非甲烷总烃与油田开发前监测值相比相差不大，满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。

7.3 废气污染防治措施调查

7.3.1 无组织排放非甲烷总烃防治措施调查

本项目运行期非甲烷总烃主要来自于油气集输过程的无组织挥发。本项目采取密闭集输工艺，降低了烃类物质的挥发。为了解非甲烷总烃无组织排放情况，本次验收选取主要场站及代表井场进行非甲烷总烃的监测。

(1) 监测布点

本次验收选取本项目油水井数最多的 10#平台井场进行井场非甲烷总烃监测；选取肇一联合站、宋二联合站厂界内及 10#井场厂界四周进行场站非甲烷总烃监测。具体布设点位详见表 7.3-1。

表 7.3-1 非甲烷总烃无组织排放监测点位表

点号	监测点名称	备注
10#平台井场	厂界上风向 1#	本项目平台井
	厂界下风向 2#	
	厂界下风向 3#	
	厂界下风向 4#	
肇一联合站	厂界上风向 1#	依托场站
	厂界下风向 2#	
	厂界下风向 3#	
	厂界下风向 4#	
	厂区内部加热炉处	
宋二联合站	厂界上风向 1#	依托场站
	厂界下风向 2#	
	厂界下风向 3#	
	厂界下风向 4#	
	厂区内部加热炉处	

(2) 监测因子和监测方法

监测因子：非甲烷总烃

监测方法：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和国家规定的分析方法。具体见表 7.3-2。

表 7.3-2 非甲烷总烃监测方法

监测因子	监测方法	方法来源	检出限
非甲烷总烃	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	0.07 mg/m ³

(3) 监测时间和监测频次

监测时间：肇一联合站和宋二联合站监测时间为 2024 年 7 月 18 日-19 日，10#平台监测时间为 2024 年 8 月 14 日-15 日。

监测频次：监测 2 天，每天 3 次

(4) 监测结果

无组织排放监测结果见表 7.3-3。

表 7.3-3 非甲烷总烃无组织排放监测结果

采样日期	检测项目	检测结果			
		10#平台井场厂界上风向 1#	10#平台井场厂界下风向 2#	10#平台井场厂界下风向 3#	10#平台井场厂界下风向 4#
2024.08.14	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.62	0.73	0.75	0.74
		0.61	0.76	0.79	0.79
		0.63	0.78	0.81	0.71
采样日期	检测项目	检测结果			
		10#平台井场厂界上风向 1#	10#平台井场厂界下风向 2#	10#平台井场厂界下风向 3#	10#平台井场厂界下风向 4#
2024.08.15	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.66	0.81	0.84	0.78
		0.65	0.73	0.85	0.77
		0.64	0.75	0.83	0.75

2023年州20区块葡萄花油层产能建设工程(合作)项目竣工环境保护验收调查报告

采样日期	检测项目	检测结果			
		肇一联合站厂界上风向1#	肇一联合站厂界下风向2#	肇一联合站厂界下风向3#	肇一联合站厂界下风向4#
2024.07.18	非甲烷总烃(mg/m ³)	0.60	0.72	0.76	0.73
		0.63	0.71	0.72	0.74
		0.61	0.70	0.76	0.75
采样日期	检测项目	检测结果			
		肇一联合站厂界上风向1#	肇一联合站厂界下风向2#	肇一联合站厂界下风向3#	肇一联合站厂界下风向4#
2024.07.19	非甲烷总烃(mg/m ³)	0.61	0.80	0.73	0.86
		0.65	0.83	0.78	0.83
		0.62	0.81	0.76	0.89
采样日期	检测项目	检测结果			
		宋二联合站厂界上风向1#	宋二联合站厂界下风向2#	宋二联合站厂界下风向3#	宋二联合站厂界下风向4#
2024.07.18	非甲烷总烃(mg/m ³)	0.60	0.72	0.77	0.79
		0.64	0.71	0.78	0.80
		0.61	0.73	0.75	0.82
采样日期	检测项目	检测结果			
		宋二联合站厂界上风向1#	宋二联合站厂界下风向2#	宋二联合站厂界下风向3#	宋二联合站厂界下风向4#
2024.07.19	非甲烷总烃(mg/m ³)	0.64	0.71	0.75	0.90
		0.60	0.75	0.74	0.94
		0.63	0.73	0.78	0.92
采样日期	检测项目	采样频次	检测结果		
			肇一联合站加热炉处	宋二联合站加热炉处	
2024.07.18	非甲烷总烃(mg/m ³)	第1次	0.66	0.74	
		第2次	0.68	0.76	
		第3次	0.74	0.79	
		第一次1小时均值	0.69	0.76	
		第1次	0.70	0.84	
		第2次	0.75	0.85	
		第3次	0.69	0.73	
		第二次1小时均值	0.71	0.81	
		第1次	0.76	0.74	
		第2次	0.71	0.70	
		第3次	0.74	0.78	
		第三次1小时均值	0.74	0.74	
2024.07.19	非甲烷总烃(mg/m ³)	第1次	0.61	0.72	
		第2次	0.69	0.74	
		第3次	0.68	0.71	
		第一次1小时均值	0.66	0.72	
		第1次	0.63	0.76	
		第2次	0.71	0.73	
		第3次	0.66	0.72	
		第二次	0.67	0.74	

	1 小时均值		
	第 1 次	0.66	0.71
	第 2 次	0.61	0.74
	第 3 次	0.62	0.71
	第三次 1 小时均值	0.63	0.72

通过监测结果可知，10#平台井场厂界上下风向10m内非甲烷总烃浓度为0.61-0.84mg/m³，肇一联合站厂界上下风向10m内非甲烷总烃浓度为0.60-0.89mg/m³，送二联合站厂界上下风向10m内非甲烷总烃浓度为0.60-0.94mg/m³。井场及现有场站厂界非甲烷总烃均满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）边界限值要求。

肇一联合站厂区内加热炉处非甲烷总烃1h平均浓度为0.66-0.76mg/m³，任意一次浓度为0.63-0.74mg/m³；宋二联合站厂区内加热炉处非甲烷总烃1h平均浓度为0.70-0.85mg/m³，任意一次浓度为0.72-0.81mg/m³，均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中监控点处1h平均浓度值≤10mg/m³，监控点处任意一次浓度值≤30mg/m³要求。

通过对风向的监测结果可知，上下风向非甲烷总烃浓度变化不大，可见本项目做到了较好的密闭集输工艺，项目的建设对区域环境空气影响不大。

7.3.2 锅炉烟气防治措施调查

本项目锅炉烟气主要为依托场站加热装置产生的加热炉烟气，均使用清洁燃料——天然气为燃料。

（1）监测点位

本次验收为了解本项目依托场站加热炉烟气排放情况，根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ 612-2011）中规定，选取了有代表性的肇2转油站、肇一联合站、宋二联合站加热炉进行现场监测。

（2）监测因子和监测方法

监测因子：SO₂、NO_x、颗粒物、烟气黑度；

监测方法：按照GB3095、GB16297和GB5468中的有关规定进行监测。具体监测方法见表7.3-4。

表 7.3-4 加热炉烟气监测因子监测方法一览表

序号	监测因子	监测方法	方法来源	检出限
1	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	HJ 836-2017	1.0mg/m ³
2	SO ₂	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法	HJ 57-2017	3mg/m ³

3	NO _x	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法	HJ 693-2014	3mg/m ³
4	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法	HJ/T 398-2007	--

(3) 监测时间和监测频次

监测时间：肇一联合站和宋二联合站监测时间为2024年7月30日、8月2日，肇2转油站监测时间为2024年8月8-9日。

监测频次：监测2天，每天监测3次

(4) 监测结果

本次验收监测结果均为折算后数值，具体监测结果见表7.3-7。

表 7.3-7 加热炉废气监测数据 单位：mg/m³

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2027.07.30	肇一联合站加热炉排气筒	废气排放量(Nm ³ /h)	2123	2056	2103
		低浓度颗粒物排放浓度(mg/m ³)	9.0	9.5	9.2
		低浓度颗粒物排放浓度(mg/m ³)	13.5	14.0	13.3
		实测 SO ₂ 排放浓度(mg/m ³)	3L	3L	3L
		折算后 SO ₂ 排放浓度(mg/m ³)	/	/	/
		实测 NO _x 排放浓度(mg/m ³)	81	76	79
		折算后 NO _x 排放浓度(mg/m ³)	121	112	114
		O ₂ 含量 (%)	9.3	9.1	8.9
		烟温 (°C)	122.3	123.5	120.6
		气压 (kPa)	100.4	100.1	100.6
	烟气黑度 (级)	<1	<1	<1	
	宋二联合站加热炉排气筒	废气排放量(Nm ³ /h)	2014	2035	1989
		低浓度颗粒物排放浓度(mg/m ³)	9.1	8.5	9.3
		低浓度颗粒物排放浓度(mg/m ³)	12.9	12.5	12.8
		实测 SO ₂ 排放浓度(mg/m ³)	3L	3L	3L
		折算后 SO ₂ 排放浓度(mg/m ³)	/	/	/
		实测 NO _x 排放浓度(mg/m ³)	76	74	81
		折算后 NO _x 排放浓度(mg/m ³)	108	104	112
		O ₂ 含量 (%)	8.7	8.5	8.3
		烟温 (°C)	131.2	120.4	124.6
气压 (kPa)		100.3	100.4	100.4	
烟气黑度 (级)	<1	<1	<1		

2027.08.02	肇一联合站加热炉排气筒	废气排放量(Nm ³ /h)	2035	1996	2058
		低浓度颗粒物排放浓度(mg/m ³)	9.0	8.9	9.2
		低浓度颗粒物排放浓度(mg/m ³)	13.2	12.8	13.8
		实测SO ₂ 排放浓度(mg/m ³)	3L	3L	3L
		折算后SO ₂ 排放浓度(mg/m ³)	/	/	/
		实测NO _x 排放浓度(mg/m ³)	79	80	82
		折算后NO _x 排放浓度(mg/m ³)	116	115	123
		O ₂ 含量(%)	9.1	8.8	9.3
		烟温(°C)	120.6	121.5	120.9
		气压(kPa)	100.3	100.5	100.3
		烟气黑度(级)	<1	<1	<1
	宋二联合站加热炉排气筒	废气排放量(Nm ³ /h)	2203	2102	2078
		低浓度颗粒物排放浓度(mg/m ³)	8.3	9.0	8.4
低浓度颗粒物排放浓度(mg/m ³)		11.6	12.9	11.9	
实测SO ₂ 排放浓度(mg/m ³)		3L	3L	3L	
折算后SO ₂ 排放浓度(mg/m ³)		/	/	/	
实测NO _x 排放浓度(mg/m ³)		88	81	86	
折算后NO _x 排放浓度(mg/m ³)		123	116	121	
O ₂ 含量(%)		8.5	8.8	8.6	
烟温(°C)		129.3	125.4	126.1	
气压(kPa)		100.3	100.4	100.3	
烟气黑度(级)		<1	<1	<1	
2024.08.08	肇2转油站加热炉排气筒	废气排放量(Nm ³ /h)	1982	1874	1945
		低浓度颗粒物排放浓度(mg/m ³)	10.6	11.4	10.9
		低浓度颗粒物排放浓度(mg/m ³)	13.8	14.7	14.4
		实测SO ₂ 排放浓度(mg/m ³)	3L	3L	3L
		折算后SO ₂ 排放浓度(mg/m ³)	/	/	/
		实测NO _x 排放浓度(mg/m ³)	75	73	72
		折算后NO _x 排放浓度(mg/m ³)	98	94	95
		O ₂ 含量(%)	7.6	7.4	7.8
		烟温(°C)	120.3	119.5	120.7
		气压(kPa)	100.1	100.1	100.0
		烟气黑度(级)	<1	<1	<1

2024.08.09	肇2转油站 加热炉排 气筒	废气排放量(Nm ³ /h)	2014	1948	2034
		低浓度颗粒物排放浓度 (mg/m ³)	12.0	12.1	12.6
		低浓度颗粒物排放浓度 (mg/m ³)	16.0	15.8	16.3
		实测 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	3L	3L	3L
		折算后 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	/	/	/
		实测 NO _x 排放浓度 (mg/m ³)	81	79	76
		折算后 NO _x 排放浓度 (mg/m ³)	108	103	99
		O ₂ 含量 (%)	7.9	7.6	7.5
		烟温 (°C)	120.8	120.4	120.9
		气压 (kPa)	100.3	100.2	100.4
		烟气黑度 (级)	<1	<1	<1

根据验收监测数据可知：

肇一联合站加热炉：NO_x 的排放浓度为 112-123mg/m³、颗粒物的排放浓度为 12.8-14.0mg/m³，SO₂ 排放浓度为 3Lmg/m³，烟气黑度（级）<1；宋二联合站加热炉：NO_x 的排放浓度为 104-123mg/m³、颗粒物的排放浓度为 11.6-12.9mg/m³，SO₂ 排放浓度为 3Lmg/m³，烟气黑度（级）<1；肇2转油站加热炉：NO_x 的排放浓度为 94-108mg/m³、颗粒物的排放浓度为 10.6-16.0mg/m³，SO₂ 排放浓度为 3Lmg/m³，烟气黑度（级）<1。依托场站均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉标准限值的要求，且烟囱高度均符合标准要求。

7.4 大气环境保护措施有效性分析

现场调查及监测结果表明，油田生产采用全密闭工艺流程，烃类气体的损失量可以控制在 0.015%以内，场站、井场无组织排放的非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中限值要求；依托场站内排放的非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 排放限值要求。

宋 II-3 转油站、宋 II-4 转油站、肇2转油站、肇一联合站、宋二联合站等本项目涉及的场站加热炉和采暖炉均使用处理后的干气（天然气）作燃料，排放的废气污染物符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉标准限值的要求。本项目的大气污染防治措施符合环评文件及其批复的要求。

环境质量现状监测结果表明，本项目区域非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。与环评监测结果比较，本项目建设前（评价阶段）后（验收阶段）项目区域的环境空气质量相比相差不大，说明本项目开发建设对项目区域的环境空气质量影

响不大。

经以上分析可知，本项目废气经采取相应措施后对周围环境空气影响不大。根据现有环境监测数据表明，企业采取的污染治理措施能够使废气达标排放，环境污染可控。建设单位应继续加强管理，将油田开发对环境空气的影响控制到最低。

8 声环境影响及环境保护措施调查

8.1 污染源及防治措施调查

8.1.1 施工期声环境污染源及防治措施调查

本项目未在夜间进行施工，合理安排了施工进度，避免大量高噪声设备同时施工；且施工期间定期对设备进行维护和保养，设备均正常运转，没有产生异常噪声污染，施工期选用了低噪声设备；定期对施工设备进行了保养维护，保证了设备保持在最佳运行状态，降低了噪声源强度，运输车辆选择了避开居民区的路线。施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定的标准限值要求。经调查，本项目施工期间没有发生噪声扰民事件。

8.1.2.运行期声环境污染源及防治措施调查

经调查，本项目井场电机和场站机泵均选用了低噪声设备且设置了减振基础，井场工作人员每天对油水井进行巡查，保障油水井正常稳定运行。场站工作人员每两个月对设备进行维护保养，保障设备正常稳定运行，场站机泵均集中布置在泵房内，并且加装了隔声门窗，根据本次验收监测结果，井场厂界噪声经距离衰减后可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，依托场站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

8.2 声环境质量现状监测

（1）监测布点

本次验收调查，对区域声环境敏感目标进行监测，设3个声环境监测点位，具体监测点布设见表8.2-1，监测点位图见图5-1。

表 8.2-1 声环境质量现状监测点位置

序号	监测点	监测坐标	项目位置关系
N1	太平岭村	125.155685, 45.849464	芳 172-134 井东南侧 120m; 4#平台西南侧 210m
N2	东太平山村	125.133437, 45.845304	芳 180-124 井西侧 155m
N3	三新村	125.128155, 45.804366	肇 2-1 集油阀组间至肇 2 转油 站间总掺水管道东侧 115m

（2）监测因子和监测方法

监测因子：连续等效 A 声级（Leq）

监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定（新建项目）进行测量。

（3）监测时间和监测频次

监测时间：2024年9月20日-9月21日

监测频次：分昼间、夜间两个时段进行，各监测1次，连续监测2天。

（4）监测结果

监测统计结果见表 8.2-2，本次验收监测与环评监测数据对比情况见表 8.2-3。

表 8.2-2 声环境质量监测结果 单位：dB（A）

监测点位	2024.9.20		2024.9.21	
	昼间	夜间	昼间	夜间
太平岭村	52	41	51	40
东太平山村	51	40	52	41
三新村	50	41	51	42

表 8.2-3 声环境验收监测结果与环评监测结果对比表

项目	太平岭村		东太平山村		三新村	
	环评现状	验收监测	环评现状	验收监测	环评现状	验收监测
昼间（dB(A)）	47.8-47.9	51-52	48.4-48.5	51-52	48.5-48.8	50-51
夜间（dB(A)）	43.5-43.8	40-41	44.0-44.2	40-41	44.3-44.4	41-42

由表 8.2-2 可知，在本次验收调查监测期间，本区块内较近的敏感点附近声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

由表 8.2-3 可知，本项目附近敏感点声环境在环评阶段和验收期间变化不大，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，可见本项目油田开发并未对周边环境造成明显影响。

8.3 噪声污染防治措施调查

本项目运行期噪声源主要来自依托场站内设备运行噪声和油井机泵运行噪声。

8.3.1 厂界噪声的调查监测

（1）监测布点：根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）中 6.3.4“对无明显生产周期、污染物稳定排放、连续生产的建设项目，厂界噪声监测一般不少于 2 天，每天不少于昼夜各 1 次”。本次验收调查，选取对项目声环境影响较大的肇一联合站、宋二联合站厂界四周作为厂界噪声监测点，厂界噪声监测点位见表 8.3-1。

表 8.3-1 厂界噪声监测点位

序号	监测点名称	备注
1	肇一联合站	厂界四周各 1 个监测点
2	宋二联合站	厂界四周各 1 个监测点

（2）监测因子：Leq（A）。

（3）监测频次：2024年9月26日-9月27日连续监测2天，每天昼夜各一次。

(4) 分析方法：噪声监测项目、分析方法、检出限见表 8.3-2。全部监测过程，按照相关标准和规范中的要求进行质量控制；样品分析中采用平行双样进行自控。监测中所使用的各类仪器，经黑龙江省计量检定测试院等检定机构检定或校准，检定合格且在有效期内。

表 8.3-2 噪声监测项目、分析及检出限

监测项目	标准方法名称及代号	检出限
噪声	声环境质量标准GB3096-2008	无检出限
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008	无检出限

(5) 监测结果

监测统计结果见表 8.3-3。

表 8.3-3 厂界噪声监测结果单位：dB (A)

检测点位	检测结果							
	2024.09.26				2024.09.27			
	时间	测量值	时间	测量值	时间	测量值	时间	测量值
肇一联合站 厂界东侧外 1m	09:39	57	22:41	43	09:36	57	22:38	44
肇一联合站 厂界南侧外 1m	09:44	57	22:47	43	09:41	57	22:43	43
肇一联合站 厂界西侧外 1m	09:48	56	22:52	45	09:46	56	22:49	44
肇一联合站 厂界北侧外 1m	09:55	56	22:57	45	09:51	57	22:55	45
宋二联合站 厂界东侧外 1m	10:26	56	23:23	43	10:20	56	23:21	44
宋二联合站 厂界南侧外 1m	10:30	57	23:27	43	10:24	56	23:26	44
宋二联合站 厂界西侧外 1m	10:37	58	23:32	46	10:29	57	23:30	46
宋二联合站 厂界北侧外 1m	10:42	56	23:36	44	10:35	57	23:35	45
标准值	/	60	/	50	/	60	/	50

由表 8.3-3 可知，在本次验收调查监测期间，依托场站厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。

8.3.2 井场厂界噪声的调查监测

(1) 监测布点

为了解本项目噪声排放情况，本次验收选取井数较多的10#平台井进行衰减噪声监测。具体监测布点见表8.3-4。

表 8.3-4 井场衰减噪声布设点位 单位：dB(A)

点号	监测点名称	监测因子
10#平台井场	井场永久占地外 1m 处	连续等效 A 声级 (Leq)
	井场永久占地外 10m 处	
	井场永久占地外 20m 处	
	井场永久占地外 30m 处	

(2) 监测因子和监测方法

监测因子：连续等效 A 声级 (Leq)

监测方法：按照《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的规定监测。

(3) 监测时间和监测频次

监测时间：2024年9月20日-9月21日。

监测频次：分昼间、夜间两个时段进行，各监测1次，连续监测2天。

(4) 监测结果

监测统计结果见表8.3-5。

表 8.3-5 井场衰减噪声监测结果 单位：dB(A)

检测点位	检测结果							
	2024.09.20				2024.09.21			
	时间	测量值	时间	测量值	时间	测量值	时间	测量值
10#平台井场 井场厂界外 1m	07:13	58	22:02	49	07:05	59	22:04	48
10#平台井场 井场厂界外 10m	07:18	56	22:07	48	07:11	56	22:08	47
10#平台井场 井场厂界外 20m	07:23	53	22:12	45	07:17	54	22:13	46
10#平台井场 井场厂界外 30m	07:29	51	22:17	44	07:22	53	22:18	44
标准值	/	60	/	50	/	60	/	50

由表8.3-5可知，在本次验收调查监测期间，10#平台井场噪声经距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

8.4 声环境影响措施有效性分析

本次调查可知，本项目建设区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，周边村屯声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准，本项目油田开发未对声环境造成明显影响。本项目场站机泵集中布置于室内，并加装减震

基座、隔声门窗等减振降噪措施。场站、井场机泵产生的噪声经采取相应措施后对周围环境影响不大。根据现有环境监测数据表明，企业采取的污染治理措施能够使噪声达标排放，本项目噪声污染防治措施符合环评文件及其批复的要求。环境污染可控。

9 固体废物环境影响及环境保护措施调查

9.1 污染源及防治措施调查

9.1.1 施工期固体废物防治措施

本项目管道施工废料属于一般固废，拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。设备拆除产生的建筑垃圾送市政指定地点填埋。拆除机泵、油井树等设备（蒸汽冲洗后不含油）拉运到大庆模范屯油田有限责任公司资产回收库。施工人员产生的生活垃圾分类收集后，拉运至肇州县生活垃圾填埋场填埋处理。

本项目对以上各类固体废物均采取了有效的污染防治措施。

9.1.2 运行期固体废物防治措施

落地油及含油污泥统一收集后拉运委托大庆市庆兴环保科技有限公司进行处理，处理后泥渣含油量满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》（DB23/3104-2022）标准限值（石油类 $\leq 3000\text{mg/kg}$ ）。

含油废弃防渗布统一收集后，暂存在第八采油厂三矿危废暂存间后，委托黑龙江兰溪谷环保科技发展公司转运处置。

9.2 固体废物污染防治效果调查

9.2.1 含油污泥处置措施调查

本项目含油污泥委托大庆市庆兴环保科技有限公司进行处理。该站采用减量化处理装置生产线和序批式热解析装置生产工艺，含油污泥后泥渣含油量满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》（DB23/3104-2022）标准限值（石油类 $\leq 3000\text{mg/kg}$ ）综合利用。

根据监测报告，经处理后泥渣含油量满足《油田含油污泥综合利用污染控制标准》（DB23/T1413-2010）农用标准（石油类 $\leq 3000\text{mg/kg}$ ）。

9.2.2 防渗布处置措施调查

油水井作业期间，井场铺设防渗布以防含油污水渗入地下，减少落地油的产生，在作业结束后，统一收集定期委托黑龙江兰溪谷环保科技发展公司处置。危险废物经营许可证见下图。

经调查，本项目运行至今尚未进行油水井作业，无防渗布产生。

10 社会环境影响调查

10.1 施工期社会影响调查

本工程位于黑龙江省大庆市肇州县新福乡境内。工程建设过程中车辆往来可能对区域交通运输造成一定影响，但区域属于农村地区，交通量较小，工程建设时间短，不会造成长时间交通拥堵。

本建设项目未涉及拆迁，建设项目用地范围内无文物古迹、景点及景观。同时，项目的建设促进了当地经济的发展。本项目施工场地周围没有工业企业、学校、医院等敏感点，所以社会影响较小。本项目施工期间未产生扰民现象，无环境投诉事件。

10.2 运营期社会影响调查

截止目前，本项目基建的 18 口油水水井正常运行，未发生环境污染事故及周边村民上访事件。

11 环境风险防范及应急措施调查

11.1 环境风险事故调查

项目的风险事故主要是运营期管线穿孔、储罐破裂造成的泄漏、由于施工质量和操作不当引起的原油泄漏，以及油气泄漏后，一旦遇到明火、高温、雷电和静电放电等点火源，极易引发的火灾和爆炸。

经现场实地调查，本项目运行期间均未发生过原油泄漏等突发环境事故。

11.2 环境风险识别

本工程主要危险物质为原油和挥发产生的烃类气体——油田气，均有易燃、易爆的性质，属于火灾危险性甲类物质。

11.2.1 原油的危险性识别

原油密度为 0.863t/m^3 ，低发热值 10000kcal/kg ，比热 $0.5\text{kcal}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ ，凝固点 33°C ，原油为低毒性物质，其火灾爆炸性主要表现在以下几方面：

(1) 原油的油蒸汽和空气混合达到一定浓度时，遇火即能爆炸。

(2) 易蒸发，原油蒸发主要有静止蒸发和流动蒸发两种，原油容器内压力每降低 0.1MPa ，一般有 $0.8\text{-}10\text{m}^3$ 油蒸气析出，蒸发出的油蒸气由于密度比较大，不易扩散，往往在储存处或作业场地空间地面弥漫飘荡，在低洼地集聚不散，增加了火灾爆炸的危险程度。

(3) 容易产生静电。在易燃液体中石油产品的电阻率一般在 $10^{12}\Omega\cdot\text{cm}$ 左右，电阻率较高，电导率较小，积累电荷的能力越强，因此，石油产生在泵送、灌装、装卸、运输等作业中，流动摩擦、喷射、冲击、过滤都会产生静电，当能量达到或大于油品蒸气最小引燃能量时，就可能点燃可燃性混合气，引起爆炸或燃烧。

(4) 容易受热膨胀、沸溢。原油受热膨胀，蒸气压升高，会噪声储存容器鼓凸现象，相反，高温油品在储存中冷却，会造成油品收缩而使储油容器产生负压，使容器被大气压瘪而损坏。含水油品着火受热还会发生沸溢，燃烧的油品大量外溢，甚至从罐中喷出，引燃其他物品而造成重大火灾和人身伤亡事故。

11.2.2 油田气的危险性识别

油田气主要成分是含大量低分子烷烃混合物，重度为 0.91kg/m^3 （标态），比重 0.7 ，低发热值 1012kcal/m^3 ，比热 $0.4935\text{cal}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ ，最小引燃能量 0.28mJ ，属甲类易燃气

体，与空气混合极易燃烧爆炸，为低毒性物质。

油气田明火极易爆炸。其密度比空气轻时，如泄漏会无限制的扩散，空气形成爆炸性混合物，而且能随风飘动，形成火灾爆炸和蔓延的重要条件，遇明火会引着回热；密度大于空气时，泄漏后易存留在地表、低洼、沟坑、死角处，长时间不散，增加了火灾、爆炸的危险性。

11.3 环境风险影响分析调查

11.3.1 事故状态下大气环境风险分析

原油主要存在于转油站、联合站“三合一”、沉降罐内，天然气主要存在于天然气干燥器内。

原油、天然气均在储罐中密闭贮存，不具备发生火灾爆炸的条件。但是由于储罐的阀门、法兰连接处泄漏，操作失误等情况下，导致大量原油泄漏或天然气释放，在空气中形成易爆炸气体，一旦遇有点火源即可引发火灾、爆炸事故。

事故时天然气或原油泄漏将导致局部大气中总烃浓度可比正常情况高出数倍甚至数十倍，对大气环境造成短时的严重污染。若遇明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量燃烧烟气、次生CO，对大气环境造成短时的严重污染。

依托场站各处均设有可燃气体报警装置，同时各储罐均设有液面控制装置，并进行信息化统计，本项目投产运行至今，未发生站场原油、天然气泄漏事故。

11.3.2 事故状态下地表水环境风险分析

本项目事故状态下运行期对水体产生污染的途径主要为集油掺水管道、站场原油储罐泄漏。本项目在运行期对集输管道、原油储罐定期进行检测，防止腐蚀穿孔引起原油、含油污水泄漏污染环境，同时对位于土壤腐蚀性较强的低洼地带，采用外防腐管道，以延长埋地管道使用寿命。另外加强巡检巡视，及时发现问题及时处理事故，对泄漏原油、含油污水及时回收处理。

本项目投产运行至今，尚未发生泄漏污染周围水环境事故。

11.3.3 事故状态下地下水环境风险分析

（1）套管破损对地下水影响分析

事故状态下对地下水的环境影响主要为套管发生破裂发生泄漏。由于井管是由不同长度的节管连接而成，容易在节点处发生破损。根据大庆油田生产实际统计，套管破损的机率一般为万分之一至五万分之一，破损在某一固定结点的机率约为百分之一，则套

损泄漏污染地下水的最大概率约为二百万分之一。可见，套管破损的情况虽然存在，但经过层层防护，危险逐级递减，破损后最终发生气水串层或是油气直接泄漏到含水层造成污染的概率并不大。

本项目投产运行至今，尚未发生套管破损污染地下水环境事故。

（2）管道泄漏对地下水的影响分析

本工程事故状态下对地下水污染途径主要是集输管道、集油管道、注水管道等事故泄漏。

一旦发生泄漏，原油、含油污水就可能会渗透到含水层中，造成地下水环境污染。资料研究结果表明：石油类污染物在一般土壤中绝大部分集中在泄漏层以下 0-10cm 及 10-30cm 范围，一般下渗深度在 80cm 以内，一般很难下渗 2m 以下，存在对潜水含水层造成影响的可能，但影响范围有限，一般在几百米范围。而承压含水层一般都有隔水顶板，与潜水层相互隔离，其透水性很差，因此对承压水层产生影响的可能性很小。

集输管道、注水管道站场配备压力阀，外输油管道配备压力实时监控系统，能够及时发现事故，管道各截断阀在事故情况下及时关闭，避免大量凝析油、废水泄露。且巡线工能够及时赶赴现场进行处理，对周边影响较小。

本项目投产运行至今，尚未发生管道泄漏污染地下水环境事故。

（3）站场储罐对地下水的影响分析

本工程事故状态下对地下水污染途径主要是站场储罐事故泄漏。

一旦发生泄漏，原油、含油污水就可能会渗透到含水层中，造成地下水环境污染。资料研究结果表明：石油类污染物在一般土壤中绝大部分集中在泄漏层以下 0-10cm 及 10-30cm 范围，一般下渗深度在 80cm 以内，一般很难下渗 2m 以下，存在对潜水含水层造成影响的可能，但影响范围有限，一般在几百米范围。而承压含水层一般都有隔水顶板，与潜水层相互隔离，其透水性很差，因此对承压水层产生影响的可能性很小。

站场储罐配备液面检测装置，能够及时发现事故，各截断阀在事故情况下及时关闭，破损罐内物料转移至事故罐内，避免大量凝析油、废水泄露。且巡线工能够及时赶赴现场进行处理，对周边影响较小。

本项目投产运行至今，尚未发生站场储罐泄漏污染地下水环境事故。

11.3.4 事故状态下对土壤环境风险分析

原油泄漏渗入土壤孔隙，会降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。一般而言，原油集中于土壤表层 0-30cm 的范围内，使得根系分布于此深度的植物

不能生长。

石油类对土壤的污染，可使土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响局部区域土壤正常的结构和功能。事故性原油的大规模泄漏可影响耕地的生态环境，危害植物生长。其危害最显著的表现是植物，原油黏附于枝叶，阻止植物进行光合作用，可使植物枯萎死亡；在土壤中粘附于植物根系，可阻止植物吸收水分和矿物质而死亡。

本项目投产运行至今，尚未发生石油类污染土壤事故。

11.4 环境风险防范措施调查

经调查，本项目环境风险事故主要包括钻井井喷事故、集输系统事故以及场站事故，《大庆模范屯油田有限责任公司环境突发事件专项应急预案》已针对以上环境风险事故制定了切实有效的，具有针对性的风险防范措施，落实了环评及批复的要求。

11.4.1 集输管线泄漏的防范及处理措施

- (1) 施工队伍经严格挑选，确保了管道施工质量。
- (2) 防腐管道在下沟、回填前均进行了防腐层检测。
- (3) 对工程中使用的设备及附件严格进行了施工安装前的质量检验，检验合格后方进行施工安装。
- (4) 在土壤腐蚀严重地区采用了抗腐蚀的非金属管线，减少由于设施因素引发油水大量泄漏事故的可能性。
- (5) 系统定期进行维修保养，及时更换老化管线、设备。
- (6) 定时对采油井和管线进行了巡查，并加强了夜间巡查，以便及时发现管线、阀门、设备的渗漏、穿孔问题。
- (7) 按时校验了注水系统压力表，保证压力表完好准确。生产时密切关注系统压力变化，一旦系统压力有大的降低，将及时报告，找到管线泄漏点，及时处理，避免污水大量泄漏。

11.4.2 场站事故的防范措施

- (1) 站内对地层压力进行了监控，合理安排注采比，预防了套损事故的发生；
- (2) 站内定时巡检，及时发现并处理了容器、罐体、管线和阀门的泄漏、穿孔问题，避免了大量油水泄漏发生；
- (3) 对容器、设备和站内管线定期进行维护保养；
- (4) 火灾的风险防范措施如下：

①油气处理场站大部分区域均为 2 区爆炸性气体危险环境作业场所，爆炸危险区域内所用的设备、电器、自控仪表均采用防爆型，并符合相应的防爆等级；

②站内对可能散发原油蒸气或可燃气体泄漏并聚集的厂房或封闭作业场所设置了排风系统和可燃气体检测与自动报警装置；


③为防止系统憋压或误操作造成密闭设备的超压破坏或爆炸，所有压力容器及油罐均设有安全阀、呼吸阀等泄压设施。站场可燃气体设备的安全阀出口泄放管已接至火炬系统；

④生产设备集中布置，并布置在全年最小风频风向的上风侧及站内边缘部位；


⑤站内架空输油管线、集油罐均设置了防雷、防静电接地装置；对生产场所超过安全电压的电气设备均采取了保护接零或接地措施；

⑥转油站等危险较大的场所设置了半固定式消防系统和移动式泡沫灭火器，并设环形消防车道，以便于消防车通行和险情急救；

⑦站场内的防雷接地设施及报警装置定期进行校检，保证安全设施可靠有效。

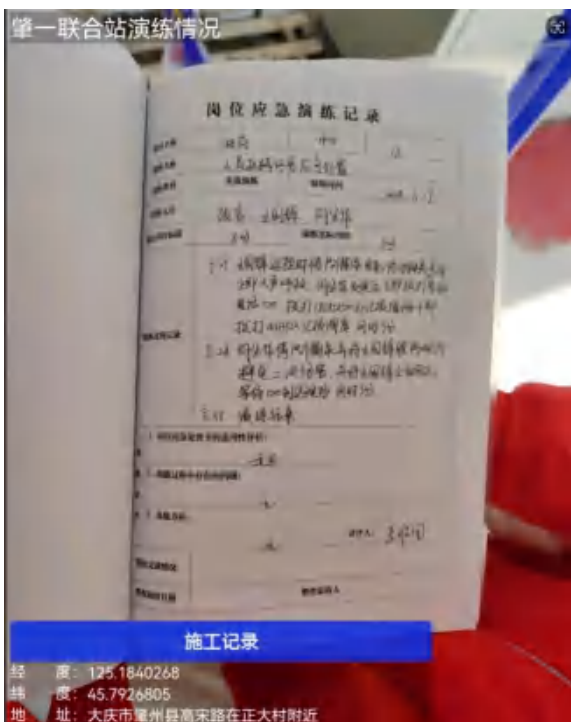

肇一联合站应急演练记录

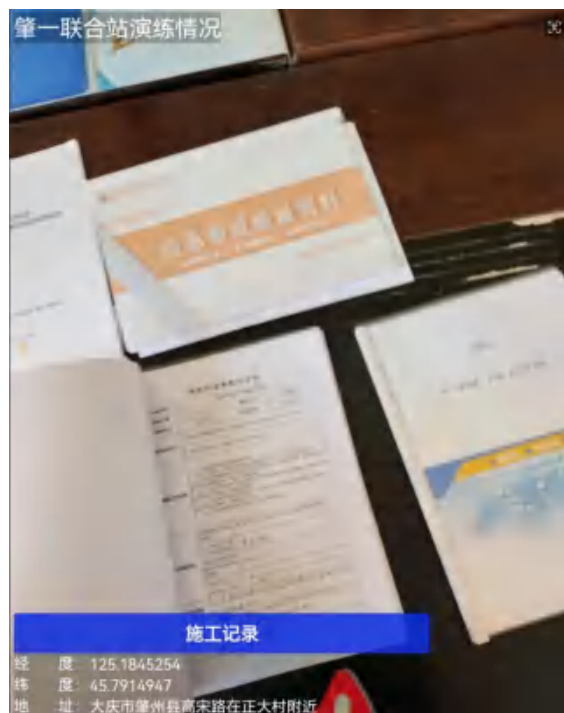

肇一联合站应急演练记录



图 11.4-1 依托场站风险防范措施

11.5 应急组织机构及职责

突发环境事件应急组织体系由应急工作领导小组、应急指挥中心、现场应急指挥部组成。突发环境事件应急领导小组对事故的全过程负责。

应急救援保障系统由各应急救援工作组组成，各工作组分别由相关专业人员组成，紧急状态下，由应急救援指挥部统一指挥，分兵把关，各司其职，迅速展开救援工作，承担紧急抢险救援任务。各相关部门要在各自的职责范围内，相互支持和协同，共同做好应急救援工作。应急组织机构见图 11.5-1。组成和分工见表 11.5-1。

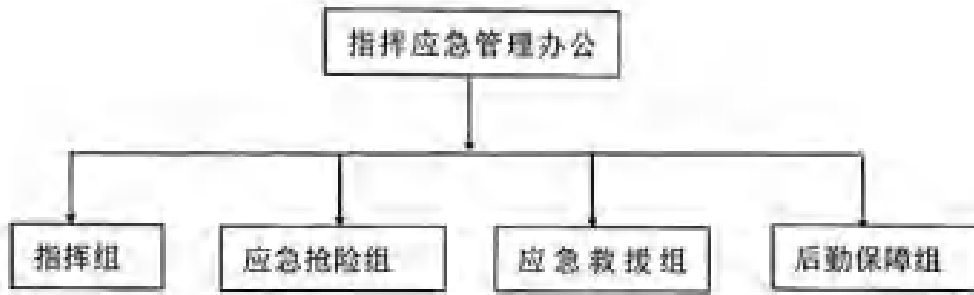


图 11.5-1 应急组织机构图
表 11.5-1 应急组织、职责分工表

组成	职责
应急领导小组	在模范屯油田应急领导小组的授权下，负责领导环境突发事件的应急救援工作，下达预警、结束预警、启动应急响应、结束应急响应等指令。负责审定环境突发事件现场应急救援方案，研究解决处置过程中的重大问题。根据现场应急救援需要，组织协调应急救援队伍及各类应急物资设备。负责组织环境突发事件专项应急预案的评估、制修订及内部评审。负责审核对外发布和上报的事件信息。贯彻落实模范屯油田应急领导小组的有关指示，视情况向模范屯油田应急领导小组提出向政府及上级主管部门请求支援的建议。
应急办公室	负责编制、修订模范屯油田《环境突发事件专项应急预案》，负责开展环境突发事件及环境应急知识培训，指导模范屯油田所属单位开展环境突发事件

	的预案编制、演练、修订、备案、应急物资储备工作。落实现场指挥部指令，负责协调现场处置过程中遇到的环保相关问题。落实环境突发事件应急领导小组指令，做好环境应急管理日常工作
现场应急指挥部	根据模范屯油田应急领导小组授权，负责现场应急救援指挥工作，针对环境突发事件发展制定和调整现场应急救援方案。收集现场信息，核实现场情况，保证现场与模范屯油田应急领导小组及地方政府应急部门之间信息传递的及时、畅通。负责整合调配现场应急资源。及时向环境应急领导小组和地方政府汇报应急处置情况。配合地方政府应急救援工作。收集、整理应急处置过程中的有关资料。落实应急终止条件并向大庆模范屯油田有限责任公司应急领导小组请示应急终止。编写现场应急救援过程评估、总结报告
应急专家组	为应急救援提供决策建议，参与制订现场应急工作方案。参加现场救援工作，为现场处置提供技术支持。完成环境突发事件应急领导小组交办的其他任务
机关有关部门	机关其他部门负责业务领域内的相关应急管理工作，以及在突发事件处置工作中提供协助和保障。

11.6 应急保障

为了及时处理生产中各类突发事故，建设单位已经针对可能发生的风险事故，结合所处区域的自然条件、环境状况、地理位置等特点，制定了较完善的事故风险应急预案，根据企业提供资料及现场调查，油公司现有总体应急预案，下设突发环境事故专项应急预案、火灾爆炸事故专项应急预案、油田开发突发事故应急预案、集输系统专项应急预案，并针对应急预案每月进行一次风险应急演练，同时根据每个环节可能发生的环境风险准备了突发事件的应急物资，具体见表 11.6-1。

表 11.6-1 应急设施、设备、器材

工艺环节	应急设施、设备、器材	针对事故
转油站	抽油罐车、电焊车、吊车、推土机、水罐车、防爆工具、防毒面具、防火帽、清油器、撇油器、毛毡、擦布、收油桶、消防斧、铁锹、防渗布、回收水池、灭火器、便携式收油罐	场站事故
采油队	抽油罐车、电焊车、吊车、推土机、水罐车、防爆工具、防毒面具、防火帽、清油器、撇油器、毛毡、擦布、收油桶、消防斧、铁锹、回收水池、灭火器、收油桶、应急灯、呼吸器、潜水泵、报警器	管道事故

11.7 应急预案有效性分析

大庆模范屯油田有限责任公司编制了《大庆模范屯油田有限责任公司环境突发事件专项应急预案》，该应急预案主要针对项目运营过程中可能突发的各种环境风险事故等制定了详细的安全应急救援预案。预案中包含了应急救援任务和目标、原则、组织机构、应急救援职责、突发事件信息报送及处置、应急响应和处置、应急措施以及应急救援值班电话和联络电话，充分保证了项目运营期发生的风险事故得到及时救援和处理。降低了环境风险的危害。应急预案制定完毕后，应急预案的实施更为重要。因此，建议大庆模范屯油田有限责任公司开展应急预案的宣传教育，保证每一个工作人员都熟悉预案的内容，定期开展应急预案的演练，检查预案的有效性和符合性，对存在的不足及时修正。

本项目运行以来未发生环境风险事故，可见采取的环境风险防范措施及应急预案切实有效。



应急演练现场照片



应急演练现场照片

图 11.7-1 应急演练

12 清洁生产调查

12.1 生产工艺核查

12.1.1 采油、集输工艺

建设项目采用水驱采油工艺，油井采出液采用环状掺水和双管掺水集油工艺密闭输送至计量站，经计量后由密闭管线实施油、水、气三相混合输送至依托转油站进行气液分离，分离油田伴生气经密闭管线外输；转油站、脱水站脱水分离产生的含油污水经密闭管道输送至葡二联合油污水处理站依托处理；脱水后原油外输计入油田产能。

建设项目油井采出液整个集输、处理工艺过程中物料输送均采用密闭方式运行，验收监测调查表明，原油开采、集输及依托场站气、油、水分离输送生产过程，仅井场、依托场站装置动静密封点存在少量的无组织排放非甲烷总烃。整个地面集输生产工艺符合清洁生产实施源头控制的环境保护要求。

12.1.2 井下作业工程的清洁生产

(1) 本项目在修井、清蜡等井下作业时，通过安装防喷器、泄油器等井口及井下装置，防止井喷、泄漏等事故的发生，同时铺设防渗布，减少落地原油排放量，同时减少对地下水的污染。

(2) 本项目井下作业时通过使用作业废水进站装置和井口溢流回收装置，将作业产生的污油、污水收集起来，再打回集输系统，最终进入葡二联合油污水处理站处理达标后回注。

12.2 资源能源利用核查

(1) 生产过程中，采用多种措施减少新鲜水的消耗，如含油污水处理达标后回注。

(2) 油气集输采用密闭流程可有效控制轻烃损耗。

(3) 加热炉均采用了高效节能型加热炉，降低燃料气消耗。

12.3 末端治理技术调查

12.3.1 废气污染治理

建设项目运营中，大气污染固定源为依托转油站加热炉，所有依托转油站加热炉均采用清洁能源（天然气）为燃料，烟气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放限值要求。

12.3.2 废水污染治理

本项目油井产液分离产生的含油污水、油水井作业污水、水井洗井污水均进入葡二联合含油污水处理站处理。

含油污水处理站处理后出水水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中限制要求：含油量 $\leq 10\text{mg/L}$ 、悬浮固体含量 $\leq 5\text{mg/L}$ 、粒径中值 $\leq 2\mu\text{m}$ ，回注地下开采油层，不外排，废水回用率为100%。

12.3.3 固废污染治理

本项目进行井下作业时，铺设防渗布，落地油回收率为100%，落地油、站场清淤含油污泥拉运至大庆市庆兴环保科技有限公司进行处理，处理后的泥渣满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》（DB23/T 3104-2022）要求，返回油田作业区内可用于通井路和井场建设、筑路和铺路、作业场地地面覆盖、围堰等材料的活动；或者在油田作业区域外用于物流仓储用地、工业厂区道路与交通设施用地以及危险废物填埋场、固体废物填埋场封场等材料的活动。

含油废弃防渗布统一收集，定期委黑龙江兰溪谷环保科技发展公司处置。固废处置率为100%。

12.4 环境管理调查

建设单位已取得《排污许可证》，建设项目运营中污染物排放达到相关排放标准，符合国家环境保护法律、法规、标准、规范要求。

建设单位清洁生产管理职能设置在大庆模范屯油田有限责任公司质量安全环保部，配备了相关管理人员。

大庆模范屯油田有限责任公司建立并运行了健康、安全和环境（HSE）管理体系。

13 污染物排放总量控制调查

本项目的生产废水没有直接排入外环境，本项目不新增定员，运行期无新增生活污水。本工程新增废气污染物按实际排放总量为肇2转油站新建1台0.2MW外输炉排放的SO₂、NO_x、颗粒物及新增产能排放的非甲烷总烃。新增总量由肇一联合站2021年拆除1台0.58MW外输炉进行平衡。

环评阶段核定的新增污染物排放量SO₂为0.023t/a、NO_x为0.14t/a、颗粒物为0.021t/a；实际排放总量计算时，污染物排放浓度根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）并结合验收监测结果，污染物排放浓度取加权平均浓度，经计算，得出本项目实际分担量为：SO₂为0.023t/a、NO_x为0.14t/a、颗粒物为0.021t/a，项目分担量指标与环评阶段预计对比表见表13-1。

表 13-1 项目分担量指标与环评阶段预计对比表

污染物名称	环评阶段 (t/a)	实际排放分担量 (t/a)	本项目变化量 (t/a)
SO ₂	0.023	0.023	0
NO _x	0.14	0.14	0
颗粒物	0.021	0.021	0

本项目非甲烷总烃挥发量为10.35t/a，符合环评阶段提出的排放量控制指标要求。

14 环境管理及环境监测计划落实情况调查

14.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

本项目自立项以来，建设单位按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》以及环境保护主管部门的要求和规定，严格执行了环境影响评价制度。

2022 年 3 月，黑龙江环盛环保科技开发有限公司编制了《2023 年州 20 区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目环境影响报告书》，大庆市生态环境局于 2023 年 4 月 25 日对本项目环境影响报告书进行了批复（庆环审[2023]44 号），环保手续齐全。

随后建设单位严格按照环评及批复要求进行了环保设施与主体工程的建设，环保设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用（三同时），并对施工时期产生的污染进行了控制，对临时占地进行了平整恢复。

投入营运后，建设单位严格按照环评文件及环保局批复执行环境保护措施，投入了一定的人力、物力，加强管理和养护，对临时占地破坏的植被进行了及时恢复，目前长势良好，水土流失得到治理。并按规定程序提出了竣工验收申请；环境影响报告书及其批复的提出的各项环保措施均已落实。

综上所述，建设单位执行了建设项目环境保护“三同时”制度。

14.2 环保管理机构的设置及人员配备

本项目的环境管理由大庆模范屯油田有限责任公司负责，大庆模范屯油田有限责任公司隶属大庆油田第八采油厂，大庆模范屯油田有限责任公司已经建立了 HSE 管理体系和相应的管理机构。HSE 管理体系针对废水、废气、噪声、固废排放管理和资源能源消耗、化学品使用、各类跑冒滴漏等方面制定了运行控制程序和相应的管理制度，各采油作业区都制定了更为细化的针对性的作业指导书。环境管理机构基本设置如下：在公司设 HSE 委员会，下设 HSE 办公室，庆模范屯油田有限责任公司设 HSE 管理小组。各层下属单位设环保员一名，相应基层单位经理为 HSE 管理体系的第一负责人，对单位日常生产过程中的相关环境工作进行管理。

14.3 环境管理规章制度

本项目的环境保护工作严格执行国家、省市的环保法律法规，同时大庆模范屯油田有限责任公司还制定了相应的环境管理规章制度，环保法规及油田内部的各种环境管理

规章制度已经下发到相应人员，并组织有关人员或全体员工学习和贯彻执行，以确保环境管理工作的顺利进行。

（1）施工期环境管理

本工程施工期环境管理工作由大庆模范屯油田有限责任公司安全环保部负责，引入环境监理制度，推行环保监理和检查制度。由大庆模范屯油田有限责任公司安全环保部对环境保护工作进行全过程监控，对环境保护措施强制推行，控制施工阶段的环境污染和生态破坏。施工期除设置 1 名专职环保员外，还应根据现场实际情况，建立健全相应的二级 QHSE 管理网络，在油田已有 QHSE 指挥部的基础上，配备 QHSE 现场监督人员。分别配备协调员，实行逐级负责制。

环境管理工作包括钻井、井下作业、地面建设施工全过程。针对钻井过程管理、井喷等事故的预防和处理上，制定相应的事故预防措施、事故应急措施以及恢复措施等。环境管理重点为废弃钻井液、钻井污水、钻井岩屑、废弃射孔液、试压废水、生活污水、生活垃圾等污染物的收集和处理。

施工期应急演练记录及照片见图 14.3-1。

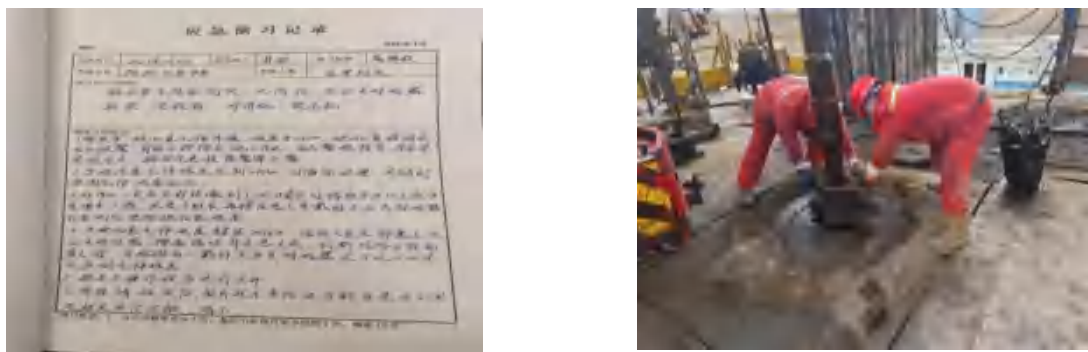


图 14.3-1 施工期应急演练记录及照片

（2）运营期环境管理

①环境管理体系建设情况

大庆模范屯油田有限责任公司已逐步形成完整的 QHSE 管理体系。该体系执行《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014），其中环境管理的内容符合 ISO14000 系列标准规定的环境管理体系原则以及天然气开采、集输等有关标准的要求。

大庆模范屯油田有限责任公司设有二级 HSE 管理网络，在油田已有 HSE 指挥部的基础上，分别配备数名 HSE 现场监督人员。分别配备协调员，实行逐级负责制。

HSE 机构在环境管理上的主要任务包括：负责制定本油田施工作业的环境管理方案，

制定发生事故的应急计划，监督各项环保措施的落实及环保工程的检查和预验收，负责协调与地方环保、水利、土地等部门的关系以及负责有关环保文件、技术资料的收集建档等。

②环境管理机构及制度建设情况

本工程环境管理归大庆模范屯油田有限责任公司管理，逐级落实岗位责任制；各层下属单位设环保员一名，相应基层单位经理为 HSE 管理体系的第一负责人，对单位日常生产过程中的相关环境工作进行管理。

根据现场调查，大庆模范屯油田有限责任公司针对企业实际制定了如下切实可行的应急防范措施：

①制定严密的操作规程。所有操作人员熟悉规程并遵照执行。部门定期检查操作人员对规程的掌握与执行情况，对不合格者进行培训考试。对操作规程的不完善部分，及时进行修订；

②定期巡线。定期巡线可及时发现管道运行过程中出现的问题，预防沿线可能发生的土方施工对管道的侵害，对靠近管道的土方施工单位进行安全警示，以防破坏管道。对恶意破坏管道者及时制止并报告警方。

③建立和完善了各项环境风险应急预案。

为了及时处理生产中各类突发事故，建设单位已经针对可能发生的风险事故，结合所处区域的自然条件、环境状况、地理位置等特点，制定了较完善的事故风险应急预案，根据企业提供资料及现场调查，大庆模范屯油田有限责任公司隶属于大庆油田有限责任公司第八采油厂，目前大庆油田有限责任公司第八采油厂已建立较完善的应急预案体系，预案为《大庆油田有限责任公司第八采油厂环境突发事件专项应急预案》在大庆市油田有限责任公司应急管理办公室进行了备案，并在 2023 年 6 月在肇州县生态环境局进行备案。大庆模范屯油田有限责任公司依托《大庆油田有限责任公司第八采油厂环境突发事件专项应急预案》，并定期组织进行应急演练。



巡检人员定期巡检照片



应急演练培训照片



应急演练培训照片



应急演练现场照片

应急演练照片

本项目的环境保护工作严格执行国家、省市的环保法律法规，同时大庆模范屯油田有限责任公司还制定了相应的环境管理规章制度，环保法规及油田内部的各种环境管理规章制度已经下发到相应人员，并组织有关人员或全体员工学习和贯彻执行，以确保环境管理工作的顺利进行。从现场调查的情况来看，本项目的环境保护工作取得了一定的效果，没有因管理失误对环境造成不良影响。

14.4 环保设施运行情况调查

本项目按要求进行了各项污染防治设施建设，环保设施及措施投用率为 100%。验收监测期间本项目各项环保设施运转正常，环保设施运行、检查记录齐全、完整。

建设单位在日常运营过程中仍需做好跟踪监测井的监管，并与跟踪监测井所属村民或管理者做好沟通，以防因井口外漏、管壁破裂或者其他原因造成地面清洁废水或废油倒灌或渗入井内而造成地下水污染。

14.5 固体废物处置及综合利用调查

本项目管道施工废料为一般固体废物，拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。拆除机泵拉运到大庆模范屯油田有限责任公司资产回收库。生活垃圾统一收集至各井场生活垃圾存放点，拉运至肇州县生活垃圾填埋场填埋处理。落地油及含油污泥统一收集后拉运委托大庆市庆兴环保科技有限公司进行处理，处理后泥渣含油量满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》（DB23/3104-2022）标准限值（石油类 $\leq 3000\text{mg/kg}$ ）。含油废弃防渗布统一收集后，暂存在第八采油厂三矿危废暂存间后，委托有资质单位进行处置。

14.6 验收监测质量控制

14.6.1 监测分析方法及监测仪器

本项目分析方法及监测仪器详细情况详见分析附件 2 监测报告。

14.6.2 人员资质

本次验收监测委托了第三方有资质单位进行检测，为黑龙江省吉瑞达检测科技有限公司进行了环境监测工作。

14.6.3 质量保证措施

方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，样品分析中采用平行双样进行质控。监测中所使用的各类仪器，经计量检定机构检定或校准，检定合格且在有效期内。所有监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

为了确保监测数据的代表性和准确性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析和样品处理）进行了质量控制。

实施内部质量控制采用以下方法：

- (1) 使用有证标准物质和质控样进行监控和核查。
- (2) 空白试验、平行样测定测定。
- (3) 对检测过程的各种技术要求进行复核。

具体如下：

(1) 验收监测方法按照验收监测评价的标准要求，采用标准中列出的标准测定方法，尚未列出测定方法的污染物，其测定方法选择国家、地方及行业现行标准测定方法。

(2) 验收监测人员均经考核并持证上岗，监测用仪器都经过计量检定并在有效期内。

(3) 标准物质监控

实验室直接用合适的有证标准物质或内部标准样品作为监控样品，定期或不定期将监控样品以比对样或密码样的形式，与样品检测以相同的流程和方法同时进行，检测室完成后上报检测结果给相关质量控制人员，也可由检测人员自行安排在样品检测时同时插入标准物质，验证检测结果的准确性。

(4) 空白测试

空白测试又称空白试验，是在不加待测样品(特殊情况下可采用不含待测组分，但有与样品基本一致基体的空白样品代替)的情况下，用与测定待测样品相同的方法、步骤进行定量分析，获得分析结果的过程。空白试验测得的结果称为空白试验值，简称空白值。空白值一般反映测试系统的本底，包括测试仪器的噪声、试剂中的杂质、环境及操作过程中的沾污等因素对样品产生的综合影响，它直接关系到最终检测结果的准确性，可从样品的分析结果中扣除。通过这种扣除可以有效降低由于试剂不纯或试剂干扰等所造成的系统误差。

(5) 重复测试

重复测试即重复性试验，也称为平行样测试，指的是在重复性条件下进行的两次或多次测试。重复性条件指的是在同一实验室，由同一检测人员使用相同的设备，按相同的测试方法，在短时间内对同一被测对象相互独立进行检测的测试条件。

(6) 废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程中严格按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行；废气监测实行全过程的质量保证，有组织排放源技术要求执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气检测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证和质量控制技术规范（试行）》

（HJ/T373-2007）；无组织排放源监测技术要求按照《无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《空气与废气监测质量保证手册》进行。

声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪、无雷电，风速小于5.0m/s。噪声监测质量保证和质量控制严格按照《环境监测技术规范》（噪声部分）和标准方法的有关规定执行。声环境标准满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样。

（7）采样的质控：

①采样时，首先用样品荡洗采样器，再用采集的样品反复荡洗样品容器3~5次。

②对含石油类废水一般应采集水面下10~15cm处的乳化油水样。

③含油和悬浮固体含量的废水样品，应粉笔单独定容采样，全部用于测定。

④废水的采集，应特别注意样品的代表性，防止受沾污以及运输过程中保证待测组分不发生变化。

⑤必要时，分析人员应在现场进行前处理。采样前，必须了解与排放废水有关的工艺流程和治理措施，以便于判定存在的干扰和作必要的预处理。

⑥水样采集后，在现场根据所测项目的要求添加保存剂。盖好盖塞，填写标签贴在容器壁上。记好采样记录，填好送样单。将样品妥善装箱准备运交实验室。

验收监测的采样记录及测定结果按测定方法标准和监测技术规范要求进行数据处理和填报，测定结果和验收监测报告按有关规定和要求严格执行三级审核制度，经校核、审核，最后由技术负责人审定。

14.7 环境监测计划落实情况

本次验收对开发区域环境质量及污染源排放情况进行了监测，根据本次验收调查对项目各场站、井场、敏感点的监测结果可知，本项目运行未对环境造成明显影响。在本项目通过验收正式投产后，根据运行期油田污染的特点，企业应将本项目环境监测工作委托于有资质的环境监测单位，按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ 1248-2022）的要求进行环境监测，具体见表12.7-1。

表 12.7-1 环境监测计划表

序号	监测内容	监测项目	监测点位	检测时间及频率	与环评时期落实情况
1	噪声	连续等效 A 声级	10#井场永久占地厂界外 1m	1 次/季	已落实
2	废气	非甲烷总烃	10#平台井场外上风向 1 个、下风向 3 个	1 次/季	已落实
		SO ₂ 、NO ₂ 、颗粒物	肇 2 转加热炉	1 次/年	已落实
3	地下水	pH、氨氮、石油类、挥发性酚类、石油烃、汞、砷、六价铬	张辉屯水井（125.148719；45.864802），温家屯水井（125.135818；45.850905）、三分场水井（125.101552；45.813277）	1 次/半年	已落实
4	土壤	pH、石油类、石油烃、汞、砷、六价铬	10#平台永久占地内深层土壤、10#平台井场西侧 500m 耕地（表层土壤）、8#平台永久占地内深层土壤、8#平台井场南侧 500m 草地（表层土壤）	1 次/年	已落实
5	事故监测	空气：非甲烷总烃；土壤：石油烃；地下水：石油类	事故发生处	事故发生后 24 小时内	已落实

14.8 排污许可证制度执行情况

本项目隶属于大庆模范屯油田有限责任公司负责，根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）及生态环境部部令第11号《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年版）》的有关规定，大庆模范屯有限责任公司申请了排污许可证证书（2021年5月13日）编号：912306217336497473001W，核发行业类别为：陆地石油开采、锅炉、工业炉窑、水处理通用工序。2024年11月28日重新申请了排污许可证，有效期限2024年11月28日至2029年11月27日，具体见附件5。

建设项目及其依托场站不新建加热炉，污染物排放口位置、排放方式、排放去向、种类、排放量及排放浓度均未发生变化，根据《排污许可管理条例》（2021年3月1日施行）第十五条要求，建设项目沿用大庆模范屯有限责任公司《排污许可证》进行管理。

按照排污许可监测要求，对区域地下水、土壤环境进行监测，具体见下图。



根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关要求，明确建设单位是竣工环境保护验收的责任主体，排污许可是竣工环保验收的前置条件，纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。由于建设单位已取得合法排污行政许可，因此具备竣工环境保护验收条件要求。

14.9 环保投资情况调查

本项目实际环保总投资为 1950 万元，与环评阶段一致，实际总投资为 106.883 万元，环保投资占总投资的 5.48%，具体环评阶段与实际运行投资情况见表 14.9-1。

表 14.9-1 本项目环保投资情况一览表 单位：万元

环保项目		实际投资	环评预计	变化量
废气治理	施工场地洒水抑尘，表土及建材堆放设置挡风板、上覆遮盖材料，施工运输车辆采取密闭措施或加盖防尘布。	13	13	与环评一致
废水处理	拆除设备清洗废水由罐车拉运至肇一联含油污水处理站进行处理。	2	2	与环评一致
	管道试压废水由罐车拉运至肇一联含油污水处理站进行处理。	1	1	与环评一致
	作业污水由罐车拉运至肇一联含油污水处理站进行处理。	1	1	与环评一致
地下水防治	（1）新建的集油管道、注水管道、总掺水管道划分为重点防渗区，更换 2 台外输泵、肇 2 转油站内新建加热炉下方土地、运营期油水井作业、水井洗井永久占地内划分为一般防渗区，油水井井场永久占地内为简单防渗区。 （2）地下集油掺水、注水、总掺水管道选用无缝钢管，	40	40	与环评一致

措施	设计壁厚的腐蚀余量大于 2mm 或采用管道内防腐，管道的外防腐等级采用特加强级，管道的连接方式采用焊接，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的要求：等效黏土防渗层 $Mb \geq 6m$ 、 $K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$ 。 （3）油水井井场采取地面平整夯实，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般地面硬化的要求。 （4）油水井作业、水井洗井时，井场永久占地内铺设 1.5mm 厚防渗土工布（渗透系数为 $1.0 \times 10^{-13} cm/s$ ），满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表 7 中一般防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层 $Mb \geq 1.5m$ 、 $K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$ 。			
	根据油田地面运行期多年统计，作业时采用临时围堰。	6.5	6.5	
	依托 3 口村屯地下水井，定期对地下水进行跟踪监测： 在项目区域上游依托张辉屯水井（125.148719；45.864802）布设 1 个潜水背景值监测水井，在区域内依托温家屯水井（125.135818；45.850905）、区域下游依托三分场水井（125.101552；45.813277）布设 1 口潜水跟踪监测水井，定期对地下水进行跟踪监测。	0	0	与环评一致
噪声治理	选用低噪声设备，定期维护保养，15 台抽油机设置减震基础，更换 2 台外输泵、新建 1 台外输炉选用噪声相对较小设备。	3.6	3.6	与环评一致
固废治理	管道施工产生的焊渣属于一般固废，收集后拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。	1	1	与环评一致
	建筑垃圾送市政指定地点填埋	0.5	0.5	与环评一致
	拆除机泵、油井树等设备拉运到大庆模范屯油田有限责任公司资产回收库	0.5	0.5	与环评一致
	含油废防渗布属于危险废物，分类集中收集后委托有危废处置资质的单位进行处置。	0.945	0.945	与环评一致
	含油污泥落地油、油泥（砂）及清罐污泥委托处理，处理后污泥含油量满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》（DB23/T3104-2022）标准限值（石油类 $\leq 3000 mg/kg$ ）。	3	3	与环评一致
生态	施工期作业带清理、管沟开挖、井场、道路的建设对土壤造成扰动和植被的破坏，工程施工均在临时占地内进行施工，并且施工结束后及时清理施工现场，对临时占用的 7.957hm ² 土地进行植被恢复。	7.957	7.957	与环评一致
	对永久占地 0.465hm ² （耕地 0.387hm ² ，荒草地 0.078hm ² ）。	21.881	21.881	与环评一致
	本项目设置 4 个土壤跟踪监测点位，每年监测 1 次，监测数据应公开。	4	4	与环评一致
合计		106.883	106.883	与环评一致

14.10 小结

本项目环保审批手续及有关的档案资料齐全，本工程在施工及运营阶段的环境管理措施基本得到落实，大庆模范屯油田有限责任公司的环境保护管理机构及规章制度健全，

按照《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T 6276-2014）的要求，建立并有效地运行了 HSE 管理体系，并严格按照 HSE 管理体系进行环境管理；本项目的污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用，运行期间提出了竣工环保验收申请；本项目环保设施投用率为 100%，验收监测期间环保设施正常稳定运转，环保设施运行、检查记录齐全、完整；本项目产生的污染物稳定达标排放，总量控制污染物的排放量均在核定的总量控制范围内；本项目环保投资占总投资的 7.33%，环保投资均已合理利用。

15 公众意见调查

为保护当地公众的利益，了解相关方对本项目在施工期、建成运营后的意见和建议，找出公众关注的问题，并有针对性的提出环保措施，进一步改进和完善本项目的环境保护工作，采用发放调查表的方式进行了公众参与调查。

15.1 公众参与主要内容

公众参与的内容主要有以下几方面：

（1）建设项目开发期、施工期、运行期是否发生过环境污染或扰民事件，事件的后果及处理情况；

（2）公众对建设项目开发期、施工期、运行期存在主要环境问题和可能存在的环境影响方式的看法与认识，主要是可能对居民生活质量产生影响的水、气、声、固体废物等方面；

（3）公众对建设项目开发期、施工期、运行期采取的环境保护措施效果的满意程度及其它意见；

（4）对涉及到环境敏感目标或公众环境利益的建设项目，应针对环境保护目标或公众环境影响利益设计调查问题，了解其是否受到影响；

（5）公众最关注的环境问题及希望采取的环境保护措施；

（6）公众对建设项目环境保护工作的整体评价。

15.2 调查方法、范围及对象

本次公众参与调查，首先去环保部门进行查询，通过查询确定自项目运行以来未发生过环保纠纷和环境事故。其次进行村屯走访。

公众参与的对象选择项目涉及区域的公众，公众参与对象选择了上述村屯中具有充分代表性的各阶层群众共计发放公众参与调查 30 份，回收 30 份。

公众意见调查采用以下方法：问卷调查，即被调查对象按设定的表格采取划“√”方式作回答；此外还有咨询访问调查方式，即被调查者口头回答问题，从而了解公众对项目所采取环保措施的意见和建议。本次调查回收有效问卷 30 份。调查表内容详见表 15.2-1。

表 15.2-1 公众参与调查表 年月日

被调查者 基本情况	姓名		性别		年龄		文化程度	
	职业		联系电话					
	居住地							
调查 内容	1	1.您对本项目所在地区的环境质量现状是否满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意						
	2	您认为本区域主要的环境问题是： <input type="checkbox"/> 地表水 <input type="checkbox"/> 地下水 <input type="checkbox"/> 环境空气 <input type="checkbox"/> 固体废物 <input type="checkbox"/> 噪声 <input type="checkbox"/> 生态						
	3	您对本项目施工和运行过程中采取的环境保护措施效果是否满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 如“不满意”，请说明您希望采取的环境保护措施：						
	4	您认为本项目对当地农业生产的影响 <input type="checkbox"/> 影响较大 <input type="checkbox"/> 影响较小 <input type="checkbox"/> 无影响						
	5	本项目施工期对您影响最大的是什么？ <input type="checkbox"/> 夜间噪声 <input type="checkbox"/> 施工扬尘 <input type="checkbox"/> 农业生产 <input type="checkbox"/> 无影响						
	6	本项目运行期对您影响最大的是什么？ <input type="checkbox"/> 废气 <input type="checkbox"/> 废水 <input type="checkbox"/> 固体废物 <input type="checkbox"/> 噪声 <input type="checkbox"/> 无影响						
	7	您对工程环境保护工作的总体评价： <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意 如“不满意”，请简要陈述理由：						
	8	您对建设单位或环境管理部门有何要求、建议？						
项目建设单位：大庆模范屯油田有限责任公司 报告编制单位：黑龙江省合壹环保科技有限公司 联系人： 联系电话：								

注：调查对象在相应的栏内填写√，部分内容应根据实际情况进行阐述。

15.3 公众意见调查结果

通过对调查内容逐项分类统计，计算各类意向或意见的数量及比列，统计详细内容及结果见表 15.3-1。

表 15.3-1 公众意见调查统计结果

序号	调查内容	选项	人数	比例 (%)
1	您对本工程所在地区的环境质量现状是否满意？	满意	27	90
		基本满意	3	10
		不满意	0	0.0
2	您认为本区域主要的环境问题是？	地表水	0	0.0
		地下水	10	33.3
		环境空气	7	23.3
		固体废物	2	6.7
		噪声	7	23.3
		生态	4	13.3
3	您对本工程施工和运行过程中采取的环境保护措施效果是否满意？	满意	12	40.0
		基本满意	18	60.0
		不满意	0	0.0

4	您认为本工程对当地农业生产的影响？	影响较大	23	76.6
		影响较小	5	16.7
		无影响	2	6.7
5	本工程施工期对您影响最大的是什么？	夜间噪声	7	23.3
		施工扬尘	18	60.0
		固体废物	3	10
		无影响	2	6.7
6	本工程运行期对您影响最大的是什么？	废气	5	16.7
		废水	2	6.7
		固体废物	8	26.7
		噪声	8	26.7
		无影响	7	23.3
7	您对本工程环境保护工作的总体评价	满意	10	33.3
		基本满意	20	66.7
		不满意	0	0.0
8	您对建设单位或环境管理部门有何要求、建议？	无		

(1) 您对本工程所在地区的环境质量现状是否满意

据统计，区域内被调查人中有 90%对区域环境质量满意，10%基本满意。

(2) 您认为本区域的主要的环境问题

根据调查，有 33.3%的被调查者认为区域地下水存在环境问题；23.3%被调查者认为区域环境空气存在环境问题；6.7%被调查者认为区域固体废物存在环境问题；23.3%被调查者认为区域声空气存在环境问题；13.3%的被调查者认为区域环境存在生态问题。

通过本次验收对环境质量进行的监测结果可知，区域内声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准，评价区域第四系孔隙潜水水质均满足《地下水质量标准》（GB/T148488-2017）中的Ⅲ类标准要求。地下水承压水水环境质量均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值（ $\leq 0.05\text{mg/L}$ ）；区域空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，油田特征污染物非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》；

本项目施工期包装袋、防渗布、管道施工废料拉运至第八采油厂工业固废填埋场进行处理；生活垃圾由施工单位集中拉运至肇州县生活垃圾填埋场处理，施工结束后场地无遗留；落地油、含油污泥拉运委托大庆市庆兴环保科技有限公司进行处理。各环境质量现状与环评时期对比变化不大，可见工程的建设未恶化区域环境现状。

(3) 您对本工程施工和运行过程中采取的环境保护措施效果是否满意

据统计，区域内被调查者中有 40%的人认为对本工程施工和运行过程中采取的环境

保护措施效果感到满意，60%为基本满意。

（4）您认为本工程对当地农业生产的影响？

区域内76.6%的被调查者认为本工程对当地农业生产产生的影响较大，16.7%的被调查者认为影响较小，有6.7%的被调查者认为无影响。

总占地面积为1.999hm²，其中永久占地0.295hm²（耕地（基本农田）），临时占地1.704hm²（耕地（基本农田））。本工程建设过程中，对占用的耕地，按照“占多少，垦多少”的原则，按照省的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。

（5）本工程施工期对您影响最大的是什么？

据统计，区域内被调查者中16.7%认为本工程施工期施工扬尘对其影响最大；有6.7%认为本工程施工期废水对其影响最大；有26.7%认为本工程施工期夜间噪声对其影响最大；有26.7%认为本工程施工期固体废物对其影响最大；其余23.3%的人认为无影响。

本项目未在夜间施工，且施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定的标准限值要求，对周围声环境影响较小。施工期场地采用洒水抑尘，未在大风天施工。本项目施工期产生的包装袋、防渗布、管道施工废料拉运至第八采油厂工业固废填埋场进行处理；生活垃圾由施工单位集中拉运至肇州县生活垃圾填埋场处理，施工结束后场地无遗留，施工期固废均进行处置。

（6）本工程运行期对您影响最大的是什么？

据统计，区域内被调查者中有16.7%认为废气影响最大，6.7%认为废水影响最大，26.7%认为固体废物影响最大，26.7%认为噪声影响最大，其余23.3%的人认为无影响。

井口安装密封垫，原油集输采用密闭流程，最大限度降低烃类气体的挥发，能够确保井场、依托站场厂界外VOCs（以非甲烷总烃计）满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中5.9企业边界污染物控制要求限值；依托站场内产生的挥发性有机物（非甲烷总烃）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值。站场加热装置采用清洁能源，燃烧烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，对周围敏感点影响较小。本项目产液分离产生的含油污水经肇一联、宋二联合油污水处理站处理达标后回注油层，不外排。油井作业污水通过回收装置回收后通过罐车回收后送肇一联合油污水处理站处理后回注，不外排。正常状况下，废水对周边环境影响较小。

本项目井场电机和场站机泵均选用了低噪声设备，场站机泵均集中布置在泵房内，并且泵房加装了隔声门窗，根据本次验收监测结果，本项目油井厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求，对声环境影响较小。落地油、含油污泥拉运委托大庆市庆兴环保科技有限公司进行处理；含油防渗布定期委托黑龙江兰溪谷环保科技发展公司处置，固废均进行了合理处置。

（7）您对本工程环境保护工作的总体评价

33.3%的人认为对本工程的环境保护工作感到满意，66.7%为基本满意。

15.4 公众意见调查结论

从以上调查可以看出当地居民对该项目在建设和运行过程中采取的环境保护措施是认可和满意的，本项目具备开展环保验收的条件。

16 调查结论

通过对 2023 年州 20 区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目的环境影响调查，对有关技术文件、工程资料的分析，对本项目各项环保规章、制度及措施执行情况的调查，对环境保护设施的调查和监测以及生态环境的分析与评价，我们从环境保护角度对本项目做出结论和提出建议。

16.1 项目实际建设内容

本项目实际基建了 15 口油井、3 口转注井，建成后产能 $0.73 \times 10^4 \text{t/a}$ 。新建了单井集油掺水管道 5.27km，站间掺水管道 4.3km，单井注水管道 0.852km，新建了通井路等道路 1.15km，新建了井场柱上变 11 座，新建了 10kV 线路 1.26km，更换了 2 台宋 II-3 转油站外输泵，在肇 2 转油站内新建了 1 台 0.2MW 外输炉。与环评时期相比，建设内容无变化。项目总投资 1950 万元，环保投资 106.883 万元。

16.2 环境保护措施落实情况调查结论

16.2.1 废水

根据现场调查可知，项目在环评和批复中提出的各项水污染控制措施在工程开发建设中都得到了落实。本项目产生的生产污水处理达标后全部回注油田，项目没有设置工业污水排放口，生产污水不外排。本项目的水污染防治措施符合环评文件及其批复的要求。对地下水环境影响不大。根据现有环境监测数据表明，企业采取的污染治理措施能够使废水达标后回注，环境污染可控。

16.2.2 废气

通过现场调查及监测结果表明，油田生产采用全密闭工艺流程，烃类气体的损失量可以控制在 0.015% 以内，场站、井场无组织排放的非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中限值要求；依托场站内排放的非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 排放限值要求。宋 II-3 转油站、宋 II-4 转油站、肇 2 转油站、肇一联合站、宋二联合站等本项目涉及的场站加热炉和采暖炉均使用处理后的干气（天然气）作燃料，排放的废气污染物符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉标准限值的要求。本项目的大气污染防治措施符合环评文件及其批复的要求。

16.2.3 噪声

本项目在开发建设过程中，尽可能地选用了低噪声设备，并对噪声较大的设备统一布置在室内，并加装了隔声门窗，有效减少了噪声的排放。通过对本项目井场的现场勘查与噪声监测可知，本项目井场昼间噪声、夜间噪声经距离衰减后均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，落实了环评及批复中的噪声污染防治措施，对区域声环境影响不大。

16.2.4 固体废物

本项目施工期管道施工废料为一般固体废物，拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。拆除机泵拉运到大庆模范屯油田有限责任公司资产回收库。生活垃圾统一收集至各井场生活垃圾存放点，拉运至肇州县生活垃圾填埋场填埋处理。落地油及含油污泥统一收集后拉运委托大庆市庆兴环保科技有限公司进行处理，处理后泥渣含油量满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》（DB23/3104-2022）标准限值（石油类 $\leq 3000\text{mg/kg}$ ）。含油废弃防渗布统一收集后，暂存在第八采油厂三矿危废暂存间后，委托有资质单位进行处置。本项目固体废物全部得到合理处置，符合环评文件及其批复的要求。

16.3 环境影响调查结论

16.3.1 生态影响调查结论

本项目在施工和生产过程中，按照项目“工程设计”及“环境影响报告书”的要求，采取了一系列生态保护和恢复措施，没有改变项目区的生态系统结构与功能，项目区的生态组分及生物多样性未受影响，生态格局变化不大；本项目除了占地直接减少了粮食产量外，对生态的影响较小。通过现场勘查，临时占地生态已经得到较好恢复。

16.3.2 水环境影响调查结论

通过对项目区域地下水质量监测结果与环评阶段对比表明，地下水质量并无明显变化，本项目油田开发对地下水环境质量影响不大。

16.3.3 大气影响调查结论

环境质量现状监测结果表明，项目区非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。与环评监测结果比较，本项目建设前（评价阶段）后（验收阶段）项目区域的环境空气质量相比相差不大，说明本项目开发建设对项目区域的环境空气质量影响不大。

16.3.4 声环境影响调查结论

声环境质量现状监测结果表明，项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准，村屯声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准，与环评监测结果比较，本项目实施前（评价阶段）后（验收阶段）项目区的声环境质量没有明显的变化，说明本项目开发建设没有对项目区域的声环境质量产生明显的不利影响。

16.4 环境风险防范与应急措施调查结论

本项目运行期涉及多种环境风险，针对各种事故风险，建设单位在设计中充分考虑了选址、总图布置、工艺、自动控制等方面的安全问题，提出了许多安全措施，这些措施在建设和运行过程中已经得到了落实。建设单位具备健全的 HSE 管理制度，并针对存在的风险因素编制了《大庆模范屯油田有限责任公司突发事件专项应急预案》，辨识了危险源，明确了各要害部位、重点岗位的管理责任。重要工作岗位的工作人员都持证上岗，并定期进行安全检查、培训和应急预案演练，发现问题及时整改，以消灭事故隐患。

本项目运行以来未发生过环境风险事故，说明本项目采取的环境风险防范措施有效。

16.5 环境管理调查结论

本项目所在的大庆模范屯油田有限责任公司成立了环境保护工作领导小组，任命了环境管理者代表，建立和完善了环境管理方面的各种规章制度、岗位责任、考核办法、奖惩制度等，对油田的管理与监督、污染治理和废物综合利用、污染和事故的预防等方面作了具体的规定。由于油田在生产过程中注重环境管理，没有因管理失误造成不良的环境影响。

16.6 总结论

综上所述，2023 年州 20 区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目环保审批手续及有关的档案资料齐全；建设单位环境保护管理机构及规章制度健全，建立并有效地运行了 HSE 管理体系，并严格按照 HSE 管理体系进行环境管理；本项目的污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用，验收监测期间环保设施正常稳定运转，环保设施运行完整且生态恢复情况较好。本项目产生的污染物稳定达标排放，在工程开发建设和运行期间，环评及批复中要求的污染控

制措施和生态保护措施都基本得到了落实，没有发生环境影响投诉事件。本项目符合竣工环境保护验收调查的条件及要求，建议通过验收。

大庆市生态环境局文件

庆环审〔2023〕44号

关于 2023 年州 20 区块葡萄花油层产能 建设工程（合作）项目环境影响报告书的批复

大庆模范屯油田有限责任公司：

你单位报送的《关于申请审批2023年州20区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目基本情况

该项目建设性质属于改扩建，项目代码为2212-230621-04-P2-140601，建设地点位于大庆市肇州县新福乡境内，项目总占地面积为8.422hm²，其中永久占地面积为0.465hm²，临时占地面积为7.957hm²。该项目基建15口油井、3口转注井，建成后产能0.73×10⁴t/a。新建单井集油掺水管道

- 1 -

5.27km，站间掺水管道4.3km，单井注水管道0.852km，新建通井路等道路1.15km，新建井场柱上变11座，新建10kV线路1.26km，宋II-3转油站更换2台外输泵，肇2转油站新建1台0.2MW外输炉。项目总投资1950万元，其中环保投资106.883万元。

在全面落实《2023年州20区块葡萄花油层产能建设工程（合作）项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意该《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境保护措施

（一）生态保护措施。施工期，加强管理，规范施工人员行为，严禁随意践踏、碾压施工区范围之外的植被。埋设管线时，尽量窄控，采取平埋方式进行，以便尽快恢复植被。施工过程中不打乱土层，按要求实施表土剥离和利用。对于临时占地，施工结束后，及时恢复被破坏的地表形态和植被。对永久占用耕地，按照“占一补一”原则进行占补平衡。**运营期**，严格控制油井作业占地，普通井下作业不新征临时占地，作业时在井场周围堆筑临时围堰，防止作业时产生的油水进入周围环境。划定施工活动范围，所有车辆采用“一”字型作业法。作业时严格执行环保措施，控制污染物的外排量，保证“工完料净场地清”，污泥回收后做无害化处理。

（二）水环境保护措施。施工期，拆除设备清洗过程中在现

场钢槽中进行,清洗废水收集后经罐车拉运至肇一联合油污水处理站处理,转注井洗井废水经现场设置的污水回收装置回收后经罐车拉运至肇一联合油污水站处理,管线试压废水由罐车拉运至肇一联合油污水站处理,废水处理后均满足《大庆油田地面工程建设设计规定》(Q/SYDQ0639-2015)限值要求后,回注油层。生活污水排入依托场站及阀组间临时防渗旱厕,定期清掏用作农家肥。运营期,油井采出液分离出的含油污水管输至肇一联、宋二联合油污水处理站处理,作业污水密闭罐车拉运至肇一联合油污水处理站处理。以上废水处理后均满足《大庆油田地面工程建设设计规定》(Q/SYDQ0639-2015)限值要求后回注油层。拉运污水集中接收场站要建设监控装置,并接入市生态环境局监控平台,污水拉运过程要建立台账,并接受视频监管。

(三) 地下水和土壤污染防治措施。地下水实施分区防控:集输管道采取重点防渗措施,采用无缝钢管,设计壁厚的腐蚀余量约为 2mm 并进行内防腐,外防腐等级采用特加强级,连接方式采用焊接。运营期油井作业井场永久占地内采取重点防渗措施,应使用有效防渗材料,确保防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中重点防渗区防渗要求。肇 2 转油站新建外输炉区域采取一般防渗措施,应使用有效防渗材料,确保防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中一般防渗区防渗要求。油水井场采取简单防渗措施,应使用有效防渗材料,确保防渗性能满足《环境影响评价



技术导则《地下水环境》(HJ610-2016)中简单防渗区防渗要求。作业时必须保证含油污泥不落地,具备条件的井场应铺设防渗布并设置钢制污油回收槽,暂不具备条件的井场应铺设防渗布。保留防渗工程施工期影像资料备查。加强防渗设施的日常维护,对出现破损的防渗设施应及时修复和加固,确保防渗设施牢固安全,防止污染地下水和土壤。

建立完善的地下水和土壤监测制度,设置3口潜水跟踪监测井:即在地下水流向上游依托张辉屯苏家水井设置1口背景监测井,地下水流向下游依托温家屯苏家水井,三分场白家水井设置2口跟踪监测井,定期进行监测,发现问题及时处理。严格落实地下水和土壤监测计划。一旦出现土壤和地下水污染,立即采取应急措施,减少对水体和土壤的不利环境影响。

(四)大气环境保护措施。施工期,土方开挖应采取遮盖、围挡、洒水等防尘措施,大风天气停止土方工程施工作业。合理规划道路运输路线,运料车辆采取苫布遮盖措施,以防物料洒落在地,形成二次扬尘。施工场界颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值标准要求。运营期,原油集输采用密闭流程,加强对设备和管道的检查和维护,加强井下作业管理,提高落地油回收率,减少烃类气体挥发。井场,依托场站厂界非甲烷总烃应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中标准限值要求,厂界内产生的挥发性有机物(非甲烷总烃)应满足

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值要求。

依托工程以及本项目新建的加热炉均以天然气为燃料，SO₂、NO_x、颗粒物、烟气黑度均应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）限值要求。

（五）声环境保护措施。施工期，施工现场合理布局，减少高噪声设备同时施工时间。注意对设备的维护和保养。运输车辆选择选择合理路线，合理安排施工进度，减少施工时间，禁止在夜间高噪声施工。施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期，选用低噪声设备，采用相应的减振、隔声等降噪措施，注意对设备的维护保养。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（六）固体废物污染防治措施。施工期，管道施工过程中产生的废焊条和废防腐材料废料拉运至第八采油厂工业固废填埋场。建筑垃圾送大庆市建筑垃圾消纳场处理。废旧设备送大庆模範屯油田有限责任公司财务资产库回收，生活垃圾收集后及时拉运至肇州县生活垃圾填埋场填埋处理。运营期，落地油及含油污泥属于危险废物（HW08），送至宋芳屯含油污泥处理站进行减量化处置，处置后污泥委托大庆市云泰石化产品有限公司进行无害化处理，处理后的泥渣满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》（DB23/3104-2022）要求后，用于在油田作业区域内用于

通井路和井场建设，筑路和铺路、作业场地地面覆盖、围堰等材料的活动；或者在油田作业区域外用于物流仓储用地、工业厂区道路与交通设施用地以及危险废物填埋场、固体废物填埋场封场等材料的活动。作业产生的含油废防渗布属于危险废物（HW08），暂存在第八采油厂三矿危废暂存间，定期委托资质单位处理。

（七）环境风险防控措施。加强管理，保证施工质量，加强监理，确保焊接和涂层等施工质量。建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平。提高管道防腐等级，进行水压试验，增加管道安全性。建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平。制定操作规程、操作手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免重大污染事故的发生。加强员工安全教育，提高安全意识。设置应急预警和紧急切断措施，加强自动控制系统的管理和控制。定期检测管道的内外腐蚀及防腐层破损情况，及时更换或维修。在开工建设前应制定突发环境事件应急预案并到项目所在地生态环境主管部门备案，加强风险防控预警体系建设，定期开展应急演练，提高突发事件的应急处理能力。

三、应建立企业内部生态环境管理机构 and 制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、工艺、

地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的
环境影响评价文件。自本批复文件发布之日起超过五年，方决
定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审
核。

五、由大庆市生态环境保护综合执法局组织开展该项目“三
同时”监督检查和管理工作。



抄送：大庆市生态环境保护综合执法局。

大庆市生态环境局办公室

2023年4月25日印发

-7-



报告编号: JRD-BG-202407102



检测 报 告

报告名称 : 2023 年芳 481-州 17 区块加密与注采系统
调整产能建设工程项目检测报告

委托单位 : 大庆模范屯油田有限责任公司

检测类别 : 委托检测

样品类型 : 有组织废气、无组织废气、环境空气、
土壤、包气带、地下水、地表水

黑龙江省吉瑞达检测科技有限公司



说 明

- 1、本报告未加盖本公司检测报告专用章、骑缝章、计量认证章及无本公司防伪标识视为无效。
- 2、本报告无审核人及授权签字人签字无效，涂改、增删、部分复印无效。
- 3、委托检测结果仅对当时工况及环境状况负责，委托单位自行送样仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。
- 4、本报告未经同意不得用于商业宣传。
- 5、对本报告如有异议，请于收到报告之日起十日内向本公司查询，来函来电请注明报告编号，逾期不予受理。

黑龙江省吉瑞达检测科技有限公司
地址：黑龙江省大庆市高新区安萨路 9-1
邮政编码：163000
联系电话：13836766965
联系人：宋喜晶

一、检测信息

委托方: 大庆模范屯油田有限责任公司	
受检单位: 大庆模范屯油田有限责任公司	
地址: 大庆市肇州县	
联系人: 牛磊	联系电话: 18745901333
采样时间: 2024年07月30日-08月02日	采样人员: 张磊、付宝林
样品分析时间: 2024年07月30日-08月15日	分析人员: 高德宇、徐畅、刘珊珊、 陈雨欣、于爽、张磊、 盛雪源、梁安琪、李金琦、于洪瑶、郭艳玲

二、检测内容

1、有组织废气

检测点位: 肇一联合站加热炉排气筒、肇4转油站加热炉排气筒、肇5转油站加热炉排气筒、肇6转油站加热炉排气筒、宋二联合站加热炉排气筒, 共计5个点位;

检测项目: 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度;

检测频次: 检测2天, 3次/天。

2、无组织废气

(1) 检测点位: 肇4转油站厂界上下风向1#-4#、肇5转油站厂界上下风向1#-4#, 共计8个点位;

检测项目: 非甲烷总烃;

检测频次: 检测2天, 3次/天。

(2) 检测点位: 肇4转油站加热炉处、肇5转油站锅炉处, 共计2个点位;

检测项目: 非甲烷总烃;

检测频次: 检测2天, 3次/天(1小时均值)。

3、环境空气

检测点位: 3#平台、肇州县, 共计2个点位;

检测项目: 非甲烷总烃;

检测频次: 检测2天, 4次/天。

4、土壤

(1) 检测点位: 4#平台井场永久占地内、6#平台井场永久占地内, 共计2个点位;

检测项目: pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、三氯甲烷、四氯

化碳、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒹、苯并(k)荧蒹、二苯并(ah)蒽、蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘、石油烃(C₁₀-C₄₀)；

检测频次: 检测 1 天, 1 次/天。

- (2) 检测点位: 4#平台井场永久占地外 10m、4#平台井场永久占地外 20m、4#平台井场永久占地外 30m、4#平台井场永久占地外 50m、6#平台井场永久占地外 10m、6#平台井场永久占地外 20m、6#平台井场永久占地外 30m、6#平台井场永久占地外 50m, 共计 8 个点位;

检测项目: pH 值、石油烃(C₁₀-C₄₀)；

检测频次: 检测 1 天, 1 次/天。

- (3) 检测点位: 4#平台南侧 500m 耕地、6#平台东北侧 500m 草地, 共计 2 个点位;

检测项目: pH 值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、石油烃(C₁₀-C₄₀)；

检测频次: 检测 1 天, 1 次/天。

5、包气带

检测点位: 肇 51-36 转注井井场内(0-20cm)、肇 51-36 转注井井场内(20-40cm)、肇 51-36 转注井井场东侧 100 耕地(0-20cm)、肇 51-36 转注井井场东侧 100 耕地(20-40cm)、肇一联加热装置西侧 5m(0-20cm)、肇一联加热装置西侧 5m(20-40cm)、肇一联厂界西侧 100m(0-20cm)、肇一联厂界西侧 100m(20-40cm), 共计 8 个点位;

检测项目: pH 值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、六价铬、石油类、挥发酚;

检测频次: 检测 1 天, 1 次/天。

6、地下水

检测点位: 杨树林水井(背景监测井)、3#平台下游 10m 处水井(跟踪监测井)、东万福屯水井(跟踪监测井), 共计 3 个点位;

检测项目: pH 值、钙和镁总量(总硬度)、溶解性总固体、氯化物(Cl⁻)、

亚硝酸盐 (NO₂⁻)、硝酸盐 (NO₃⁻)、硫酸盐 (SO₄²⁻)、铁、锰、挥发酚、高锰酸盐指数 (耗氧量)、氨氮、铅、汞、砷、镉、六价铬、氟化物、氰化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、钾、钠、钙、镁、碱度 (HCO₃⁻、CO₃²⁻)、硫化物、钡;

检测频次: 检测 2 天, 2 次/天。

7、 地表水

检测点位: 西大干渠;

检测项目: pH 值、化学需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、硫化物、石油类、水温;

检测频次: 检测 2 天, 1 次/天。

三、质量保证

为保证本次检测分析数据的准确性、科学性,本次检测采取了相关质控措施,合格率为 100%。分析中所使用的各类器皿及仪器,均经国家认可的计量检定部门检定,且检定合格。

四、检测项目、分析及分析仪器

检测项目、分析及分析仪器信息见表 1。

表 1 检测项目、分析及分析仪器信息

类别	检测项目	分析方法名称及方法标准号	分析仪器、型号及编号
有组织 废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电子天平 PT-104/55SY JRD-011
	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	林格曼烟气黑度图
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	大流量烟尘(气)测试仪 YQ-3000D JRD-127
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	大流量烟尘(气)测试仪 YQ-3000D JRD-127
无组织 废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 GC9600 JRD-019
环境空 气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 GC9600 JRD-019
土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	精密酸度计 pHS-2F JRD-006

砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	原子荧光光度计 RGF-6800 JRD-015
铅、镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
铜、镍、锌	土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法 NY/T 1613-2008	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	原子荧光光度计 RGF-6800 JRD-015
三氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
氯甲烷	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
顺式-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
反式-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,1,1,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025

1,1,2,2-四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,1,1-三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,1,2-三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
邻-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
间,对-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025

	硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	苯胺	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	2-氯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	苯并(a)蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	苯并(a)芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	苯并(b)荧蒹	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	苯并(k)荧蒹	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	二苯并(ah)蒹	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	蒾、蔡	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	蒽并(1,2,3-cd)芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪 8860 JRD-140
	铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镉、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
包气带	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	精密酸度计 pHS-2F JRD-006
	汞、砷	水质 汞、砷、硒、铋和锡的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 RGF-6800 JRD-015
	铅、镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128

	铜、锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 第一部分直接法	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-89	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL450 JRD-018
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光 光度法 (方法 1 萃取分光光度法) HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 pHB-4 JRD-056
	钙和镁总量 (总硬度)	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB 7477-87	滴定管 25mL
	溶解性总固 体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官 性状和物理指标 (11.1 溶解性总固体 称 量法) GB/T 5750.4-2023	电子天平 FA2004 JRD-145
	氯化物(Cl ⁻)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定离子色 谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-8618 JRD-016
	亚硝酸盐 (NO ₂ ⁻)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定离子色 谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-8618 JRD-016
	硝酸盐 (NO ₃ ⁻)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定离子色 谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-8618 JRD-016
	硫化物 (SO ₄ ²⁻)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定离子色 谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-8618 JRD-016
	铁、锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-89	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光 光度法 (方法 1 萃取分光光度法) HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
	高锰酸盐指 数(耗氧量)	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-89	滴定管 25mL
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 752 JRD-017	

	汞、砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 RGF-6800 JRD-015
	铅、镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 第二部分螯合萃取法	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-87	离子计 PXSJ-270F JRD-149
	氰化物	氰化物的测定 容量法和分光光度法(方法 2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法) HJ 484-2009	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
	总大肠 菌群	总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测 分析方法》(第四版)国家环境保护总 局(2002年)	电热恒温培养箱 DHP-360型 JRD-003
	细菌总数	水质 细菌总数的测定 平板计数法 HJ 1000-2018	电热恒温培养箱 DHP-360型 JRD-003
	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970-2018	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
	钾、钠	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-89	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	钙、镁	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-89	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	碱度(CO ₃ ²⁻ 、 HCO ₃ ⁻)	碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分 析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002 年)	滴定管 25mL
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
	钡	水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 603-2011	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
地表 水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 pHB-4 JRD-056
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管 25mL
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 752 JRD-017

高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-89	滴定管 25mL
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970-2018	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-91	温度计 MBS-188 JRD-097

五、检测结果

检测结果见表 2—表 9。

表 2 有组织废气检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2024.07.30	肇一转油站 加热炉排气筒	废气排放量(Nm ³ /h)	2123	2056	2103
		实测低浓度颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	9.0	9.5	9.2
		折算后低浓度颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	13.5	14.0	13.3
		实测 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	3L	3L	3L
		折算后 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	/	/	/
		实测 NO _x 排放浓度 (mg/m ³)	81	76	79
		折算后 NO _x 排放浓度 (mg/m ³)	121	112	114
		O ₂ 含量 (%)	9.3	9.1	8.9
		烟温 (°C)	122.3	123.5	120.6
		气压 (kPa)	100.4	100.1	100.6
	烟气黑度 (级)	<1	<1	<1	
	肇 4 转油站 加热炉排气筒	废气排放量(Nm ³ /h)	2132	1895	1965
		实测低浓度颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	9.2	9.4	9.7
		折算后低浓度颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	13.6	14.2	14.0
实测 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)		3L	3L	3L	

	折算后 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	/	/	/
	实测 NO _x 排放浓度 (mg/m ³)	65	67	70
	折算后 NO _x 排放浓度 (mg/m ³)	96	101	101
	O ₂ 含量 (%)	9.2	9.4	8.9
	烟温 (°C)	124.3	121.2	120.9
	气压 (kPa)	100.1	100.2	100.2
	烟气黑度 (级)	<1	<1	<1
肇5转油站 加热炉排气筒	废气排放量(Nm ³ /h)	1935	1876	1698
	实测低浓度颗粒物排放浓度(mg/m ³)	10.0	10.4	9.9
	折算后低浓度颗粒物排放浓度(mg/m ³)	14.5	14.8	14.6
	实测 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	3L	3L	3L
	折算后 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	/	/	/
	实测 NO _x 排放浓度 (mg/m ³)	75	76	71
	折算后 NO _x 排放浓度 (mg/m ³)	108	108	104
	O ₂ 含量 (%)	8.9	8.7	9.1
	烟温 (°C)	134.2	134.9	130.5
	气压 (kPa)	100.3	100.2	100.3
	烟气黑度 (级)	<1	<1	<1
肇6转油站 加热炉排气筒	废气排放量(Nm ³ /h)	2132	2045	2064
	实测低浓度颗粒物排放浓度(mg/m ³)	10.3	10.4	9.6
	折算后低浓度颗粒物排放浓度(mg/m ³)	14.4	14.2	13.5
	实测 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	3L	3L	3L
	折算后 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	/	/	/
	实测 NO _x 排放浓度 (mg/m ³)	69	75	72
	折算后 NO _x 排放浓度 (mg/m ³)	97	103	102

		O ₂ 含量 (%)	8.5	8.2	8.6
		烟温 (°C)	120.3	120.5	120.8
		气压 (kPa)	100.1	100.2	100.1
		烟气黑度 (级)	<1	<1	<1
	宋二联合站 加热炉排气筒	废气排放量(Nm ³ /h)	2014	2035	1989
		实测低浓度颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	9.1	8.5	9.3
		折算后低浓度颗粒 物排放浓度(mg/m ³)	12.9	12.5	12.8
		实测 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	3L	3L	3L
		折算后 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	/	/	/
		实测 NO _x 排放浓度 (mg/m ³)	76	74	81
		折算后 NO _x 排放浓 度(mg/m ³)	108	104	112
		O ₂ 含量 (%)	8.7	8.5	8.3
		烟温 (°C)	131.2	120.4	124.6
气压 (kPa)		100.3	100.4	100.4	
烟气黑度 (级)	<1	<1	<1		
2024.08.02	肇一转油站 加热炉排气筒	废气排放量(Nm ³ /h)	2035	1996	2058
		实测低浓度颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	9.0	8.9	9.2
		折算后低浓度颗粒 物排放浓度(mg/m ³)	13.2	12.8	13.8
		实测 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	3L	3L	3L
		折算后 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	/	/	/
		实测 NO _x 排放浓度 (mg/m ³)	79	80	82
		折算后 NO _x 排放浓 度(mg/m ³)	116	115	123
		O ₂ 含量 (%)	9.1	8.8	9.3
		烟温 (°C)	120.6	121.5	120.9
		气压 (kPa)	100.3	100.5	100.3

	烟气黑度 (级)	<1	<1	<1
肇4转油站 加热炉排气 筒	废气排放量(Nm ³ /h)	2035	1947	1869
	实测低浓度颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	10.3	11.3	10.9
	折算后低浓度颗粒 物排放浓度(mg/m ³)	15.7	16.9	16.0
	实测 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	3L	3L	3L
	折算后 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	/	/	/
	实测 NO _x 排放浓度 (mg/m ³)	68	70	72
	折算后 NO _x 排放浓 度(mg/m ³)	103	105	106
	O ₂ 含量 (%)	9.5	9.3	9.1
	烟温 (°C)	123.1	124.5	121.7
	气压 (kPa)	100.2	100.0	100.4
	烟气黑度 (级)	<1	<1	<1
	肇5转油站 加热炉排气 筒	废气排放量(Nm ³ /h)	2016	1997
实测低浓度颗粒物 排放浓度(mg/m ³)		9.1	9.3	8.8
折算后低浓度颗粒 物排放浓度(mg/m ³)		13.5	13.7	12.6
实测 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)		3L	3L	3L
折算后 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)		/	/	/
实测 NO _x 排放浓度 (mg/m ³)		71	69	74
折算后 NO _x 排放浓 度(mg/m ³)		105	101	106
O ₂ 含量 (%)		9.2	9.1	8.8
烟温 (°C)		132.1	129.7	131.2
气压 (kPa)		100.3	100.2	100.3
烟气黑度 (级)		<1	<1	<1
肇6转油站 加热炉排气 筒	废气排放量(Nm ³ /h)	1967	1958	2026
	实测低浓度颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	8.4	8.8	8.6

宋二联合站 加热炉排气筒	折算后低浓度颗粒物排放浓度(mg/m ³)	11.5	11.8	12.0
	实测 SO ₂ 排放浓度(mg/m ³)	3L	3L	3L
	折算后 SO ₂ 排放浓度(mg/m ³)	/	/	/
	实测 NO _x 排放浓度(mg/m ³)	70	72	75
	折算后 NO _x 排放浓度(mg/m ³)	96	96	105
	O ₂ 含量 (%)	8.2	7.9	8.5
	烟温 (°C)	121.3	123.2	124.1
	气压 (kPa)	100.3	100.3	100.3
	烟气黑度 (级)	<1	<1	<1
	废气排放量(Nm ³ /h)	2203	2102	2078
	实测低浓度颗粒物排放浓度(mg/m ³)	8.3	9.0	8.4
	折算后低浓度颗粒物排放浓度(mg/m ³)	11.6	12.9	11.9
	实测 SO ₂ 排放浓度(mg/m ³)	3L	3L	3L
	折算后 SO ₂ 排放浓度(mg/m ³)	/	/	/
	实测 NO _x 排放浓度(mg/m ³)	88	81	86
	折算后 NO _x 排放浓度(mg/m ³)	123	116	121
	O ₂ 含量 (%)	8.5	8.8	8.6
	烟温 (°C)	129.3	125.4	126.1
	气压 (kPa)	100.3	100.4	100.3
烟气黑度 (级)	<1	<1	<1	

注: 1、当测定结果在检出限以上时, 报实际测定结果值;
2、当测定结果低于检出限时, 报所用方法的检出限值, 并加标志“L”。

表 3 无组织废气检测结果表

采样日期	检测项目	检测结果			
		肇 4 转油站厂界 上风向 1#	肇 4 转油站厂界 下风向 2#	肇 4 转油站厂界 下风向 3#	肇 4 转油站厂界 下风向 4#
2024.07.30	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.60	0.70	0.72	0.76

		0.61	0.71	0.74	0.79
		0.63	0.73	0.75	0.78
采样日期	检测项目	检测结果			
		肇5转油站厂界上风向1#	肇5转油站厂界下风向2#	肇5转油站厂界下风向3#	肇5转油站厂界下风向4#
2024.07.30	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.60	0.72	0.75	0.76
		0.62	0.73	0.77	0.78
		0.61	0.71	0.80	0.79
采样日期	检测项目	检测结果			
		肇4转油站厂界上风向1#	肇4转油站厂界下风向2#	肇4转油站厂界下风向3#	肇4转油站厂界下风向4#
2024.08.02	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.63	0.80	0.85	0.73
		0.62	0.71	0.82	0.76
		0.61	0.76	0.86	0.81
采样日期	检测项目	检测结果			
		肇5转油站厂界上风向1#	肇5转油站厂界下风向2#	肇5转油站厂界下风向3#	肇5转油站厂界下风向4#
2024.08.02	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.61	0.87	0.73	0.71
		0.64	0.82	0.71	0.74
		0.65	0.86	0.72	0.76

表4 无组织废气检测结果表

采样日期	检测项目	采样频次	检测结果	
			肇4转油站加热炉处	肇5转油站加热炉处
2024.07.30	非甲烷总烃 (mg/m ³)	第一次	0.74	0.83
			0.79	0.81
			0.77	0.82
		第一次 1小时均值	0.77	0.82

		第二次	0.80	0.83		
			0.78	0.77		
			0.81	0.80		
		第二次 1小时均值	0.80	0.80		
			第三次	0.75	0.75	
				0.76	0.73	
		第三次 1小时均值	0.82	0.74		
			0.78	0.74		
		2024.08.02	非甲烷总烃 (mg/m ³)	第一次	0.67	0.80
					0.65	0.87
0.66	0.94					
第一次 1小时均值	0.66			0.87		
	第二次			0.80	0.87	
0.79				0.86		
0.77				0.88		
第二次 1小时均值	0.79			0.87		
	第三次			0.80	0.82	
0.76				0.83		
0.70		0.84				
第三次 1小时均值	0.75	0.83				

表 5 环境空气检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			
2024.07.30	3#平台	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.65	0.60	0.64	0.63
	肇州县		0.61	0.62	0.64	0.65
2024.08.02	3#平台		0.62	0.60	0.62	0.65

	肇州县		0.63	0.64	0.65	0.64
--	-----	--	------	------	------	------

表 6 土壤检测结果表

采样日期	检测项目	单位	检测结果	
			4#平台井场永久占地内	6#平台井场永久占地内
2024.07.30	pH 值	无量纲	8.21	8.14
	砷	mg/kg	3.90	3.44
	镉	mg/kg	1.75	2.21
	六价铬	mg/kg	未检出	未检出
	铜	mg/kg	15.6	17.3
	铅	mg/kg	15.9	18.3
	汞	mg/kg	0.112	0.126
	镍	mg/kg	16.7	15.9
	三氯甲烷	μg/kg	未检出	未检出
	四氯化碳	μg/kg	未检出	未检出
	氯甲烷	μg/Kg	未检出	未检出
	1,1-二氯乙烷	μg/kg	未检出	未检出
	1,2-二氯乙烷	μg/kg	未检出	未检出
	1,1-二氯乙烯	μg/kg	未检出	未检出
	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	未检出	未检出
	反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	未检出	未检出
	二氯甲烷	μg/kg	未检出	未检出
	1,2-二氯丙烷	μg/kg	未检出	未检出
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	未检出	未检出	
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	未检出	未检出	

四氯乙烯	μg/kg	未检出	未检出
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	未检出	未检出
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	未检出	未检出
三氯乙烯	μg/kg	未检出	未检出
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	未检出	未检出
氯乙烯	μg/kg	未检出	未检出
苯	μg/kg	未检出	未检出
氯苯	μg/kg	未检出	未检出
1,2-二氯苯	μg/kg	未检出	未检出
1,4-二氯苯	μg/kg	未检出	未检出
乙苯	μg/kg	未检出	未检出
苯乙烯	μg/kg	未检出	未检出
甲苯	μg/kg	未检出	未检出
间,对-二甲苯	μg/kg	未检出	未检出
邻-二甲苯	μg/kg	未检出	未检出
硝基苯	mg/kg	未检出	未检出
苯胺	mg/kg	未检出	未检出
2-氯酚	mg/kg	未检出	未检出
苯并(a)蒽	mg/kg	未检出	未检出
苯并(a)芘	mg/kg	未检出	未检出
苯并(b)荧蒽	mg/kg	未检出	未检出
苯并(k)荧蒽	mg/kg	未检出	未检出
二苯并(a,h)蒽	mg/kg	未检出	未检出
蒽	mg/kg	未检出	未检出

	茚并 (1,2,3-cd) 芘	mg/kg	未检出		未检出	
	萘	mg/kg	未检出		未检出	
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	165		132	
采样 日期	检测项目	单位	检测结果			
			4#平台井 场永久占 地外 10m	4#平台井 场永久占 地外 20m	4#平台井 场永久占 地外 30m	4#平台井 场永久占 地外 50m
2024.07.30	pH 值	无量纲	8.45	8.18	8.34	8.24
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	173	21	9	未检出
采样 日期	检测项目	单位	检测结果			
			6#平台井 场永久占 地外 10m	6#平台井 场永久占 地外 20m	6#平台井 场永久占 地外 30m	6#平台井 场永久占 地外 50m
2024.07.30	pH 值	无量纲	8.42	8.18	8.34	8.03
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	53	16	8	未检出
采样时间	检测项目	单位	检测结果			
			4#平台南侧 500m 耕地		6#平台东北侧 500m 草地	
2024.07.30	pH 值	无量纲	7.80		7.83	
	砷	mg/kg	3.92		3.81	
	镉	mg/kg	0.12		0.19	
	铬	mg/kg	59		33	
	铜	mg/kg	16.3		20.4	
	铅	mg/kg	17.0		20.0	
	汞	mg/kg	0.118		0.131	
	镍	mg/kg	19.0		18.2	
	锌	mg/kg	22.5		22.7	

	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	12	6
--	--------------------------------------------	-------	----	---

注: 1、当测定结果在检出限以上时, 报实际测定结果值;
2、当测定结果低于检出限时, 报“未检出”。

表 7 包气带检测结果表

采样日期	检测项目	单位	检测结果			
			肇 51-36 转注 井井场内 (0-20cm)	肇 51-36 转注 井井场内 (20-40cm)	肇 51-36 转注 井井场东侧 100 耕地 (0-20cm)	肇 51-36 转注 井井场东侧 100 耕地 (20-40cm)
2024. 07.30	pH 值	无量纲	7.5	7.6	7.6	7.7
	砷	(μg/L)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
	镉	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	铬	(mg/L)	0.16	0.13	0.16	0.13
	铜	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	铅	(mg/L)	4.7	4.3	4.1	4.5
	汞	(μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
	镍	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	锌	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	六价铬	(mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
	石油类	(mg/L)	0.17	0.18	0.19	0.19
	挥发酚	(mg/L)	0.0039	0.0025	0.0042	0.0020
采样日期	检测项目	单位	检测结果			
			肇一联加热 装置西侧 5m (0-20cm)	肇一联加热 装置西侧 5m (20-40cm)	肇一联厂界 西侧 100m (0-20cm)	肇一联厂界 西侧 100m (20-40cm)
2024. 07.30	pH 值	无量纲	7.5	7.5	7.6	7.6
	砷	(μg/L)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
	镉	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	铬	(mg/L)	0.19	0.13	0.13	0.10

铜	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
铅	(mg/L)	6.1	6.8	6.8	6.5
汞	(μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
镍	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
锌	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
六价铬	(mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
石油类	(mg/L)	0.28	0.25	0.26	0.26
挥发酚	(mg/L)	0.0027	0.0026	0.0014	0.0019

注: 1、当测定结果在检出限以上时, 报实际测定结果值;
2、当测定结果低于检出限时, 报所用方法的检出限值, 并加标志“L”。

表 8 地下水检测结果表

采样日期	检测项目	检测结果					
		杨树林水井		3#平台下游 10m 处水井		东万福屯水井	
		DX24073 0H0101	DX24073 0H0102	DX24073 0H0103	DX24073 0H0104	DX24073 0H0105	DX24073 0H0106
2024.07.30	pH 值 (无量纲)	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.4
	钙和镁总量 (总硬度, mg/L)	408	436	386	346	352	350
	溶解性总固体 (mg/L)	857	911	734	711	659	681
	氯化物 (Cl ⁻ , mg/L)	7.69	8.32	4.45	4.65	8.12	8.27
	亚硝酸盐 (NO ₂ ⁻ , mg/L)	0.410	0.442	0.197	0.220	0.422	0.423
	硝酸盐 (NO ₃ ⁻ , mg/L)	1.76	1.78	0.687	0.902	1.74	1.77
	硫酸盐 (SO ₄ ²⁻ , mg/L)	2.46	2.55	1.75	1.47	2.64	2.53
	铁 (mg/L)	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L
	锰 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09
	挥发酚 (mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
	高锰酸盐指数 (耗氧量, mg/L)	1.8	2.0	1.9	2.1	2.2	1.7

	氨氮 (mg/L)	0.288	0.286	0.299	0.302	0.368	0.371
	铅 (μg/L)	10L	10L	10L	10L	10L	10L
	汞 (μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
	砷 (μg/L)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
	镉 (μg/L)	1L	1L	1L	1L	1L	1L
	六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
	氟化物 (mg/L)	0.83	0.89	0.47	0.48	0.90	0.92
	氰化物 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
	总大肠菌群 (MPN/L)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
	细菌总数 (CFU/ml)	60	70	80	70	80	70
	石油类 (mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
	钾 (mg/L)	1.22	1.13	1.10	1.31	1.27	1.18
	钠 (mg/L)	62.9	58.6	46.4	54.2	48.4	49.1
	钙 (mg/L)	32.3	39.6	45.0	45.3	46.1	40.8
	镁 (mg/L)	12.5	14.0	13.6	11.1	13.3	10.5
	碱度 (CO ₃ ²⁻ , mg/L)	0	0	0	0	0	0
	碱度 (HCO ₃ ⁻ , mg/L)	344	367	304	309	353	317
	硫化物 (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
	钡 (mg/L)	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L
采样日期	检测项目	检测结果					
		杨树林水井		3#平台下游 10m 处水井		东万福屯水井	
		DX240802H0101	DX240802H0102	DX240802H0103	DX240802H0104	DX240802H0105	DX240802H0106
2024.08.02	pH 值 (无量纲)	7.1	7.2	7.5	7.5	7.4	7.3
	钙和镁总量 (总硬度,mg/L)	348	336	324	320	408	400

溶解性总固体 (mg/L)	831	815	821	803	779	765
氯化物 (Cl ⁻ , mg/L)	5.30	4.60	4.04	3.84	5.06	5.20
亚硝酸盐 (NO ₂ ⁻ , mg/L)	0.346	0.239	0.122	0.156	0.313	0.269
硝酸盐 (NO ₃ ⁻ , mg/L)	1.54	1.12	1.50	0.988	1.39	1.37
硫酸盐 (SO ₄ ²⁻ , mg/L)	2.13	1.71	2.06	1.88	1.91	1.99
铁 (mg/L)	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L
锰 (mg/L)	0.07	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07
挥发酚 (mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
高锰酸盐指数 (耗氧量, mg/L)	2.3	1.9	2.1	2.2	2.0	1.9
氨氮 (mg/L)	0.283	0.280	0.302	0.304	0.379	0.382
铅 (μg/L)	10L	10L	10L	10L	10L	10L
汞 (μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
砷 (μg/L)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
镉 (μg/L)	1L	1L	1L	1L	1L	1L
六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
氟化物 (mg/L)	0.60	0.50	0.40	0.38	0.55	0.57
氰化物 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
总大肠菌群 (MPN/L)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
细菌总数 (CFU/ml)	70	80	70	80	70	80
石油类 (mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
钾 (mg/L)	0.948	1.14	1.11	1.19	1.28	1.19
钠 (mg/L)	40.4	45.3	58.4	55.5	39.8	36.6
钙 (mg/L)	39.6	39.1	45.3	46.1	38.8	40.8
镁 (mg/L)	12.5	17.1	13.6	17.0	13.3	11.2

碱度 (CO ₃ ²⁻ , mg/L)	0	0	0	0	0	0
碱度 (HCO ₃ ⁻ , mg/L)	302	317	328	332	313	292
硫化物 (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
钡 (mg/L)	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L

注: 1、当测定结果在检出限以上时, 报实际测定结果值;
2、当测定结果低于检出限时, 报所用方法的检出限值, 并加标志“L”。

表 9 地表水检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果
			DB240730H0101
2024.07.30	西大干渠	pH 值 (无量纲)	7.2
		化学需氧量 (mg/L)	38
		氨氮 (mg/L)	0.731
		高锰酸盐指数 (mg/L)	11.6
		硫化物 (mg/L)	0.01L
		石油类 (mg/L)	0.01L
		水温 (°C)	26.2
采样日期	检测点位	检测项目	检测结果
			DB240802H0101
2024.08.02	西大干渠	pH 值 (无量纲)	7.1
		化学需氧量 (mg/L)	40
		氨氮 (mg/L)	0.726
		高锰酸盐指数 (mg/L)	13.3
		硫化物 (mg/L)	0.01L
		石油类 (mg/L)	0.01L
		水温 (°C)	24.8

注: 1、当测定结果在检出限以上时, 报实际测定结果值;
2、当测定结果低于检出限时, 报所用方法的检出限值, 并加标志“L”。

以下无正文

报告编写人: 郑文彬
审核人: 宋善刚
授权签字人: 宋善刚
签发日期: 2024年12月30日





报告编号: JRD-BG-202407107



检测报告

报告名称 : 大庆模范屯油田有限责任公司检测报告

委托单位 : 大庆模范屯油田有限责任公司

检测类别 : 委托检测

样品类型 : 无组织废气

黑龙江省吉瑞达检测科技有限公司



说 明

- 1、本报告未加盖本公司检测报告专用章、骑缝章、计量认证章及无本公司防伪标识视为无效。
- 2、本报告无审核人及授权签字人签字无效，涂改、增删、部分复印无效。
- 3、委托检测结果仅对当时工况及环境状况负责，委托单位自行送样仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。
- 4、本报告未经同意不得用于商业宣传。
- 5、对本报告如有异议，请于收到报告之日起十日内向本公司查询，来函来电请注明报告编号，逾期不予受理。

黑龙江省吉瑞达检测科技有限公司

地址：黑龙江省大庆市高新区安萨路 9-1

邮政编码：163000

联系电话：13836766965

联系人：宋喜晶

一、检测信息

委托方: 大庆模范屯油田有限责任公司

受检单位: 大庆模范屯油田有限责任公司

地址: 大庆市肇州县

联系人: 牛磊

联系电话: 18745901333

采样时间: 2024年07月18-19日

采样人员: 张磊、付宝林

样品分析时间: 2024年07月18-24日

分析人员: 陈雨欣

二、检测内容

1、无组织废气

- (1) 检测点位: 肇一联合站厂界上下风向1#-4#、宋二联合站厂界上下风向1#-4#, 共计8个点位;

检测项目: 非甲烷总烃;

检测频次: 检测2天, 3次/天。

- (2) 检测点位: 肇一联合站厂区内加热炉处、宋二联合站厂区内加热炉处, 共计2个点位;

检测项目: 非甲烷总烃;

检测频次: 检测2天, 3次/天(小时平均值)。

三、质量保证

为保证本次检测分析数据的准确性、科学性, 本次检测采取了相关质控措施, 合格率为100%。分析中所使用的各类器皿及仪器, 均经国家认可的计量检定部门检定, 且检定合格。

四、检测项目、分析方法及分析仪器

检测项目、分析方法及分析仪器信息见表1。

表1 检测项目、分析方法及分析仪器信息

类别	检测项目	分析方法名称及方法标准号	分析仪器、型号及编号
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 GC9600 JRD-019

五、检测结果

检测结果见表2—表3。

表2 无组织废气检测结果表

采样日期	检测项目	检测结果			
		肇一联合站厂界上风向 1#	肇一联合站厂界下风向 2#	肇一联合站厂界下风向 3#	肇一联合站厂界下风向 4#
2024.07.18	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.60	0.72	0.76	0.73
		0.63	0.71	0.72	0.74
		0.61	0.70	0.76	0.75
采样日期	检测项目	检测结果			
		宋二联合站厂界上风向 1#	宋二联合站厂界下风向 2#	宋二联合站厂界下风向 3#	宋二联合站厂界下风向 4#
2024.07.18	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.60	0.72	0.77	0.79
		0.64	0.71	0.78	0.80
		0.61	0.73	0.75	0.82
采样日期	检测项目	检测结果			
		肇一联合站厂界上风向 1#	肇一联合站厂界下风向 2#	肇一联合站厂界下风向 3#	肇一联合站厂界下风向 4#
2024.07.19	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.61	0.80	0.73	0.86
		0.65	0.83	0.78	0.83
		0.62	0.81	0.76	0.89
采样日期	检测项目	检测结果			
		宋二联合站厂界上风向 1#	宋二联合站厂界下风向 2#	宋二联合站厂界下风向 3#	宋二联合站厂界下风向 4#
2024.07.19	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.64	0.71	0.75	0.90
		0.60	0.75	0.74	0.94
		0.63	0.73	0.78	0.92

表 3 无组织废气检测结果表

采样日期	检测项目	采样频次	检测结果			
			肇一联合站加热炉处	宋二联合站加热炉处		
2024.07.18	非甲烷总烃 (mg/m ³)	第 1 次	0.66	0.74		
		第 2 次	0.68	0.76		
		第 3 次	0.74	0.79		
		第一次 1 小时均值	0.69	0.76		
		第 1 次	0.70	0.84		
		第 2 次	0.75	0.85		
		第 3 次	0.69	0.73		
		第二次 1 小时均值	0.71	0.81		
		第 1 次	0.76	0.74		
		第 2 次	0.71	0.70		
		第 3 次	0.74	0.78		
		第三次 1 小时均值	0.74	0.74		
		2024.07.19	非甲烷总烃 (mg/m ³)	第 1 次	0.61	0.72
				第 2 次	0.69	0.74
第 3 次	0.68			0.71		
第一次 1 小时均值	0.66			0.72		
第 1 次	0.63			0.76		
第 2 次	0.71			0.73		
第 3 次	0.66			0.72		
第二次 1 小时均值	0.67			0.74		
第 1 次	0.66			0.71		

	第 2 次	0.61	0.74
	第 3 次	0.62	0.71
	第三次 1 小时均值	0.63	0.72

以下无正文

报告编写人: 
审核人: 
授权签字人: 
签发日期: 2024年12月30日



报告编号: JRD-BG-202408094



检测报告

报告名称 : 2022年州 254 区块、芳 217-斜 157 区块扶余油
层产能建设地面工程项目检测报告

委托单位 : 大庆模范屯油田有限责任公司

检测类别 : 委托检测

样品类型 : 有组织废气、环境空气、土壤、
包气带、地下水

黑龙江省吉瑞达检测科技有限公司



说 明

- 1、本报告未加盖本公司检测报告专用章、骑缝章、计量认证章及无本公司防伪标识视为无效。
- 2、本报告无审核人及授权签字人签字无效，涂改、增删、部分复印无效。
- 3、委托检测结果仅对当时工况及环境状况负责，委托单位自行送样仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。
- 4、本报告未经同意不得用于商业宣传。
- 5、对本报告如有异议，请于收到报告之日起十日内向本公司查询，来函来电请注明报告编号，逾期不予受理。

黑龙江省吉瑞达检测科技有限公司

地址：黑龙江省大庆市高新区安萨路 9-1

邮政编码：163000

联系电话：13836766965

联系人：宋喜晶

一、检测信息

委托方: 大庆模范屯油田有限责任公司	
受检单位: 大庆模范屯油田有限责任公司	
地址: 大庆市肇州县	
联系人: 牛磊	联系电话: 18745901333
采样时间: 2024年08月08-09日	采样人员: 张磊、李玉和
样品分析时间: 2024年08月08-20日	分析人员: 高德宇、徐畅、梁安琪、 盛雪源、陈雨欣、于爽、 张磊、李金琦、刘珊珊、 于洪瑶、郭艳玲

二、检测内容

1、有组织废气

检测点位: 肇2转油站加热炉排气筒;

检测项目: 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度;

检测频次: 检测2天, 3次/天。

2、环境空气

检测点位: 9#平台、后文中, 共计2个点位;

检测项目: 非甲烷总烃;

检测频次: 检测2天, 4次/天。

3、土壤

- (1) 检测点位: 8#平台井场永久占地内、州254-扶平1井场永久占地内, 共计2个点位;

检测项目: pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、三氯甲烷、四氯化碳、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、二苯并(ah)蒽、蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘、石油烃(C₁₀-C₄₀);

检测频次: 检测1天, 1次/天。

- (2) 检测点位: 8#平台井场永久占地外 10m、8#平台井场永久占地外 20m、8#平台井场永久占地外 30m、8#平台井场永久占地外 50m、州 254-扶平 1 井场永久占地外 10m、州 254-扶平 1 井场永久占地外 20m、州 254-扶平 1 井场永久占地外 30m、州 254-扶平 1 井场永久占地外 50m, 共计 8 个点位;

检测项目: pH 值、石油烃 (C₁₀-C₄₀);

检测频次: 检测 1 天, 1 次/天。

- (3) 检测点位: 8#平台井场永久占地外 100m 耕地、州 254-扶平 1 井场永久占地西侧 100m 草地, 共计 2 个点位;

检测项目: pH 值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、石油烃 (C₁₀-C₄₀);

检测频次: 检测 1 天, 1 次/天。

4、包气带

检测点位: 芳 217-斜 153 井场内 (0-20cm)、芳 217-斜 153 井场内 (20-40cm)、芳 217-斜 153 井西侧 100 耕地 (0-20cm)、芳 217-斜 153 井西侧 100 耕地 (20-40cm), 共计 4 个点位;

检测项目: pH 值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、六价铬、石油类、挥发酚;

检测频次: 检测 1 天, 1 次/天。

5、地下水

检测点位: 吕国春屯水井 (背景监测井)、王豆腐坊水井 (跟踪监测井)、14#平台下游水井 (跟踪监测井), 共计 3 个点位;

检测项目: pH 值、钙和镁总量 (总硬度)、溶解性总固体、氯化物 (Cl⁻)、亚硝酸盐 (NO₂⁻)、硝酸盐 (NO₃⁻)、硫酸盐 (SO₄²⁻)、铁、锰、挥发酚、高锰酸盐指数 (耗氧量)、氨氮、铅、汞、砷、镉、六价铬、氟化物、氰化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、钾、钠、钙、镁、碱度 (HCO₃⁻、CO₃²⁻)、硫化物、钡;

检测频次: 检测 2 天, 2 次/天。

三、质量保证

为保证本次检测分析数据的准确性、科学性, 本次检测采取了相关质控措施, 合格率为 100%。分析中所使用的各类器皿及仪器, 均经国家认可的计量检定部门检定, 且检定合格。

四、检测项目、分析方法及分析仪器

检测项目、分析方法及分析仪器信息见表 1。

表 1 检测项目、分析方法及分析仪器信息

类别	检测项目	分析方法名称及方法标准号	分析仪器、型号及编号
有组织废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电子天平 PT-104/55SY JRD-011
	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	林格曼烟气黑度图
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	大流量烟尘(气)测试仪 YQ-3000D JRD-127
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	大流量烟尘(气)测试仪 YQ-3000D JRD-127
环境空气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 GC9600 JRD-019
土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	精密酸度计 pHS-2F JRD-006
	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分: 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	原子荧光光度计 RGF-6800 JRD-015
	铅、镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	铜、镍、锌	土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法 NY/T 1613-2008	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分: 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	原子荧光光度计 RGF-6800 JRD-015
	三氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025

四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
氯甲烷	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
顺式-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
反式-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,1,1,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,1,2,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,1,1-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,1,2-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C

	HJ 605-2011	JRD-025
氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
邻二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
间,对二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
苯胺	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
2-氯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
苯并(a)蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
苯并(a)芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025

	苯并(b) 蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	苯并(k) 荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	二苯并(ah) 蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	蒽、荼	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	茚并(1,2,3-cd) 芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪 8860 JRD-140
	铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
包气带	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	精密酸度计 pHS-2F JRD-006
	汞、砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 RGF-6800 JRD-015
	铅、镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	铜、锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 第一部分直接法	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-89	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL450 JRD-018
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(方法 1 萃取分光光度法) HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 pHB-4 JRD-056

钙和镁总量 (总硬度)	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB 7477-87	滴定管 25mL
溶解性总固 体	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官 性状和物理指标 (11.1 溶解性总固体 称 量法) GB/T 5750.4-2023	电子天平 FA2004 JRD-145
氯化物(Cl ⁻)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定离子色 谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-8618 JRD-016
亚硝酸盐 (NO ₂ ⁻)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定离子色 谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-8618 JRD-016
硝酸盐 (NO ₃ ⁻)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定离子色 谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-8618 JRD-016
硫化物 (SO ₄ ²⁻)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定离子色 谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-8618 JRD-016
铁、锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-89	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光 光度法 (方法1 萃取分光光度法) HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
高锰酸盐指 数(耗氧量)	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-89	滴定管 25mL
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
汞、砷	水质 汞、砷、硒、铊和铋的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 RGF-6800 JRD-015
铅、镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 第二部分整合萃取法	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-87	离子计 PXSJ-270F JRD-149
氰化物	氰化物的测定 容量法和分光光度法 (方法 2 异烟酸-吡啶啉分光光度法) HJ 484-2009	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
总大肠 菌群	总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测 分析方法》(第四版) 国家环境保护总 局 (2002年)	电热恒温培养箱 DHP-360 型 JRD-003
细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法	电热恒温培养箱 DHP-360 型

	HJ 1000-2018	JRD-003
石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970-2018	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
钾、钠	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-89	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
钙、镁	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-89	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
碱度 (CO ₃ ²⁻ 、 HCO ₃ ⁻)	碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分 析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002 年)	滴定管 25mL
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
钡	水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 603-2011	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128

五、检测结果

检测结果见表 2—表 6。

表 2 有组织废气检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2024.08.08	肇 2 转油站 加热炉排气 筒	废气排放量(Nm ³ /h)	1982	1874	1945
		实测低浓度颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	10.6	11.4	10.9
		折算后低浓度颗粒 物排放浓度(mg/m ³)	13.8	14.7	14.4
		实测 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	3L	3L	3L
		折算后 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	/	/	/
		实测 NO _x 排放浓度 (mg/m ³)	75	73	72
		折算后 NO _x 排放浓 度(mg/m ³)	98	94	95
		O ₂ 含量 (%)	7.6	7.4	7.8
		烟温 (°C)	120.3	119.5	120.7
		气压 (kPa)	100.1	100.1	100.0

		烟气黑度 (级)	<1	<1	<1
2024.08.09	肇2转油站 加热炉排气筒	废气排放量(Nm ³ /h)	2014	1948	2034
		实测低浓度颗粒物 排放浓度(mg/m ³)	12.0	12.1	12.6
		折算后低浓度颗粒 物排放浓度(mg/m ³)	16.0	15.8	16.3
		实测 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	3L	3L	3L
		折算后 SO ₂ 排放浓度 (mg/m ³)	/	/	/
		实测 NO _x 排放浓度 (mg/m ³)	81	79	76
		折算后 NO _x 排放浓 度(mg/m ³)	108	103	99
		O ₂ 含量 (%)	7.9	7.6	7.5
		烟温 (°C)	120.8	120.4	120.9
		气压 (kPa)	100.3	100.2	100.4
		烟气黑度 (级)	<1	<1	<1

注: 1、当测定结果在检出限以上时, 报实际测定结果值;
2、当测定结果低于检出限时, 报所用方法的检出限值, 并加标志“L”。

表3 环境空气检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			
2024.08.08	9#平台	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.64	0.60	0.64	0.61
	后文中		0.60	0.61	0.65	0.64
2024.08.09	9#平台		0.62	0.61	0.62	0.61
	后文中		0.60	0.62	0.62	0.64

表4 土壤检测结果表

采样日期	检测项目	单位	检测结果	
			8#平台井场永久占地内	州254-扶平1井场永久占地内
2024.08.08	pH值	无量纲	8.14	8.20
	砷	mg/kg	2.65	2.57

镉	mg/kg	1.76	2.19
六价铬	mg/kg	未检出	未检出
铜	mg/kg	17.3	18.3
铅	mg/kg	18.4	18.6
汞	mg/kg	0.208	0.240
镍	mg/kg	17.5	18.2
三氯甲烷	μg/kg	未检出	未检出
四氯化碳	μg/kg	未检出	未检出
氟甲烷	μg/Kg	未检出	未检出
1,1-二氯乙烷	μg/kg	未检出	未检出
1,2-二氯乙烷	μg/kg	未检出	未检出
1,1-二氯乙烯	μg/kg	未检出	未检出
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	未检出	未检出
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	未检出	未检出
二氯甲烷	μg/kg	未检出	未检出
1,2-二氯丙烷	μg/kg	未检出	未检出
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	未检出	未检出
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	未检出	未检出
四氯乙烯	μg/kg	未检出	未检出
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	未检出	未检出
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	未检出	未检出
三氯乙烯	μg/kg	未检出	未检出
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	未检出	未检出

	氯乙烯	μg/kg	未检出	未检出
	苯	μg/kg	未检出	未检出
	氯苯	μg/kg	未检出	未检出
	1,2-二氯苯	μg/kg	未检出	未检出
	1,4-二氯苯	μg/kg	未检出	未检出
	乙苯	μg/kg	未检出	未检出
	苯乙烯	μg/kg	未检出	未检出
	甲苯	μg/kg	未检出	未检出
	间,对-二甲苯	μg/kg	未检出	未检出
	邻-二甲苯	μg/kg	未检出	未检出
	硝基苯	mg/kg	未检出	未检出
	苯胺	mg/kg	未检出	未检出
	2-氯酚	mg/kg	未检出	未检出
	苯并(a)蒽	mg/kg	未检出	未检出
	苯并(a)芘	mg/kg	未检出	未检出
	苯并(b)荧蒽	mg/kg	未检出	未检出
	苯并(k)荧蒽	mg/kg	未检出	未检出
	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	未检出	未检出
	蒽	mg/kg	未检出	未检出
	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	未检出	未检出
	萘	mg/kg	未检出	未检出
	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	100	94
采样日期	检测项目	单位	检测结果	

			8#平台井场永久占地外 10m	8#平台井场永久占地外 20m	8#平台井场永久占地外 30m	8#平台井场永久占地外 50m
2024.08.08	pH 值	无量纲	8.13	8.23	8.41	8.32
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	141	83	15	6
采样日期	检测项目	单位	检测结果			
			州 254-扶平 1 井场永久占地外 10m	州 254-扶平 1 井场永久占地外 20m	州 254-扶平 1 井场永久占地外 30m	州 254-扶平 1 井场永久占地外 50m
2024.08.08	pH 值	无量纲	8.25	8.41	8.33	8.56
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	170	138	15	未检出
采样时间	检测项目	单位	检测结果			
			8#平台井场永久占地外 100m 耕地	州 254-扶平 1 井场永久占地西侧 100m 草地		
2024.08.08	pH 值	无量纲	7.76		7.64	
	砷	mg/kg	3.31		3.44	
	镉	mg/kg	0.19		0.22	
	铬	mg/kg	39		38	
	铜	mg/kg	16.3		19.7	
	铅	mg/kg	17.4		21.5	
	汞	mg/kg	0.275		0.310	
	镍	mg/kg	17.5		17.5	
	锌	mg/kg	25.1		23.9	
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	6		未检出	

注: 1、当测定结果在检出限以上时, 报实际测定结果值;
 2、当测定结果低于检出限时, 报“未检出”。

表 5 包气带检测结果表

采样	检测	单位	检测结果
----	----	----	------

日期	项目		芳 217-斜 153 井场内 (0-20cm)	芳 217-斜 153 井场内 (20-40cm)	芳 217-斜 153 井西侧 100 耕 地 (0-20cm)	芳 217-斜 153 井西侧 100 耕 地 (20-40cm)
2024. 08.08	pH 值	无量纲	7.9	7.7	7.7	7.8
	砷	($\mu\text{g/L}$)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
	镉	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	铬	(mg/L)	0.16	0.16	0.24	0.19
	铜	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	铅	(mg/L)	4.5	4.3	4.0	3.5
	汞	($\mu\text{g/L}$)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
	镍	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	锌	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	六价 铬	(mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
	石油 类	(mg/L)	0.26	0.24	0.26	0.28
	挥发 酚	(mg/L)	0.0045	0.0034	0.0027	0.0014

注: 1、当测定结果在检出限以上时, 报实际测定结果值;
2、当测定结果低于检出限时, 报所用方法的检出限值, 并加标志“L”。

表 6 地下水检测结果表

采样日期	检测项目	检测结果					
		吕国春屯水井		王豆腐坊水井		14#平台下游水井	
		DX24080 8H0101	DX24080 8H0102	DX24080 8H0103	DX24080 8H0104	DX24080 8H0105	DX24080 8H0106
2024.08.08	pH 值 (无量纲)	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3
	钙和镁总量 (总硬度, mg/L)	330	338	340	345	353	360
	溶解性总固体 (mg/L)	637	611	629	643	605	621
	氯化物 (Cl^- , mg/L)	4.69	4.98	8.00	8.51	8.11	8.30

亚硝酸盐 (NO ₂ ⁻ , mg/L)	0.579	0.362	0.470	0.474	0.485	0.502
硝酸盐 (NO ₃ ⁻ , mg/L)	1.14	1.38	1.76	1.95	1.86	1.94
硫酸盐 (SO ₄ ²⁻ , mg/L)	3.99	3.34	2.56	2.77	3.05	2.96
铁 (mg/L)	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L
锰 (mg/L)	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07
挥发酚 (mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
高锰酸盐指数 (耗氧量, mg/L)	2.1	2.3	2.0	2.4	2.2	2.5
氨氮 (mg/L)	0.270	0.264	0.304	0.302	0.352	0.350
铅 (μg/L)	10L	10L	10L	10L	10L	10L
汞 (μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
砷 (μg/L)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
镉 (μg/L)	1L	1L	1L	1L	1L	1L
六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
氟化物 (mg/L)	0.57	0.52	0.83	0.85	0.78	0.81
氰化物 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
总大肠菌群 (MPN/L)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
细菌总数 (CFU/ml)	70	80	80	70	60	70
石油类 (mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
钾 (mg/L)	1.37	1.42	1.74	1.84	1.78	1.50
钠 (mg/L)	31.9	36.3	32.0	36.3	34.8	38.4
钙 (mg/L)	42.7	42.5	41.9	46.1	45.3	41.6
镁 (mg/L)	16.8	18.6	16.4	19.6	15.9	18.1
碱度 (CO ₃ ²⁻ , mg/L)	0	0	0	0	0	0
碱度 (HCO ₃ ⁻ , mg/L)	526	529	518	513	503	494

	硫化物 (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
	钡 (mg/L)	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L
采样日期	检测项目	检测结果					
		吕国春屯水井		王豆腐坊水井		14#平台下游水井	
		DX240809H0101	DX240809H0102	DX240809H0103	DX240809H0104	DX240809H0105	DX240809H0106
2024.08.09	pH 值 (无量纲)	7.2	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5
	钙和镁总量 (总硬度,mg/L)	334	342	350	358	356	361
	溶解性总固体 (mg/L)	598	613	603	623	647	651
	氯化物 (Cl ⁻ , mg/L)	4.92	4.87	8.68	9.24	8.37	8.35
	亚硝酸盐 (NO ₂ ⁻ , mg/L)	0.297	0.301	0.496	0.536	0.456	0.469
	硝酸盐 (NO ₃ ⁻ , mg/L)	1.22	1.07	2.00	2.07	1.90	1.87
	硫酸盐 (SO ₄ ²⁻ , mg/L)	3.26	3.19	2.82	2.78	3.02	2.93
	铁 (mg/L)	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L
	锰 (mg/L)	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.08
	挥发酚 (mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
	高锰酸盐指数 (耗氧量, mg/L)	1.9	2.1	2.0	1.8	2.3	1.9
	氨氮 (mg/L)	0.272	0.270	0.283	0.280	0.352	0.350
	铅 (μg/L)	10L	10L	10L	10L	10L	10L
	汞 (μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
	砷 (μg/L)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
	镉 (μg/L)	1L	1L	1L	1L	1L	1L
	六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
	氟化物 (mg/L)	0.51	0.53	0.87	0.94	0.78	0.84
氰化物 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	

总大肠菌群 (MPN/L)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
细菌总数 (CFU/ml)	80	80	70	60	70	80
石油类 (mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
钾 (mg/L)	1.24	1.43	1.30	1.88	1.65	1.63
钠 (mg/L)	33.1	30.4	35.0	27.6	31.0	33.0
钙 (mg/L)	42.2	47.5	44.2	44.2	42.2	41.0
镁 (mg/L)	15.2	16.6	19.9	16.0	15.0	18.9
碱度 (CO ₃ ²⁻ , mg/L)	0	0	0	0	0	0
碱度 (HCO ₃ ⁻ , mg/L)	482	477	488	487	450	454
硫化物 (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
钡 (mg/L)	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L

注: 1、当测定结果在检出限以上时, 报实际测定结果值;
 2、当测定结果低于检出限时, 报所用方法的检出限值, 并加标志“L”。

以下无正文

报告编写人: 郑天欣
 审核人: 蔡岩刚
 授权签字人: 田天
 签发日期: 2024年12月30日





报告编号: JRD-BG-202408097



检测报告

报告名称 : 2023 年州 20 区块葡萄花油层产能建设工程
(合作) 项目检测报告

委托单位 : 大庆模范屯油田有限责任公司

检测类别 : 委托检测

样品类型 : 无组织废气、环境空气、
土壤、包气带、地下水

黑龙江省吉瑞达检测科技有限公司



说 明

- 1、本报告未加盖本公司检测报告专用章、骑缝章、计量认证章及无本公司防伪标识视为无效。
- 2、本报告无审核人及授权签字人签字无效，涂改、增删、部分复印无效。
- 3、委托检测结果仅对当时工况及环境状况负责，委托单位自行送样仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。
- 4、本报告未经同意不得用于商业宣传。
- 5、对本报告如有异议，请于收到报告之日起十日内向本公司查询，来函来电请注明报告编号，逾期不予受理。

黑龙江省吉瑞达检测科技有限公司
地址：黑龙江省大庆市高新区安萨路 9-1
邮政编码：163000
联系电话：13836766965
联系人：宋喜晶

一、检测信息

委托方: 大庆模范屯油田有限责任公司	
受检单位: 大庆模范屯油田有限责任公司	
地址: 大庆市肇州县	
联系人: 牛磊	联系电话: 18745901333
采样时间: 2024年08月14-15日	采样人员: 周雨、黄志强
样品分析时间: 2024年08月14-29日	分析人员: 高德宇、徐畅、盛雪源、梁安琪、陈雨欣、于爽、张磊、李金琦、刘珊珊、于洪瑶、郭艳玲

二、检测内容

1、无组织废气

- (1) 检测点位: 肇2转油站厂界上下风向1#-4#、10#平台井场厂界上下风向1#-4#, 共计8个点位;

检测项目: 非甲烷总烃;

检测频次: 检测2天, 3次/天。

- (2) 检测点位: 肇2转油站厂区内加热炉处;

检测项目: 非甲烷总烃;

检测频次: 检测2天, 3次/天(1小时均值)。

2、环境空气

检测点位: 小场子屯;

检测项目: 非甲烷总烃;

检测频次: 检测2天, 4次/天。

3、土壤

- (1) 检测点位: 10#平台井场永久占地内;

检测项目: pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、三氯甲烷、四氯化碳、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、二苯并(ah)蒽、

蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘、石油烃(C₁₀-C₄₀)、石油类;

检测频次: 检测 1 天, 1 次/天。

- (2) 检测点位: 10#平台井场永久占地外 10m、10#平台井场永久占地外 20m、10#平台井场永久占地外 30m、10#平台井场永久占地外 50m、10#平台集油掺水管道临时占地外 30m、肇 2-1 集油阀组间至肇 2 转油站间总掺水管线临时占地外 30m, 共计 6 个点位;

检测项目: pH 值、石油烃(C₁₀-C₄₀)、石油类;

检测频次: 检测 1 天, 1 次/天。

- (3) 检测点位: 10#平台永久占地北侧 300m 耕地、8#平台永久占地南侧 300m 草地、10#平台集油掺水管道临时占地、肇 2-1 集油阀组间至肇 2 转油站间总掺水管线临时占地, 共计 4 个点位;

检测项目: pH 值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、石油烃(C₁₀-C₄₀)、石油类;

检测频次: 检测 1 天, 1 次/天。

- (4) 检测点位: 8#平台永久占地内;

检测项目: pH 值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃(C₁₀-C₄₀)、石油类;

检测频次: 检测 1 天, 1 次/天。

4、包气带

检测点位: 10#平台永久占地内(0-20cm)、10#平台永久占地内(20-40cm)、10#平台永久占地北侧 300m 耕地(0-20cm)、10#平台永久占地北侧 300m 耕地(20-40cm)、8#平台永久占地内(0-20cm)、8#平台永久占地内(20-40cm)、8#平台永久占地南侧 300m 草地(0-20cm)、8#平台永久占地南侧 300m 草地, 共计 8 个点位;

检测项目: pH 值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、六价铬、石油类、挥发酚;

检测频次: 检测 1 天, 1 次/天。

5、地下水

检测点位: 上游监测井(依托张辉屯水井)、区块内监测井(依托温家屯水井)、下游监测井(依托乐园良种场三分场水井)、代家村水井、李洪林村水井、东太平山水井, 共计 6 个点位;

检测项目: pH 值、钙和镁总量(总硬度)、溶解性总固体、氯化物(Cl⁻)、亚硝酸盐(NO₂⁻)、硝酸盐(NO₃⁻)、硫酸盐(SO₄²⁻)、铁、

锰、挥发酚、高锰酸盐指数(耗氧量)、氨氮、铅、汞、砷、镉、六价铬、氟化物、氰化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、钾、钠、钙、镁、碱度(HCO_3^- 、 CO_3^{2-})、硫化物、钡;

检测频次: 检测 2 天, 2 次/天。

三、质量保证

为保证本次检测分析数据的准确性、科学性,本次检测采取了相关质控措施,合格率为 100%。分析中所使用的各类器皿及仪器,均经国家认可的计量检定部门检定,且检定合格。

四、检测项目、分析方法及分析仪器

检测项目、分析方法及分析仪器信息见表 1。

表 1 检测项目、分析方法及分析仪器信息

类别	检测项目	分析方法名称及方法标准号	分析仪器、型号及编号
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 GC9600 JRD-019
环境空气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 GC9600 JRD-019
土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	精密酸度计 pHS-2F JRD-006
	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分: 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	原子荧光光度计 RGF-6800 JRD-015
	铅、镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	铜、镍、锌	土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法 NY/T 1613-2008	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分: 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	原子荧光光度计 RGF-6800 JRD-015
	三氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025

氯甲烷	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
顺式-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
反式-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,1,1,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,1,2,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,1,1-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,1,2-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025

苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
邻-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
间,对-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
苯胺	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
2-氯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
苯并(a)蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
苯并(a)芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
苯并(b)荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
苯并(k)荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025

	二苯并 (ah) 蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	蒽、萘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	茚并 (1,2,3-cd) 芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890A-5975C JRD-025
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪 8860 JRD-140
	铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镉、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	石油类	土壤 石油类的测定 红外分光光度法 HJ 1051-2019	红外分光测油仪 OIL450 JRD-018
包气带	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	精密酸度计 pHS-2F JRD-006
	汞、砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 RGF-6800 JRD-015
	铅、镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	铜、锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 第一部分直接法	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-89	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL450 JRD-018
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光 光度法 (方法 1 萃取分光光度法) HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 pHB-4 JRD-056

钙和镁总量 (总硬度)	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB 7477-87	滴定管 25mL
溶解性总固 体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官 性状和物理指标 (11.1 溶解性总固体 称 量法) GB/T 5750.4-2023	电子天平 FA2004 JRD-145
氯化物(Cl ⁻)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定离子色 谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-8618 JRD-016
亚硝酸盐 (NO ₂ ⁻)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定离子色 谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-8618 JRD-016
硝酸盐 (NO ₃ ⁻)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定离子色 谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-8618 JRD-016
硫酸物 (SO ₄ ²⁻)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定离子色 谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-8618 JRD-016
铁、锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-89	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光 光度法 (方法 1 萃取分光光度法) HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
高锰酸盐指 数(耗氧量)	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-89	滴定管 25mL
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
汞、砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 RGF-6800 JRD-015
铅、镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 第二部分整合萃取法	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-87	离子计 PXSJ-270F JRD-149
氰化物	氰化物的测定 容量法和分光光度法 (方法 2 异烟酸-吡啶啉分光光度法) HJ 484-2009	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
总大肠 菌群	总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测 分析方法》(第四版) 国家环境保护总 局 (2002 年)	电热恒温培养箱 DHP-360 型 JRD-003

细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018	电热恒温培养箱 DHP-360 型 JRD-003
石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 (试行) HJ 970-2018	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
钾、钠	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-89	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
钙、镁	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-89	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
碱度(CO ₃ ²⁻ 、 HCO ₃ ⁻)	碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分 析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002 年)	滴定管 25mL
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 752 JRD-017
钡	水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 603-2011	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128

五、检测结果

检测结果见表 2—表 7。

表 2 无组织废气检测结果表

采样日期	检测项目	检测结果			
		10#平台井场厂 界上风向 1#	10#平台井场厂 界下风向 2#	10#平台井场厂 界下风向 3#	10#平台井场厂 界下风向 4#
2024.08.14	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.62	0.73	0.75	0.74
		0.61	0.76	0.79	0.79
		0.63	0.78	0.81	0.71
采样日期	检测项目	检测结果			
		10#平台井场厂 界上风向 1#	10#平台井场厂 界下风向 2#	10#平台井场厂 界下风向 3#	10#平台井场厂 界下风向 4#
2024.08.15	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.66	0.81	0.84	0.78
		0.65	0.73	0.85	0.77
		0.64	0.75	0.83	0.75

表 3 环境空气检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			
2024.08.14	小场子屯	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.63	0.67	0.64	0.65
2024.08.15	小场子屯		0.61	0.64	0.68	0.74

表 4 土壤检测结果表

采样日期	检测项目	单位	检测结果
			10#平台井场永久占地内
2024.08.14	pH 值	无量纲	8.23
	砷	mg/kg	3.43
	镉	mg/kg	1.80
	六价铬	mg/kg	未检出
	铜	mg/kg	17.3
	铅	mg/kg	19.3
	汞	mg/kg	0.247
	镍	mg/kg	18.2
	三氯甲烷	μg/kg	未检出
	四氯化碳	μg/kg	未检出
	氯甲烷	μg/Kg	未检出
	1,1-二氯乙烷	μg/kg	未检出
	1,2-二氯乙烷	μg/kg	未检出
	1,1-二氯乙烯	μg/kg	未检出
	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	未检出
	反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	未检出
	二氯甲烷	μg/kg	未检出
1,2-二氯丙烷	μg/kg	未检出	

1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	未检出
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	未检出
四氯乙烯	μg/kg	未检出
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	未检出
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	未检出
三氯乙烯	μg/kg	未检出
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	未检出
氯乙烯	μg/kg	未检出
苯	μg/kg	未检出
氯苯	μg/kg	未检出
1,2-二氯苯	μg/kg	未检出
1,4-二氯苯	μg/kg	未检出
乙苯	μg/kg	未检出
苯乙烯	μg/kg	未检出
甲苯	μg/kg	未检出
间, 对-二甲苯	μg/kg	未检出
邻-二甲苯	μg/kg	未检出
硝基苯	mg/kg	未检出
苯胺	mg/kg	未检出
2-氯酚	mg/kg	未检出
苯并(a)蒽	mg/kg	未检出
苯并(a)芘	mg/kg	未检出
苯并(b)荧蒽	mg/kg	未检出
苯并(k)荧蒽	mg/kg	未检出

	二苯并 (ah) 蒽	mg/kg	未检出			
	蒾	mg/kg	未检出			
	茚并(1,2,3-cd) 芘	mg/kg	未检出			
	苯	mg/kg	未检出			
	石油类	mg/kg	33.1			
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	106			
采样日期	检测项目	单位	检测结果			
			10#平台井场永久占地外 10m	10#平台井场永久占地外 20m	10#平台井场永久占地外 30m	10#平台井场永久占地外 50m
2024.08.14	pH 值	无量纲	8.24	8.41	8.03	8.11
	石油类	mg/kg	143	100	90.5	59.0
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	161	64	24	17
采样日期	检测项目	单位	检测结果			
			10#平台集油掺水管道临时占地外 30m	肇 2-1 集油阀组间至肇 2 转油站间总掺水管线临时占地外 30m		
2024.08.14	pH 值	无量纲	8.12		7.86	
	石油类	mg/kg	105		115	
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	17		157	
采样日期	检测项目	单位	检测结果			
			8#平台永久占地内	10#平台永久占地北侧 300m 耕地	8#平台永久占地南侧 300m 草地	10#平台集油掺水管道临时占地
2024.08.14	pH 值	无量纲	8.20	7.81	7.73	7.90
	砷	mg/kg	2.96	3.25	3.19	3.91
	镉	mg/kg	1.58	0.15	0.20	0.24

	铬	mg/kg	/	36	39	37
	铜	mg/kg	18.3	18.7	18.7	17.6
	铅	mg/kg	19.1	17.6	20.3	18.3
	汞	mg/kg	0.228	0.247	0.183	0.131
	镍	mg/kg	17.5	18.2	17.5	19.0
	锌	mg/kg	/	22.5	21.5	20.8
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	97	23	21	6L
	石油类	mg/kg	32.8	28.1	58.3	165
采样日期	检测项目	单位	检测结果			
			肇 2-1 集油阀组间至肇 2 转油站间总掺水管线临时占地			
2024.08.14	pH 值	无量纲	7.93			
	砷	mg/kg	3.61			
	镉	mg/kg	0.20			
	铬	mg/kg	36			
	铜	mg/kg	17.6			
	铅	mg/kg	20.4			
	汞	mg/kg	0.209			
	镍	mg/kg	19.0			
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	17			
	石油类	mg/kg	330			
	锌	mg/kg	24.5			

注: 1、当测定结果在检出限以上时, 报实际测定结果值;

2、当测定结果低于检出限时, 报“未检出”。

表 5 包气带检测结果表

采样时间	检测项目	单位	检测结果			
			10#平台永久占地内	10#平台永久占地内	10#平台永久占地北侧	10#平台永久占地北侧

			(0-20cm)	(20-40cm)	300m 耕地 (0-20cm)	300m 耕地 (20-40cm)
2024. 08.14	pH 值	无量纲	7.3	7.6	7.6	7.5
	砷	($\mu\text{g/L}$)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
	镉	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	铬	(mg/L)	0.16	0.16	0.16	0.19
	铜	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	铅	(mg/L)	5.3	5.3	5.2	5.3
	汞	($\mu\text{g/L}$)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
	镍	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	锌	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	六价铬	(mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
	石油类	(mg/L)	0.19	0.16	0.17	0.14
	挥发酚	(mg/L)	0.0048	0.0028	0.0043	0.0023
采样 时间	检测项 目	单位	检测结果			
			8#平台永久 占地内 (0-20cm)	8#平台永久 占地内 (20-40cm)	8#平台永久 占地南侧 300m 草地 (0-20cm)	8#平台永久 占地南侧 300m 草地 (20-40cm)
2024. 08.14	pH 值	无量纲	7.6	7.5	7.4	7.4
	砷	($\mu\text{g/L}$)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
	镉	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	铬	(mg/L)	0.19	0.16	0.13	0.13
	铜	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	铅	(mg/L)	5.6	4.6	4.9	5.1
	汞	($\mu\text{g/L}$)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
	镍	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

锌	(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
六价铬	(mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
石油类	(mg/L)	0.24	0.22	0.17	0.18
挥发酚	(mg/L)	0.0016	0.0025	0.0018	0.0029

注: 1、当测定结果在检出限以上时, 报实际测定结果值;
 2、当测定结果低于检出限时, 报所用方法的检出限值, 并加标志“L”。

表 6 地下水检测结果表

采样日期	检测项目	检测结果					
		上游监测井(依托张辉屯水井)		区内监测井(依托温家屯水井)		下游监测井(依托乐园良种场三分场水井)	
		DX24081 4Y0101	DX24081 4Y0102	DX24081 4Y0103	DX24081 4Y0104	DX24081 4Y0105	DX24081 4Y0106
2024.08.14	pH 值 (无量纲)	7.4	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2
	钙和镁总量 (总硬度,mg/L)	320	316	304	310	322	318
	溶解性总固体 (mg/L)	495	487	479	463	511	474
	氯化物 (Cl ⁻ , mg/L)	4.58	4.60	6.39	6.37	6.31	6.47
	亚硝酸盐 (NO ₂ ⁻ , mg/L)	0.308	0.296	0.447	0.419	0.508	0.443
	硝酸盐 (NO ₃ ⁻ , mg/L)	3.69	3.95	1.62	1.65	1.33	1.73
	硫酸盐 (SO ₄ ²⁻ , mg/L)	10.7	10.8	2.22	2.10	2.28	2.02
	铁 (mg/L)	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L
	锰 (mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
	挥发酚 (mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
	高锰酸盐指数 (耗氧量, mg/L)	1.4	1.6	1.8	2.0	1.9	2.3
	氨氮 (mg/L)	0.235	0.230	0.248	0.251	0.288	0.291
	铅 (μg/L)	10L	10L	10L	10L	10L	10L
	汞 (μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L

	砷 (µg/L)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
	镉 (µg/L)	1L	1L	1L	1L	1L	1L
	六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
	氟化物 (mg/L)	0.44	0.42	0.65	0.62	0.62	0.67
	氰化物 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
	总大肠菌群 (MPN/L)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
	细菌总数 (CFU/ml)	40	60	50	70	80	60
	石油类 (mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
	钾 (mg/L)	1.13	1.19	1.13	1.13	1.33	1.56
	钠 (mg/L)	30.0	26.4	29.9	38.5	35.1	26.0
	钙 (mg/L)	42.7	41.6	43.9	44.7	44.1	45.8
	镁 (mg/L)	14.2	15.3	16.5	16.4	13.4	15.3
	碱度 (CO ₃ ²⁻ , mg/L)	0	0	0	0	0	0
	碱度 (HCO ₃ ⁻ , mg/L)	464	414	406	420	467	460
	硫化物 (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
	钡 (mg/L)	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L
采样日期	检测项目	检测结果					
		代家村水井		李洪林村水井		东太平山水井	
		DX240814Y0107	DX240814Y0108	DX240814Y0109	DX240814Y0110	DX240814Y0111	DX240814Y0112
2024.08.14	pH 值 (无量纲)	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.4
	钙和镁总量 (总硬度,mg/L)	300	312	304	308	310	315
	溶解性总固体 (mg/L)	453	472	469	481	477	492
	氯化物 (Cl ⁻ , mg/L)	4.57	4.47	4.99	5.20	6.37	6.40
	亚硝酸盐 (NO ₂ ⁻ , mg/L)	0.418	0.305	0.407	0.339	0.423	0.437

硝酸盐 (NO ₃ ⁻ , mg/L)	1.17	1.17	1.11	1.26	1.36	1.55
硫酸盐 (SO ₄ ²⁻ , mg/L)	11.3	11.5	8.83	9.05	6.61	6.66
铁 (mg/L)	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L
锰 (mg/L)	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06
挥发酚 (mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
高锰酸盐指数 (耗氧量, mg/L)	1.8	2.1	2.0	1.9	2.2	2.1
氨氮 (mg/L)	0.360	0.363	0.342	0.344	0.419	0.416
铅 (μg/L)	10L	10L	10L	10L	10L	10L
汞 (μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
砷 (μg/L)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
镉 (μg/L)	1L	1L	1L	1L	1L	1L
六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
氟化物 (mg/L)	0.28	0.34	0.49	0.52	0.66	0.65
氰化物 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
总大肠菌群 (MPN/L)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
细菌总数 (CFU/ml)	70	60	80	70	70	60
石油类 (mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
钾 (mg/L)	1.15	1.12	1.14	1.14	1.14	1.12
钠 (mg/L)	27.1	28.9	30.6	35.6	32.6	30.0
钙 (mg/L)	45.0	43.9	45.8	41.3	41.6	45.6
镁 (mg/L)	16.4	16.3	15.4	16.3	15.3	15.3
碱度 (CO ₃ ²⁻ , mg/L)	0	0	0	0	0	0
碱度 (HCO ₃ ⁻ , mg/L)	406	409	419	422	432	425
硫化物 (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L

	钡 (mg/L)	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L
采样日期	检测项目	检测结果					
		上游监测井(依托张辉屯水井)		区内监测井(依托温家屯水井)		下游监测井(依托乐园良种场三分场水井)	
		DX240815Y0101	DX240815Y0102	DX240815Y0103	DX240815Y0104	DX240815Y0105	DX240815Y0106
2024.08.15	pH值 (无量纲)	7.2	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4
	钙和镁总量 (总硬度,mg/L)	314	322	303	314	324	318
	溶解性总固体 (mg/L)	479	491	503	485	471	463
	氯化物(Cl ⁻) (mg/L)	4.65	4.66	6.44	6.48	6.47	6.44
	亚硝酸盐(NO ₂ ⁻) (mg/L)	0.270	0.290	0.424	0.402	0.479	0.435
	硝酸盐(NO ₃ ⁻) (mg/L)	4.07	4.04	1.56	1.44	1.55	1.53
	硫酸盐(SO ₄ ²⁻) (mg/L)	11.0	11.1	2.03	2.02	2.13	2.02
	铁(mg/L)	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L
	锰(mg/L)	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06
	挥发酚(mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
	高锰酸盐指数 (耗氧量, mg/L)	1.5	1.7	1.8	2.3	1.6	1.8
	氨氮(mg/L)	0.243	0.240	0.267	0.264	0.294	0.296
	铅(μg/L)	10L	10L	10L	10L	10L	10L
	汞(μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
	砷(μg/L)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
	镉(μg/L)	1L	1L	1L	1L	1L	1L
	六价铬(mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
	氟化物(mg/L)	0.44	0.45	0.66	0.69	0.64	0.66
	氰化物(mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
	总大肠菌群	<3	<3	<3	<3	<3	<3

	(MPN/L)						
	细菌总数 (CFU/ml)	50	80	60	60	70	70
	石油类 (mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
	钾 (mg/L)	1.23	1.27	1.28	1.41	1.14	1.18
	钠 (mg/L)	31.4	33.4	33.2	32.2	38.2	31.0
	钙 (mg/L)	42.7	42.5	43.3	42.7	46.7	41.3
	镁 (mg/L)	14.7	15.1	13.4	13.8	15.1	16.1
	碱度 (CO ₃ ²⁻) (mg/L)	0	0	0	0	0	0
	碱度 (HCO ₃ ⁻) (mg/L)	400	418	438	429	411	409
	硫化物 (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
	钡 (mg/L)	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L
采样日期	检测项目	检测结果					
		代家村水井		李洪林村水井		东太平山水井	
		DX24081 5Y0107	DX24081 5Y0108	DX24081 5Y0109	DX24081 5Y0110	DX24081 5Y0111	DX24081 5Y0112
2024.08.15	pH 值 (无量纲)	7.1	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3
	钙和镁总量 (总硬度,mg/L)	330	328	310	305	309	311
	溶解性总固体 (mg/L)	454	475	499	483	508	484
	氯化物(Cl ⁻) (mg/L)	4.34	4.37	5.24	5.08	6.47	6.25
	亚硝酸盐 (NO ₂ ⁻) (mg/L)	0.291	0.251	0.372	0.371	0.487	0.392
	硝酸盐 (NO ₃ ⁻) (mg/L)	1.03	1.03	1.44	1.23	1.34	1.33
	硫酸盐 (SO ₄ ²⁻) (mg/L)	11.1	11.3	9.16	8.79	6.60	5.94
	铁 (mg/L)	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L
	锰 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06
	挥发酚 (mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L

高锰酸盐指数 (耗氧量, mg/L)	2.0	2.2	2.1	2.4	2.3	2.1
氨氮 (mg/L)	0.360	0.358	0.350	0.352	0.395	0.398
铅 (µg/L)	10L	10L	10L	10L	10L	10L
汞 (µg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
砷 (µg/L)	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
镉 (µg/L)	1L	1L	1L	1L	1L	1L
六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
氟化物 (mg/L)	0.44	0.45	0.51	0.51	0.63	0.60
氰化物 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
总大肠菌群 (MPN/L)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
细菌总数 (CFU/ml)	80	70	70	80	60	70
石油类 (mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
钾 (mg/L)	1.12	1.21	1.34	1.43	1.51	1.22
钠 (mg/L)	25.8	29.4	29.1	29.2	29.6	26.9
钙 (mg/L)	43.3	42.5	45.6	42.7	42.5	42.7
镁 (mg/L)	13.9	14.0	14.4	14.7	14.7	14.8
碱度 (CO ₃ ²⁻) (mg/L)	0	0	0	0	0	0
碱度 (HCO ₃ ⁻) (mg/L)	418	422	409	416	450	448
硫化物 (mg/L)	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
钡 (mg/L)	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L

注: 1、当测定结果在检出限以上时, 报实际测定结果值;
2、当测定结果低于检出限时, 报所用方法的检出限值, 并加标志“L”。

以下无正文

报告编写人: 郑文傲
审核人: 宋嘉明
授权签字人: 宋嘉明
签发日期: 2024年 12月 30日





报告编号: JRD-BG-202409130



检测报告

报告名称 : 2023 年芳 481-州 17 区块加密与注采系统
调整产能建设工程项目检测报告

委托单位 : 大庆模范屯油田有限责任公司

检测类别 : 委托检测

样品类型 : 噪声

黑龙江省吉瑞达检测科技有限公司



说 明

- 1、本报告未加盖本公司检测报告专用章、骑缝章、资质认证章及无本公司防伪标识视为无效。
- 2、本报告无审核人及授权签字人签字无效，涂改、增删、部分复印无效。
- 3、委托检测结果仅对当时工况及环境状况负责，委托单位自行送样仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。
- 4、本报告未经同意不得用于商业宣传。
- 5、对本报告如有异议，请于收到报告之日起十日内向本公司查询，来函来电请注明报告编号，逾期不予受理。

黑龙江省吉瑞达检测科技有限公司
地址：黑龙江省大庆市高新区安萨路 9-1
邮政编码：163000
联系电话：13836766965
联系人：宋喜晶

一、检测信息

委托方: 大庆模范屯油田有限责任公司	
受检单位: 大庆模范屯油田有限责任公司	
地址: 大庆市肇州县	
联系人: 牛磊	联系电话: 18745901333
采样时间: 2024年09月26-27日	采样人员: 王德庆、李宇健
样品状态: /	分析地点: /
样品分析时间: 2024年09月26-30日	分析人员: 王德庆、李宇健

二、检测内容

1、 噪声

检测点位: 1#平台井场厂界外 1m、1#平台井场厂界外 10m、1#平台井场厂界外 20m、1#平台井场厂界外 30m, 肇4转油站厂界四周 1m处、肇5转油站厂界四周 1m处、肇6转油站厂界四周 1m处、肇一联合站厂界四周 1m处、宋二联合站厂界四周 1m处、赵文化、小场子, 共计 26 个点位;

检测项目: 厂界噪声、环境噪声;

检测频次: 检测 2 天, 昼夜检测各 1 次。

三、检测项目、分析方法及分析仪器

检测项目、分析方法及分析仪器信息见表 1。

表 1 检测项目、分析方法及分析仪器信息

类别	检测项目	分析方法名称及方法标准号	分析仪器、型号及编号
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688 JRD-169 多功能声级计 AWA5688 JRD-168
	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	多功能声级计 AWA5688 JRD-169 多功能声级计 AWA5688 JRD-168

四、检测结果

检测结果见表 2。

表 2 噪声检测结果表

单位: dB (A)

检测点位	检测结果							
	2024.09.26				2024.09.27			
	时间	测量值	时间	测量值	时间	测量值	时间	测量值
1#平台井场厂界外 1m	08:33	57	22:05	45	08:26	57	22:08	46
1#平台井场厂界外 10m	08:37	56	22:09	44	08:29	56	22:11	45
1#平台井场厂界外 20m	08:38	54	22:13	44	08:33	55	22:17	44
1#平台井场厂界外 30m	08:42	53	22:17	42	08:36	53	22:20	43
肇 4 转油站厂界东侧外 1m	09:16	56	23:17	43	09:07	57	23:09	44
肇 4 转油站厂界南侧外 1m	09:20	56	23:23	45	09:12	57	23:13	44
肇 4 转油站厂界西侧外 1m	09:25	56	23:27	45	09:18	56	23:17	45
肇 4 转油站厂界北侧外 1m	09:33	57	23:32	45	09:25	57	23:22	43
肇 5 转油站厂界东侧外 1m	10:26	57	00:31	45	10:19	57	00:17	44
肇 5 转油站厂界南侧外 1m	10:31	56	00:35	45	10:22	57	00:23	43
肇 5 转油站厂界西侧外 1m	10:37	57	00:40	45	10:27	58	00:29	44
肇 5 转油站厂界北侧外 1m	10:44	56	00:44	46	10:32	58	00:34	45
肇 6 转油站厂界东侧外 1m	08:41	58	22:03	45	08:37	58	22:01	45
肇 6 转油站厂界南侧外 1m	08:47	57	22:09	45	08:41	57	22:05	45
肇 6 转油站厂界西侧外 1m	08:52	57	22:13	45	08:47	57	22:09	45
肇 6 转油站厂界北侧外 1m	08:59	58	22:18	44	08:53	58	22:14	44

肇一联合站厂界东侧外 1m	09:39	57	22:41	43	09:36	57	22:38	44
肇一联合站厂界南侧外 1m	09:44	57	22:47	43	09:41	57	22:43	43
肇一联合站厂界西侧外 1m	09:48	56	22:52	45	09:46	56	22:49	44
肇一联合站厂界北侧外 1m	09:55	56	22:57	45	09:51	57	22:55	45
宋二联合站厂界东侧外 1m	10:26	56	23:23	43	10:20	56	23:21	44
宋二联合站厂界南侧外 1m	10:30	57	23:27	43	10:24	56	23:26	44
宋二联合站厂界西侧外 1m	10:37	58	23:32	46	10:29	57	23:30	46
宋二联合站厂界北侧外 1m	10:42	56	23:36	44	10:35	57	23:35	45
赵文化	11:07	52	00:09	42	11:02	53	00:10	40
小场子	11:41	51	00:42	43	11:29	51	00:34	42

以下无正文

报告编写人: 郑天依
 审核人: 宋家刚
 授权签字人: 宋家刚
 签发日期: 2024年12月30日





报告编号: JRD-BG-202409139



检测报告

报告名称 : 2023 年州 20 区块葡萄花油层产能建设工程
(合作) 项目检测报告

委托单位 : 大庆模范屯油田有限责任公司

检测类别 : 委托检测

样品类型 : 噪声

黑龙江省吉瑞达检测科技有限公司



说 明

- 1、本报告未加盖本公司检测报告专用章、骑缝章、资质认证章及无本公司防伪标识视为无效。
- 2、本报告无审核人及授权签字人签字无效，涂改、增删、部分复印无效。
- 3、委托检测结果仅对当时工况及环境状况负责，委托单位自行送样仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。
- 4、本报告未经同意不得用于商业宣传。
- 5、对本报告如有异议，请于收到报告之日起十日内向本公司查询，来函来电请注明报告编号，逾期不予受理。

黑龙江省吉瑞达检测科技有限公司

地址：黑龙江省大庆市高新区安萨路 9-1

邮政编码：163000

联系电话：13836766965

联系人：宋喜晶

一、检测信息

委托方: 大庆模範屯油田有限责任公司	
受检单位: 大庆模範屯油田有限责任公司	
地址: 大庆市肇州县	
联系人: 牛磊	联系电话: 18745901333
采样时间: 2024年09月20-21日	采样人员: 张国宇、黄志强
样品状态: /	分析地点: /
样品分析时间: 2024年09月21-25日	分析人员: 张国宇

二、检测内容

1、 噪声

检测点位: 10#平台井场厂界外 1m、10#平台井场厂界外 10m、10#平台井场厂界外 20m、10#平台井场厂界外 30m、太平岭村、东太平山村、三新村, 共计 7 个点位;

检测项目: 厂界噪声、环境噪声;

检测频次: 检测 2 天, 昼夜检测各 1 次。

三、检测项目、分析方法及分析仪器

检测项目、分析方法及分析仪器信息见表 1。

表 1 检测项目、分析方法及分析仪器信息

类别	检测项目	分析方法名称及方法标准号	分析仪器、型号及编号
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688 JRD-169
	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	多功能声级计 AWA5688 JRD-169

四、检测结果

检测结果见表 2。

表 2 噪声检测结果表

单位: dB (A)

检测点位	检测结果
------	------

	2024.09.20				2024.09.21			
	时间	测量值	时间	测量值	时间	测量值	时间	测量值
10#平台井场厂界外1m	07:13	58	22:02	49	07:05	59	22:04	48
10#平台井场厂界外10m	07:18	56	22:07	48	07:11	56	22:08	47
10#平台井场厂界外20m	07:23	53	22:12	45	07:17	54	22:13	46
10#平台井场厂界外30m	07:29	51	22:17	44	07:22	53	22:18	44
太平岭村	08:03	52	22:32	41	08:12	51	22:35	40
东太平山村	08:45	51	22:58	40	08:56	52	23:02	41
三新村	09:33	50	23:19	41	09:42	51	23:22	42

以下无正文

报告编写人: 郑文欣
 审核人: 宋岩刚
 授权签字人: 宋岩刚
 签发日期: 2024年12月30日



附件 3：含油污泥与废防渗布处理合同



报审序号：2024-9296

合同编号：DQYT-0508003-2024-CL-2278

固体废物处置合同
2024 年八厂含油污泥无害化处理

大庆油田有限责任公司
与
大庆市庆兴环保科技有限公司

2024 年 7 月 | 日签署



目 录

1. 固体废物处置的内容、标准和方式.....	2
2. 固体废物处置的期限、地点.....	3
3. 固体废物的接收、运输和处置.....	4
4. 费用及支付.....	10
5. 权利和义务.....	14
6. 健康、安全生产及环境保护.....	16
7. 保密.....	16
8. 诚信合规.....	17
9. 不可抗力.....	18
10. 违约责任.....	19
11. 合同解除.....	21
12. 通知.....	22
13. 法律适用及争议解决.....	23
14. 合同效力及其他约定.....	24
附件一.....	27
附件二.....	43



本固体废物处置合同（“本合同”）由以下双方在第八采油厂签订。

委托方（简称“甲方”）：大庆油田有限责任公司
住所：黑龙江省大庆市让胡路区龙南
企业（法人）统一社会信用代码：91230607716675409L
法定代表（负责）人：朱国文

受托方（简称“乙方”）：大庆市庆兴环保科技有限公司
住所：黑龙江省大庆市肇源县大兴乡联结村
企业（法人）统一社会信用代码：91230622MA1C207T2Q
法定代表（负责）人：郑玉峰

甲方和乙方以下合称“双方”，单称“一方”。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律法规的规定，本着自愿、平等、公平和诚实信用的原则，双方就本合同项下固体废物处置事宜，协商一致，签订本合同。

1. 固体废物处置的内容、标准和方式

乙方应根据甲方的委托，按照本条约定的内容、标准和方式处置有关固体废物。

1.1 处置内容：

待处置固体废物名称：含油污泥；

暂估固体废物数量：8000 吨；

该数量为暂估数量，实际处置量应按照本合同第 3.3.2 条确定。

1.2 处置标准

1.2.1 乙方处置本合同项下的固体废物，应遵循以下标准：

1.2.1.1 含油污泥交付后，乙方应按 DB23/T3104-2022《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》标准等有关技术规范及标准制定处置方案和相应措施进行妥善处置，禁止二次拉运处理，发生私自处置、掩埋、倒卖、安全事故、环境污染事件或受到政府监管部门处罚的，由乙方承担全部责任；

1.2.1.2 乙方确保含油污泥处理后渣土的石油类 $\leq 0.3\%$ 的要求，完工后由甲方验收。

1.2.1.3 乙方应具备存放含油污泥处理后产生的油、水、渣暂存设施并建立完善的含油污泥处理台账以及跟踪记录，确保处理后油、水、渣去向合规，保证数据真实有效和可追溯性。

1.2.1.4 乙方不得将处理后的油、水、渣非法转卖，产生的油、水需运输至甲方指定地点，由甲方负责运输。原油数量按照运送前对含油污泥检测的含油量计算；

1.2.1.5 该项服务价格为全成本价格，所产生的各类油（或含油污水）归油田所有。



1.2.2 如果第 1.2.1 条约定标准在本合同有效期内发生修订、废止、替代等情形，或出现新的应当适用于本合同固体废物处置工作的标准，则乙方应执行最新适用的标准；若各标准之间就同一事项要求不一致，则应执行技术要求最高的标准。

1.3 处置方式热裂解处置。

2. 固体废物处置的期限、地点

2.1 处置期限：自 2024 年 7 月 1 日 开始至 2024 年 12 月 31 日止。

2.2 处置地点：大庆市肇源县大兴乡联结村东侧 3 公里处。

3. 固体废物的接收、运输和处置

3.1 固体废物的接收

3.1.1 在合同有效期内，甲方有权在任何时间向乙方发出书面通知，要求乙方接收待处置固体废物（危险废物转移联单）。危险废物转移联单应当载明必要的信息以便乙方进行接收，这些信息包括：

- (1) 待处置固体废物的名称；
- (2) 待处置固体废物的数量/质量/体积；
- (3) 待处置固体废物的物理形态；
- (4) 待处置固体废物的包装或容器情况；
- (5) 待处置危险废物的名录代码；
- (6) 本次接收事宜的甲方经办人信息；
- (7) 其他：/。

3.1.2 乙方应当在收到危险废物转移联单后 1 日内对需接收内容予以确认，并以书面形式告知甲方其派车接收的相关信息，包括：

- (1) 人员信息，包括人员数量、人员名称、人员联系方式等；
- (2) 车辆信息，包括出车时间、到达时间、出车数量、车辆种类、车辆载重、使用年限、车牌号等；
- (3) 委托第三方运输的，还应包括受托的第三方运输单位的名称、运输资质等。

3.1.3 如乙方对需接收内容有异议的，就无异议部分，乙方应当按照本条约定进行接收；就有异议部分，乙方应在第 3.1.2 条约定的期限内书面通知甲方，双方就就有异议部分及时协商、共同确认。

3.1.4 除非双方另有约定，乙方应当在完成第 3.1.2 条约定的书面确认后 1 日内完成接收。

3.1.5 乙方应在含油污泥暂存池或危险废物转移联单中另行指定的地点接收待处置固体废物。

3.1.6 甲方负责待处置固体废物在接收地点的过磅计量工作（“出场过磅”），乙方应根据甲方的要求提供协助。过磅单/装运单/或确认装车情况的其他单证和危险废物转移联单应当依据出场过磅结果填写，但双方另行协商确定的除外。

3.1.7 如出场过磅结果与双方根据第 3.1.2 条和/或第 3.1.3 条确认的结果有差异的，应当以出场过磅结果为准，但双方另行协商确定的除外。

3.1.8 如甲方交付的待处置固体废物不符合本合同约定的，由乙方就不符合约定部分重新提出报价方案交甲方。如双方对新报价方案协商达成一致的，由乙方按照协商结果处置；如无法协商一致的，乙方应当将已由乙方接收的待处置固体废物退回甲方，退回费用由甲方承担。

3.2 固体废物的运输

本合同项下待处置废物的运输责任执行 3.2.2 条规定。

3.2.1 本合同项下待处置废物由乙方安排运输。

(1) 运输方式为道路运输/水路运输/铁路运输/其他方。乙方可以自行运或也可以委托具有相应运输资质的第三方运输企业代其运输。委托第三方运输企业运输的，乙方应自行承担运费，且应确保并促使其委托的第三方运输企业遵守本第 3.2.1 条的约定。



(2) 甲方应在接收地点将待处置固体废物交付给乙或其委托的第三方运输企业,乙方负责将待处置固体废物从接收地点运至处置地点,并负责卸车工作。

(3) 交付的时点为乙或其委托的第三方运输企业在接收地点开始装车之时,甲方有权派遣人员跟车。待处置固体废物交付前,任何与待处置固体废物(包括包装或容器)相关的环境、安全、健康义务和责任由甲方承担。待处置固体废物交付后,任何与待处置固体废物(包括包装或容器)相关的环境、安全、健康义务和责任由乙方承担。在装车、运输、卸车等活动中,乙或其委托的第三方运输企业应当严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《国内水路运输管理条例》、《船舶载运危险货物安全监督管理规定》、《铁路安全管理条例》、《铁路危险货物运输安全监督管理规定》等有关法律法规的规定,并承担装车、运输或卸车过程中发生的有关环保、安全、交通事故的责任。运输危险废物的,乙或其委托的第三方运输企业应当根据废物特性,采用符合相应标准的包装物、容器和运输工具。

(4) 乙或其委托的第三方运输企业应当在完成运输后1日内将待处置固体废物的运输情况书面告知甲方。

(5) 其他约定: /。

3.2.2 本合同项下待处置废物由甲方安排运输。

3.2.3 其他约定: /。

3.3 固体废物的处置

3.3.1 乙方应负责待处置固体废物在处置地点进行的过磅计量工作(“入库过磅”),甲方有权全过程参与监督。乙方在完成入库过磅后当日立刻向甲方提供书面计量结果,甲方有权派遣人员参与入库过磅。过磅单和危险废物转移联单应当依据出场过磅结果填写,但双方另行协商确定的除外。

3.3.2 乙方在本合同项下实际处置的固体废物的数量(“实际处置量”)为入库过磅结果所示数量;但是,如果入库过磅结果与出场过磅结果有差异的,除非双方另有约定,实际处置量应当按照如下第(3)种方式确定:

(1) 以出场过磅结果/双方根据第3.1.2条和/或第3.1.3条确认的结果为准。

(2) 以入库过磅结果为准。

(3) 如果过磅误差 $\leq 5\%$ (含)的,以计量结果较低者为准;如果过磅误差 $> 5\%$ (不含)的,乙方应当在入库过磅完成1日内通知甲方进行诚信协商,并以经双方协商后最终确认的结果为准。

(4) 其他: /。

3.3.3 对于需要以浓度或含量来计价的固体废物,以双方交接时在接收地点现场取样的浓度或含量为准,该样本送至双方认可、具有合格资质的机构进行检测。

3.3.4 乙方应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规以及本合同第1条约定的方式、标准妥善处置待处置固体废物;如本合同任何约定与运用的法律法规或国家/环境/行业标准不一致的,应当以较严格者为准。

3.3.5 乙方收集、贮存、运输、利用及处置固体废物过程中,应遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,并根据固体废物的成份和特性,严格依法按照环评批复处置,防止扬尘、流失、渗漏和其他污染,不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

3.3.6 乙方应当自行处置本合同项下待处置固体废物。乙方不得将未经处理的固体废物及其附属物直接转卖。

3.3.7 乙方应按照本合同第2条约定的地点和期限处置甲方交付的固体废物。

3.3.8 乙方应在完成处置后10日内以书面形式向甲方提供已妥善处置固体废物相关证明,包括处理后土渣的检测报告。甲方应在收到前述相关妥善处置固体废物的证明后30日内进行审核确认。



3.3.9 乙方完成处置后,甲方有权利要求对处置成果进行采样检测分析,乙方应当配合。检测分析结果不符合第1.2条约定的标准的,双方应按照第10.3条的约定处理。

3.3.10 乙方完成处置后,油、废水等处置产物全部由甲方回收。检测分析结果符合第1.2条约定的标准的渣土,按以下比例由甲乙双方回收,且按建设项目环境影响评价文件批复处置利用:甲方回收100%,乙方回收0%。

4. 费用及支付

4.1 本合同项下处置服务费采用以下第(2)种计价方式,在本合同履行期间,若国家税率政策发生变更调整的,本合同的执行税率也随之进行相应的调整。

(1) 固定总价

本合同不含税处置服务费为人民币大写:肆佰玖拾陆万贰仟捌佰捌拾元整(小写:4962880元);税率为1%;含税处置服务费为人民币大写伍佰陆拾万捌仟零伍拾肆元肆角人民币(小写:5608054.40元人民币)。本合同处置服务费包括乙方完成本合同所有工作内容所发生的全部费用。

(2) 固定单价

本合同不含税暂定处置服务费为人民币大写:肆佰玖拾陆万贰仟捌佰捌拾元整(小写:4962880元);税率为13%;含税暂定处置服务费为人民币大写伍佰陆拾万捌仟零伍拾肆元肆角人民币(小写:5608054.40元人民币)。合同单价为_____陆佰贰拾元叁角陆分(小写:620.36元)/吨(不含税),除另有约定外,固定单价在合同期内不予调整。

(3) 其他: /。

4.2 支付方式按照下列第(1)种方式执行:

(1) 一次性支付

乙方完成本合同项下全部固体废物的处置并提供第3.3.9条约定的相关证明且经甲方审核确认后60日内支付全部实际发生的含税处置服务费。

(2) 定期支付

(a) 每第1个月的第1日支付一笔处置服务费,支付金额相当于/总处置服务费的1%。

(b) 最后一个支付日为本合同终止之日;但如果本合同终止之日尚有进行中的处置的,则最后一个支付日为乙方完成该批次处置并提供第3.3.9条约定的相关证明之日。

(3) 按进度支付

(3.1) 进度支付计划: /;

(3.2) 最后一笔支付为/处置服务费的1%,在乙方完成全部固体废物处置并提供第3.3.9条约定的相关证明后/日内支付。

(4) 按批次支付

乙方完成单批次固体废物处置并按照第3.3.9条的约定提供了相关证明之后/日内支付该批次/处置服务费。

(5) 其他约定: /。

4.3 履约担保

本合同生效后____/____日内,乙方应按照如下第/种方式向甲方提供一份履约担保:

(1) 乙方提供一份履约保函。履约保函的金额相当于第4.1条约定的含税/不含税处置服务费的____/____%。履约保函的有效期限应至乙方完全履行本合同项下全部义务之日,履约保函格式见附件二。

(2) 乙方向甲方支付相当于第4.1条约定的含税/不含税处置服务费____/____%的履约保证金。如乙方发生违约的,甲方有权根据因乙方违约行为而造成的损害扣除履约保证金,作为乙方应支付的违约金或对甲方的损害赔偿。履约保证金的余额在乙方完全履行本合同项下全部义务后内由甲方无息返还给乙方。如履约保证金不足以弥补甲方损失的,乙方应继续赔偿。



4.4 乙方收款账户信息如下：

收款人：大庆市庆兴环保科技有限公司

开户行：黑龙江肇源农村商业银行股份有限公司大兴支行

账 号：550230122000012794

乙方应对上述账户信息的真实性、安全性、准确性负责。

4.5 每次付款前，乙方应提交符合甲方财务要求的增值税专用发票及经甲方确认的处置服务妥善完成的相关证明，否则甲方有权顺延付款，直至收到前述资料，且不承担违约责任。乙方开具发票所需甲方信息如下：

纳税人名称：大庆油田有限责任公司第八采油厂

税务登记号：230690X06336576

开户行名称：中国工商银行油田支行

开户行账号：0905060129221800808

税务登记地址：大庆市大同区高平村

财务电话 4512080

其他： /

甲方应对上述信息的真实性、安全性、准确性负责。

5. 权利和义务

5.1 甲方权利和义务

除本合同其他条款约定以外，甲方还具有如下权利和义务：

5.1.1 有权不时审查乙方提供本合同项下服务所需的经营资质和能力，包括但不限于固体废物经营资质、危险废物经营资质；

5.1.2 有权审查乙方或其委托的第三方运输企业的危险废物运输资质；

5.1.3 告知乙方固体废物危害特性及安全注意事项；

5.1.4 为乙方提供与履行合同有关的工作便利；

5.1.5 按约定向乙方支付处置服务费用；

5.1.6 其他：/。

5.2 乙方权利和义务

除本合同其他条款约定以外，乙方还具有如下权利和义务：

5.2.1 有权根据本合同约定收取处置服务费。

5.2.2 在本合同有效期内，就本合同项下待处置固体废物的收集、贮存、处置、利用等任何服务，乙方始终具备相应的经营资质、持有符合本合同服务内容的《营业执照》，涉及危险废物的，还应当具有相应危险废物经营资质、持有相应危险废物经营许可证；乙方或其委托的第三方负责危险废物运输的，应具有危险废物运输资质及能力，并不得超越其经营许可范围。

5.2.3 应当根据待处置固体废物特性制定处置方案、事故应急预案及防范措施，并落



落实到位。

5.2.4 应当将待处置固体废物危害特性及安全注意事项告知其相关人员，并提供必要的安全防护措施。

5.2.5 合同履行过程中应及时处理、协调与其他相关方之间的工作关系，并按规定处理相关手续。

5.2.6 在进入甲方厂区时，应遵守甲方相关管理规定，并确保派来的接收人员充分做好自我防护工作，接收人员进入甲方厂区后的健康、安全责任由乙方承担。乙方委托第三方运输企业进行运输的，乙方应当促使其委托的第三方运输企业遵守本条约定。

5.2.7 协助甲方办理与本合同有关的审批、备案手续，包括但不限于为转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置或利用而需办理的审批或备案；跨省、自治区、直辖市转移危险废物而需办理的审批等。

5.2.8 在本合同签署之日属于依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中小企业；本合同有效期内，如乙方企业类型依据届时适用的中小企业划分标准发生任何变更，乙方应在类型变更后10日内以书面方式通知甲方。

5.2.9 其他：该项服务价格为全成本价格，所产生的各类油（或含油污水）归油田所有。

6. 健康、安全生产及环境保护

双方应在签订本合同的同时，签订《2024年八厂与庆兴公司固体废物处置HSE合同（见附件一）》，作为本合同的组成部分。

7. 保密

7.1 双方同意，当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密、其他商业、技术、管理及财务信息（“保密信息”）负有保密责任；未经同意，不得外泄或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿 responsibility。

7.2 本合同约定的保密信息不包括以下信息：

(1) 在从对方获得前，已经掌握且对方不反对使用或披露的信息；

(2) 已经为公众所知的信息，但该等信息为公众所知是由于一方违反本合同约定除外；

(3) 一方按照有管辖权的法院或其他有权机关的合法要求而披露的信息；

(4) 依一方的书面授权而向第三方披露的信息。

7.3 本合同的无效、变更、解除、履行完毕等不影响本条款的效力，在发生上述情形下双方仍应履行保密义务。

7.4 保密期限为本合同有效期及本合同终止后5年。

8. 诚信合规

8.1 双方应坚持公平公正、诚实信用原则，严格遵守国家关于市场准入、安全环保质量管理、经营活动与市场竞争的法律法规，以及关于诚信、合规的各项规定，并严格执行合同文件。

8.2 一方在履行本合同以及因此开展的相关交易活动过程中，应确保其行为符合有关国家法律法规、监管要求、商业惯例、行业准则的规定，不得为谋取不正当利益违规行为包括但不限于：(1) 直接或间接给予另一方工作人员及其近亲属任何好处，包括但不限于给予现金及现金等价物、礼金、贵重物品等；(2) 擅自与另一方工作人员就处理服务费等进行私下商谈或者达成默契；(3) 以任何形式向另一方索要赞助、回扣、礼金、贵重物品等；(4) 在另一方报销任何应由其单位或个人支付的费用等。如发现另一方及其工作人员存在违规行为，应主动向另一方纪检监察部门报告。

8.3 如一方及其工作人员（“违规方”）未履行上述义务，另一方有权要求违规方整改，违规方应自行承担费用进行整改。因违规方违规行为产生的后果，违规方应自行承担相关损失、赔偿、费用、罚金和罚款等，并保证另一方免责；同时，另一方有权视违规



违规程度同时或单独采取不同救济措施,包括要求违规方停止违规行为、要求违规方支付含税处置服务费20%的违约金,解除合同等;违规方支付的违约金不足以弥补另一方损失的,还应继续承担另一方由此遭受的所有损失。

8.4 其他约定: /。

9. 不可抗力

9.1 不可抗力事件是指合同当事人不能预见,不能避免且不能克服的客观情况,包括但不限于地震、水灾、火灾(非人为)、雷击、雪灾、瘟疫、流行性疾病、海啸、风暴潮、台风、泥石流、滑坡等自然灾害;战争、骚乱、戒严、暴动、恐怖袭击、罢工、内乱等社会事件导致无法履行合同的情形。

9.2 由于不可抗力原因,使双方或任何一方不能履行合同义务时,受到不可抗力影响的一方应采取有效措施,尽量避免或减少损失,将损失降低到最低程度,在不可抗力发生后24小时内以书面形式通知对方,并在其后30日内向对方提供有效证明文件。一方未予通知义务或未采取措施避免、减少损失的,应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

9.3 因不可抗力无法按期履行或不能履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。如发生迟延履行,在迟延履行期间发生不可抗力事件导致迟延履行方无法履行其合同义务,迟延履行方不能就迟延履行期间的不可抗力事件免责。

9.4 在受不可抗力影响一方遵守法律规定以及本合同约定(包括但不限于第9.2条和第9.3条)的前提下,因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担(为避免疑问,由于任何一方过错引起的损失除外)。

9.5 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行60日以上时,双方应就继续履行本合同进行协商,协商不成则双方均有权解除本合同。当一方因上述原因解除本合同时,应当以书面形式通知另一方。通知送达另一方时本合同终止。

10. 违约责任

10.1 甲方延迟支付处置服务费的,每逾期一日,应当承担含税延迟支付部分0.015%的违约金,但最多不超过含税处置服务费的3%。

10.2 乙方未按合同约定的期限接收、处置固体废物,每逾期一日,应当承担含税处置服务费0.015%的违约金。经甲方通知后7日,乙方仍未能接收固体废物的,甲方有权解除本合同或另行委托第三方处置,由此产生的额外费用应当由乙方承担。

10.3 乙方未按照合同约定的标准、方式处置固体废物的,应当承担含税处置服务费30%的违约金,并按照本合同约定的标准、方式重新处置。乙方重新处置仍不能达到本合同约定的标准或无法按照本合同约定的方式处置的,甲方可以选择: (3)

(1) 要求乙方继续处置;

(2) 委托第三方按照本合同约定的标准、方式处置,相关费用由乙方承担;

(3) 解除本合同,乙方应承担含税处置服务费30%的违约金,并自费退回已接收的固体废物至甲方指定的地点。

10.4 未经甲方书面同意,乙方擅自转委托的,应当承担含税处置服务费30%的违约金。

10.5 任一方存在本条约定的其他违约行为的,另一方有权书面通知违约方立即停止并纠正违约行为;违约方在收到该书面通知后7日内仍未能纠正的,应当承担含税处置服务费30%的违约金,且另一方有权根据本合同第11条的约定解除本合同。

10.6 如乙方在接收、运输和处置废物过程中,因不可归责于甲方的原因造成环境污染或安全事故,导致任何第三方提出指控或诉讼的,乙方应负责交涉、应诉或协助甲方应诉,并承担由此发生的律师费、赔偿费等所有费用。如导致甲方受到政府监管部门处罚的,乙方应对此承担责任,包括但不限于行政处罚款、治理污染等。

10.7 其他约定:甲方不定期抽检含油污泥处理后石油类指标,抽检结果为处理后渣土石油类 $>0.3\%$ 的,每发现一次,乙方应承担抽检当日工作量对应的含税处置费用



的10%违约金。。

11. 合同解除

11.1 出现下列情形之一的，一方可以解除本合同，但应向对方发出书面解除通知，合同解除并不影响各方依法应享有的权利和承担的义务：

11.1.1 乙方不再具备本合同项下服务内容相应的固体废物（视情况，含危险废物、危险货物运输等）经营资质或能力；

11.1.2 乙方给甲方造成损失拒不赔偿的；

11.1.3 乙方擅自转委托的；

11.1.4 甲方迟延支付乙方处置服务费，且经乙方催告后30个工作日内仍未支付的；

11.1.5 涉及固体废物跨省转移或危险废物跨省转移，但未能取得有关生态环境部门批准的；

11.1.6 其他根据本合同约定一方有权解除合同的；

11.2 一方行使解除权的，不影响该方对另一方有权主张的其他违约救济方式；

11.3 其他约定：/。

12. 通知

12.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。

12.2 除非本合同另有约定，本合同项下双方之间的一切通知均可通过传真、邮递、快递、电子邮件或双方同意的其他方式送达以下地址：

(1) 大庆油田有限责任公司

联系人：牛磊

联系电话：18745901333

传真号码：/

通讯地址：大庆市大同区高台子镇第八采油厂

邮政编码：163514

电子邮件：niuleicy8@petrochina.com.cn

(2) 大庆市庆兴环保科技有限公司

联系人：袁静

联系电话：15845927090

传真号码：/

通讯地址：黑龙江省大庆市肇源县大兴乡联结村

邮政编码：163000

电子邮件：/

12.3 通知在下列日期视为送达被通知方：

(1) 由挂号信邮递，发出通知一方持有的挂号信回执所示日；

(2) 由传真传送，收到成功发送确认后的第一个工作日；

(3) 由特快专递发送，以收件人签收日为送达日，收件人未签收的，以寄出日后第



四个工作日为送达日；

(4) 由电子邮件发送，以发出通知一方邮件系统显示已成功投递对方服务器（包括但不限于收到被通知一方阅后自动回扰）的当日。

12.4 双方的通讯地址可作为法院、仲裁庭送达诉讼、仲裁文书的地址，一方的通讯地址或联系方式如发生变动，应立即书面通知对方，因未及时通知而造成的损失由通讯地址或联系方式变动方自行承担。

12.5 双方应及时签收对方送达至约定地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方已签收。

12.6 甲方指定艾峥奇为本合同履行负责人，甲方授权其代表甲方在合同履行过程中交付、接收相关资料及在相关履行资料上签字，如无甲方书面明确授权，其他任何人无权代表甲方履行上述职责。

13. 法律适用及争议解决

13.1 本合同适用中华人民共和国法律并依照其进行解释。

13.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过协商解决，协商开始后30日内仍无法达成一致的，按以下第(1)种方式解决：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
- (2) 提交/仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在/进行仲裁。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
- (3) 提交双方共同上级协调解决。

13.3 在诉讼/仲裁/协调期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行，双方均不得以解决争议为由拒不履行其在本合同项下的任何义务。

14. 合同效力及其他约定

14.1 本合同经双方法定代表人（负责人）或委托代表签字并加盖合同专用章或公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，由双方另行协商。对于本合同项下的任何修改、补充及变更，均应由双方协商一致并以书面形式做出，经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖合同专用章或公章后方为有效。该等修改、补充及变更的书面协议将构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.3 本合同有效期为 183 天，即于自 2024 年 7 月 1 日始至 2024 年 12 月 31 日终止。如发生第 11.1.1 条约定之情形的，本合同于该情形发生之日起自动解除。

14.4 本合同一式6份，甲方执4份，乙方执2份，每份文本均具有同等法律效力。

14.5 以下附件作为本合同的组成部分：

- (1) 附件一 固体废物处置 HSE 合同
- (2) 附件二 履约保函格式

14.6 其他约定：无

【以下无正文】
【本页为编号为 _____ 的《固体废物处置合同》签署页】

甲方：大庆油田有限责任公司
(公章或合同专用章)
法定代表人/授权代表签字或盖名章：_____



乙方：大庆市联兴环保科技有限公司
(公章或合同专用章)





危险废物 经营许可证

编号: 304220113

发证机关: 大庆市生态环境局

发证日期: 2021年7月8日

法人名称: 大庆市庆兴环保科技有限公司

法定代表人: 郑玉峰

住所: 黑龙江省大庆市肇源县大兴乡联结村

经营设施地址: 大庆市肇源县大兴乡联结村东侧3km处

核准经营方式: 收集、贮存、利用

核准经营规模: HW08 (071-001-08, 071-002-08, 072-001-08) 20000吨/年; HW08 (251-001-08, 251-002-08, 251-003-08, 251-004-08) 20000吨/年; 含油污泥和HW08 (900-249-08) 1; HW49 (900-041-49) 10000吨/年; HW08 (900-214-08, 900-217-08, 900-218-08, 900-219-08) 50000吨/年

核准经营类别: HW08废矿物油与含矿物油废物 (071-001-08, 071-002-08, 072-001-08, 251-001-08, 251-002-08, 251-003-08, 251-004-08, 900-214-08, 900-217-08, 900-218-08, 900-219-08, 900-249-08) HW49 (900-041-49)含油污泥

有效期限 自 2021年7月8日 至 2026年7月7日

初次发证日期: 2021年7月8日



报审序号：2023-18829

合同编号：DQYT-0508003-2023-CL-3655

固体废物处置合同

2023年八厂与兰溪谷公司含油防渗布等危险废物处理承揽合同

大庆油田有限责任公司

与

黑龙江兰溪谷环保科技发展有限公司

2023年12月5日签署



本固体废物处置合同（“本合同”）由以下双方在第八采油厂签订。

委托方（简称“甲方”）：大庆油田有限责任公司
住所：黑龙江省大庆市让胡路区龙南
企业（法人）统一社会信用代码：91230607716675409L
法定代表（负责）人：朱国文

受托方（简称“乙方”）：黑龙江兰溪谷环保科技发展有限公司
住所：黑龙江省绥化市安达市万宝山镇长山村
企业（法人）统一社会信用代码：91231281744418696Q
法定代表（负责）人：邱利民

甲方和乙方以下合称“双方”，简称“一方”。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律法规的规定，本着自愿、平等、公平和诚实信用的原则，双方就本合同项下固体废物处置事宜，协商一致，签订本合同。

1. 固体废物处置的内容、标准和方式

乙方应根据甲方的委托，按照本条约定的内容、标准和方式处置有关固体废物。

1.1 处置内容：

待处置固体废物名称：含油防渗布等危险废物；

暂估固体废物数量：300吨；

该数量为暂估数量，实际处置量应按照本合同第3.3.2条确定。

1.2 处置标准

1.2.1 乙方处置本合同项下的固体废物，应遵循以下标准：

含油防渗布等危险废物交付后，乙方应按DB23/T1413-2022《油田含油污泥综合利用污染控制标准》等有关技术规范及标准制定处置方案和相应措施进行妥善处置，禁止二次拉运处理，发生私自处置、掩埋、倒卖、安全事故、环境污染事件或受到政府监管部门处罚的，由乙方承担全部责任；

1.2.2 如果第1.2.1条约定标准在本合同有效期内发生修订、废止、替代等情形，或出现新的应当适用于本合同固体废物处置工作的标准，则乙方应执行最新适用的标准；若各标准之间就同一事项要求不一致，则应执行技术要求最高的标准。

1.3 处置方式综合利用及处置。

2. 固体废物处置的期限、地点

2.1 处置期限：2023年12月5日至2023年12月31日。

2.2 处置地点：黑龙江兰溪谷环保科技发展有限公司。

3. 固体废物的接收、运输和处置

3.1 固体废物的接收

3.1.1 在合同有效期内，甲方有权在任何时间向乙方发出书面通知，要求乙方接收待处置固体废物（接收需求通知）。接收需求通知应当载明必要的信息以便乙方进行接收，这些信息包括：

- (1) 待处置固体废物的名称；
- (2) 待处置固体废物的数量/质量/体积；
- (3) 待处置固体废物的物理形态；
- (4) 待处置固体废物的包装或容器情况；
- (5) 待处置危险废物的名录代码；
- (6) 本次接收事宜的甲方经办人信息；
- (7) 其他：_____。



3.1.2 乙方应当在收到接收需求通知后3日内对需接收内容予以确认,并以书面形式告知甲方其派车接收的相关信息,包括:

(1) 人员信息,包括人员数量、人员名称、人员联系方式等;

(2) 车辆信息,包括出车时间、到达时间、出车数量、车辆种类、车辆载重、使用年限、车牌号等;

(3) 委托第三方运输的,还应包括受托的第三方运输单位的名称、运输资质等。

3.1.3 如乙方对需接收内容有异议的,就无异议部分,乙方应当按照本条约定进行接收;就有异议部分,乙方应在第3.1.2条约定的期限内书面通知甲方,双方应就有异议部分及时协商,共同确认。

3.1.4 除非双方另有约定,乙方应当在完成第3.1.2条约定的书面确认后10日内完成接收。

3.1.5 乙方应在黑龙江兰溪谷环保科技有限公司或接收需求通知中另行指定的地点接收待处置固体废物。

3.1.6 甲方负责待处置固体废物在接收地点的过磅计量工作(“出场过磅”),乙方应根据甲方的要求提供协助。过磅单/装运单/或确认装车情况的其他单证和危险废物转移联单应当依据出场过磅结果填写,但双方另行协商确定的除外。

3.1.7 如出场过磅结果与双方根据第3.1.2条和第3.1.3条确认的结果有差异的,应当以出场过磅结果为准,但双方另行协商确定的除外。

3.1.8 如甲方交付的待处置固体废物不符合本合同约定的,由乙方就不符合约定部分重新提出报价方案交甲方。如双方对新报价方案协商达成一致的,由乙方按照协商结果处置;如无法协商一致,乙方应当将已由乙方接收的待处置固体废物退回甲方,退回费用由甲方承担。

3.2 固体废物的运输

本合同项下待处置废物的运输责任执行3.2.2条规定。

3.2.1 本合同项下待处置废物由乙方安排运输。

(1) 运输方式为道路运输/水路运输/铁路运输/其他方。乙方可以自行运或也可以委托具有相应运输资质的第三方运输企业代其运输。委托第三方运输企业运输的,乙方应自行承担运费,且应确保并促使其委托的第三方运输企业遵守本第3.2.1条的约定。

(2) 甲方应在接收地点将待处置固体废物交付给乙方或其委托的第三方运输企业,乙方负责将待处置固体废物从接收地点运至处置地点,并负责卸车工作。

(3) 交付的时点为乙方或其委托的第三方运输企业在接收地点开始装车之时,甲方有权派遣人员跟车。待处置固体废物交付前,任何与待处置固体废物(包括包装或容器)相关的环境、安全、健康义务和责任由甲方承担。待处置固体废物交付后,任何与待处置固体废物(包括包装或容器)相关的环境、安全、健康义务和责任由乙方承担。在装车、运输、卸车等活动中,乙方或其委托的第三方运输企业应当严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《国内水路运输管理条例》、《船舶载运危险货物安全监督管理规定》、《铁路安全管理条例》、《铁路危险货物运输安全监督管理规定》等有关法律法规的规定,并承担装车、运输或卸车过程中发生的有关环保、安全、交通事故的责任。运输危险废物的,乙方或其委托的第三方运输企业应当根据废物特性,采用符合相应标准的包装物、容器和运输工具。

(4) 乙方或其委托的第三方运输企业应当在完成运输后___/___日内将待处置固体废物的运输情况书面告知甲方。

(5) 其他约定: _____。

3.2.2 本合同项下待处置废物由甲方安排运输。

3.2.3 其他约定: ___/___。

3.3 固体废物的处置



3.3.1 乙方应负责待处置固体废物在处置地点进行的过磅计量工作（“入库过磅”），甲方有权全过程参与监督。乙方在完成入库过磅后3日内立刻向甲方提供书面计量结果，甲方有权派遣人员参与入库过磅。过磅单或确认入库情况的其他单证和危险废物转移联单应当依据出场过磅结果填写，但双方另行协商确定的除外。

3.3.2 乙方在本合同项下实际处置的固体废物的数量（“实际处置量”）为入库过磅结果所示数量；但是，如果入库过磅结果与出场过磅结果有差异的，除非双方另有约定，实际处置量应当按照如下第（4）种方式确定：

（1）以/为准。

（2）以入库过磅结果为准。

（3）如果过磅误差不超过1%（含）的，以计量结果较低者为准；如果过磅误差超过1%（不含）的，乙方应当在入库过磅完成/日内通知甲方进行诚信协商，并以经双方协商后最终确认的结果为准。

（4）其他：当只进行“出场过磅”时，以“出场过磅”结果为准；当只进行“入库过磅”时，以“入库过磅”结果为准；当“出场过磅”与“入库过磅”不符时，以计量数量小的称重数据为准。

3.3.3 对于需要以浓度或含量来计价的固体废物，以双方交接时在接收地点现场取样的浓度或含量为准，该样本送至双方认可、具有合格资质的机构进行检测。

3.3.4 乙方应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规以及本合同第1条约定的方式、标准妥善处置待处置固体废物；如本合同任何约定与适用的法律法规或国家/环境/行业标准不一致的，应当以较严格者为准。

3.3.5 乙方收集、贮存、运输、利用及处置固体废物过程中，应遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，并根据固体废物的成份和特性，严格依法按照环评批复处置，防止扬散、流失、渗漏和其他污染，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

3.3.6 乙方应当自行处置本合同项下待处置固体废物，乙方不得将未经处理的固体废物及其附属物直接转卖。

3.3.7 乙方应按照本合同第2条约定的地点和期限处置甲方交付的固体废物。

3.3.8 乙方应在完成处置后7日内以书面形式向甲方提供已妥善处置固体废物相关证明，包括危险废物处理后经具备环境检验检测资质的第三方机构进行检测的合格检测报告、处置过程相关影响资料及相关产物的数量及去向。甲方应在收到前述相关妥善处置固体废物的证明后7日内进行审核确认。

3.3.9 乙方完成处置后，甲方有权利要求对处置成果进行采样检测分析，乙方应当配合。检测分析结果不符合第1.2条约定的标准的，双方应按照第10.3条的约定处理。

3.3.10 乙方完成处置后，油、废水等处置产物全部由甲方回收。检测分析结果符合第1.2条约定的标准的渣土，按以下比例由甲乙双方回收，且按建设项目环境影响评价文件批复处置利用：甲方回收0%，乙方回收100%。

4. 费用及支付

4.1 本合同项下处置服务费采用以下第（1）种计价方式，在本合同履行期间，若国家税率政策发生变更调整的，本合同的执行税率也随之进行相应的调整。

（1）固定总价

本合同含税处置服务费为人民币大写：壹拾伍万伍仟元整（小写：155000元）；税率为13%；含税处置服务费为人民币大写壹拾伍万伍仟元整人民币（小写：155000.00元人民币）。本合同处置服务费包括乙方完成本合同所有工作内容所发生的全部费用。

（2）固定单价

本合同含税固定处置服务费为人民币大写：/（小写：/）；税率为13%；含税固定处置服务费为人民币大写壹拾伍万伍仟元整人民币（小写：155000.00元人民币）。合同单价为/（小写：/）元，除另有约定外，固定单价在合同期内不予调



整。

(3) 其他: /。

4.2 支付方式按照下列第(1)种方式执行:

(1) 一次性支付

乙方完成本合同项下全部固体废物的处置并提供第 3.3.9 条约定的相关证明且经甲方审核确认后 60 日内支付全部含税处置服务费。

(2) 定期支付

(a) 每第/个月的第/日支付一笔处置服务费, 支付金额相当于/总处置服务费的/%。

(b) 最后一个支付日为本合同终止之日; 但如果本合同终止之日尚有进行中的处置的, 则最后一个支付日为乙方完成该批次处置并提供第 3.3.9 条约定的相关证明之日。

(3) 按进度支付

(3.1) 进度支付计划: /;

(3.2) 最后一笔支付为/处置服务费的/%, 在乙方完成全部固体废物处置并提供第 3.3.9 条约定的相关证明后/日内支付。

(4) 按批次支付

乙方完成单批次固体废物处置并按照第 3.3.9 条的约定提供了相关证明之后/日内支付该批次/处置服务费。

(5) 其他约定: /。

4.3 履约担保

本合同生效后 / 日内, 乙方应按照如下第 / 种方式向甲方提供一份履约担保:

(1) 乙方提供一份履约保函。履约保函的金额相当于第 4.1 条约定的含税/不含税处置服务费的 / %。履约保函的有效期应至乙方完全履行本合同项下全部义务之日。履约保函格式见附件二。

(2) 乙方向甲方支付相当于第 4.1 条约定的含税/不含税处置服务费 / % 的履约保证金。如乙方发生违约的, 甲方有权根据因乙方违约行为而造成的损害扣除履约保证金, 作为乙方应支付的违约金或对甲方的损害赔偿。履约保证金的余额在乙方完全履行本合同项下全部义务后内由甲方无息返还给乙方。如履约保证金不足以弥补甲方损失的, 乙方应继续赔偿。

4.4 乙方收款账户信息如下:

收款人: 黑龙江兰溪谷环保科技发展有限公司

开户行: 中国农业银行股份有限公司安达支行

账号: 08405101040006246

乙方应对上述账户信息的真实性、安全性、准确性负责。

4.5 每次付款前, 乙方应提交符合甲方财务要求的增值税专用发票及经甲方确认的处置服务妥善完成的相关证明, 否则甲方有权顺延付款, 直至收到前述资料, 且不承担违约责任。乙方开具发票所需甲方信息如下:

纳税人名称: 大庆油田有限责任公司第八采油厂

税务登记号: 230690X06336576

开户行名称: 中国工商银行油田支行

开户行账号: 0905060129221800808

税务登记地址: 大庆市大同区高平村

财务电话: 0459-4512080

其他: /



甲方应对上述信息的真实性、安全性、准确性负责。

5. 权利和义务

5.1 甲方权利和义务

除本合同其他条款约定以外，甲方还具有如下权利和义务：

- 5.1.1 有权不时审查乙方提供本合同项下服务所需的经营资质和能力，包括但不限于固体废物经营资质、危险废物经营资质；
- 5.1.2 有权审查乙方或其委托的第三方运输企业的危险废物运输资质；
- 5.1.3 告知乙方固体废物危害特性及安全注意事项；
- 5.1.4 为乙方提供与履行合同有关的工作便利；
- 5.1.5 按约定向乙方支付处置服务费用；
- 5.1.6 其他：/。

5.2 乙方权利和义务

除本合同其他条款约定以外，乙方还具有如下权利和义务：

5.2.1 有权根据本合同约定收取处置服务费。

5.2.2 在本合同有效期内，就本合同项下待处置固体废物的收集、贮存、处置、利用等任何服务，乙方始终具备相应的经营资质、持有符合本合同服务内容的《营业执照》，涉及危险废物的，还应当具有相应危险废物经营资质、持有相应危险废物经营许可证；乙方或其委托的第三方负责危险废物运输的，应具有危险废物运输资质及能力，并不得超越其经营许可范围。

5.2.3 应当根据待处置固体废物特性制定处置方案、事故应急预案及防范措施，并落实到位。

5.2.4 应当将待处置固体废物危害特性及安全注意事项告知其相关人员，并提供必要的安全防护措施。

5.2.5 合同履行过程中应及时处理、协调与其他相关方之间的工作关系，并按规定办理相关手续。

5.2.6 在进入甲方厂区时，应遵守甲方相关管理规定，并确保派来的接收人员充分做好自我防护工作，接收人员进入甲方厂区后的健康、安全责任由乙方承担。乙方委托第三方运输企业进行运输的，乙方应当促使其委托的第三方运输企业遵守本条约定。

5.2.7 协助甲方办理与本合同有关的审批、备案手续，包括但不限于为转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置或利用而需办理的审批或备案；跨省、自治区、直辖市转移危险废物而需办理的审批等。

5.2.8 在本合同签订之日属于依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中小企业；本合同有效期内，如乙方企业类型依据届时适用的中小企业划分标准发生任何变更，乙方应在类型变更后10日内以书面方式通知甲方。

5.2.9 其他：乙方承诺：（1）严格按照文件规定的要求进行处置；（2）不随意倾倒或抛弃含油防渗布等危险废物，在装卸过程中保持现场整洁，做好防渗措施防止油污污水落地。

6. 健康、安全生产及环境保护

双方应在签订本合同的同时，签订《2023年八厂与兰溪谷公司含油防渗布等固体废物处置HSE合同》（见附件一），作为本合同的组成部分。

7. 保密

7.1 双方同意，当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密、其他商业、技术、管理及财务信息（“保密信息”）负有保密责任；未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

7.2 本合同约定的保密信息不包括以下信息：

- （1）在从对方获得前，已经掌握且对方不反对使用或披露的信息；



(2) 已经为公众所知的信息,但该等信息为公众所知是由于一方违反本合同约定的除外;

(3) 一方按照有管辖权的法院或其他有权机关的合法要求而披露的信息;

(4) 依一方的书面授权而向第三方披露的信息。

7.3 本合同的无效、变更、解除、履行完毕等不影响本条款的效力,在发生上述情形下,双方仍应履行保密义务。

7.4 保密期限为本合同有效期及本合同终止后1年。

8. 诚信合规

8.1 双方应坚持公平公正、诚实信用原则,严格遵守国家关于市场准入、安全环保质量、法律法规,监管要求、商业惯例、行业准则的各项规定,并严格执行管理、经营活动与市场竞争的法律法规,以及关于诚信、合规的各项规定,并严格执行合同文件。

8.2 一方在履行本合同以及因此开展的相关交易活动过程中,应确保其行为符合有关国家法律法规、监管要求、商业惯例、行业准则的规定,不得为谋取不正当利益违规行为,包括但不限于:(1)直接或间接给予另一方工作人员及其近亲属任何好处,包括但不限于给予现金及现金等价物、礼金、贵重物品等;(2)擅自与另一方工作人员就处置服务费等进行私下商谈或者达成默契;(3)以任何形式向另一方索要赞助、回扣、接受礼金、贵重物品等;(4)在另一方报销任何应由其单位或个人支付的费用等。如一方发现另一方及其工作人员存在违规行为,应主动向另一方纪检监察部门报告。

8.3 如一方及其工作人员(“违规方”)未履行上述义务,另一方有权要求违规方整改,违规方应自行承担费用进行整改。因违规方违规行为产生的后果,违规方应自行承担相关损失、赔偿、费用、罚金和罚款等,并保证另一方免责;同时,另一方有权视违规方违规程度同时或单独采取不同救济措施,包括要求违规方停止违规行为、要求违规方支付含税处置服务费20%的违约金、解除合同等;违规方支付的违约金不足以弥补另一方损失的,还应继续承担另一方由此遭受的所有损失。

8.4 其他约定: /。

9. 不可抗力

9.1 不可抗力事件是指合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,包括但不限于地震、水灾、火灾(非人为)、雷击、雪灾、瘟疫、流行性疾病、海啸、风暴潮、台风、泥石流、滑坡等自然灾害;战争、骚乱、戒严、暴动、恐怖袭击、罢工、内乱等社会事件导致无法履行合同的情形。

9.2 由于不可抗力原因,使双方或任何一方不能履行合同义务时,受到不可抗力影响的一方应采取有效措施,尽量避免或减少损失,将损失降低到最低程度,在不可抗力发生后48小时内以书面形式通知对方,并在其后15日内向对方提供有效证明文件。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的,应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

9.3 因不可抗力无法按期履行或不能履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。如发生迟延履行,在迟延履行期间发生不可抗力事件导致迟延履行方无法履行其合同义务,迟延履行方不能就迟延履行期间的不可抗力事件免责。

9.4 在受不可抗力影响一方遵守法律规定以及本合同约定(包括但不限于第9.2条和第9.3条)的前提下,因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担(为避免疑问,由于任何一方过错引起的损失除外)。

9.5 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行7日以上时,双方应就继续履行本合同进行协商,协商不成则双方均有权解除本合同。当一方因上述原因解除本合同时,应当以书面形式通知另一方,通知到达另一方时本合同终止。

10. 违约责任

10.1 甲方延迟支付处置服务费的,每逾期一日,应当承担含税延迟支付部分0.015%的违约金,但最多不超过含税处置服务费的 3 %。



10.2 乙方未按合同约定的期限接收、处置固体废物的，每逾期一日，应当承担含税处置服务费0.015%的违约金。经甲方通知后7日，乙方仍未能接收固体废物的，甲方有权解除本合同或另行委托第三方处置，由此产生的额外费用应当由乙方承担。

10.3 乙方未按合同约定的标准、方式处置固体废物的，应当承担含税处置服务费15%的违约金，并按照本合同约定的标准、方式重新处置。乙方重新处置仍不能达到本合同约定的标准或无法按照本合同约定的方式处置的，甲方可以选择：(1)

(1) 要求乙方继续处置；

(2) 委托第三方按照本合同约定的标准、方式处置，相关费用由乙方承担；

(3) 解除本合同，乙方应承担含税/不含税处置服务费3%的违约金，并自费退回已接收的固体废物至甲方指定的地点。

10.4 未经甲方书面同意，乙方擅自转委托的，应当承担含税处置服务费30%的违约金。

10.5 任何一方存在本合同约定的其他违约行为的，另一方有权书面通知违约方立即停止并纠正违约行为；违约方在收到该书面通知后7日内仍未纠正的，应当承担含税处置服务费15%的违约金，且另一方有权根据本合同第11条的约定解除本合同。

10.6 如乙方在接收、运输和处置废物过程中，因不可归责于甲方的原因造成环境污染或安全事故，导致任何第三方提出指控或诉讼的，乙方应负责交涉、应诉或协助甲方应诉，并承担由此发生的律师费、赔偿费等所有费用。如导致甲方受到政府监管部门处罚的，乙方应对此承担责任，包括但不限于行政罚款、治理污染等。

10.7 其他约定：/。

11. 合同解除

11.1 出现下列情形之一的，一方可以解除本合同，但应向对方发出书面解除通知，合同解除并不影响各方依法应享有的权利和承担的义务：

11.1.1 乙方不再具备本合同项下服务内容相应的固体废物（视情况，含危险废物、危险货物运输等）经营资质或能力；

11.1.2 乙方给甲方造成损失拒不赔偿的；

11.1.3 乙方擅自转委托的；

11.1.4 甲方迟迟支付乙方处置服务费，且经乙方催告后30个工作日内仍未支付的；

11.1.5 涉及固体废物跨省转移或危险废物跨省转移，但未能取得有关生态环境部门批准的；

11.1.6 其他根据本合同约定一方有权解除合同的；

11.2 一方行使解除权的，不影响该方对另一方有权主张的其他违约救济方式；

11.3 其他约定：/。

12. 通知

12.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并在合同约定的期限内送达接收人。

12.2 除非本合同另有约定，本合同项下双方之间的一切通知均可通过传真、快递、电子邮件或双方同意的其他方式送达以下地址：

(1) 大庆油田有限责任公司

联系人：牛磊

联系电话：18745901333

通讯地址：黑龙江省大庆市大同区第八采油厂机关2号楼207室

邮政编码：163514

电子邮件：niuleicy8@petrochina.com.cn

(2) 黑龙江兰溪谷环保科技发展有限公司

联系人：邱利民



联系电话: 18803079666

通讯地址: 黑龙江省绥化市安达市万宝山镇长山村

邮政编码: 151405

12.3 通知在下列日期视为送达被通知方:

- (1) 由挂号信邮递, 发出通知一方持有的挂号信回执所示日;
- (2) 由传真传递, 收到成功发送确认后的第一个工作日;
- (3) 由特快专递发送, 以收件人签收日为送达日, 收件人未签收的, 以寄出日后第四个工作日为送达日;
- (4) 由电子邮件发送, 以发出通知一方邮件系统显示已成功投递对方服务器 (包括但不限于收到被通知一方阅后自动回执) 的当日。

12.4 双方的通讯地址可作为法院、仲裁庭送达诉讼、仲裁文书的地址, 一方的通讯地址或联系方式如发生变动, 应立即书面通知对方, 因未及时通知而造成的损失由通讯地址或联系方式变动方自行承担。

12.5 双方应及时签收对方送达至约定地点和指定接收人的来往信函; 如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的, 视为拒绝签收一方已签收。

12.6 甲方指定艾峰奇为本合同履行负责人, 甲方授权其代表甲方在合同履行过程中交付、接收相关资料及在相关履行资料上签字, 如无甲方书面明确授权, 其他任何人无权代表甲方履行上述职责。

13. 法律适用及争议解决

13.1 本合同适用中华人民共和国法律并依照其进行解释。

13.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议, 双方应通过协商解决, 协商开始后7日内仍无法达成一致的, 按以下第(1)种方式解决:

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
- (2) 提交 / 仲裁委员会, 按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在 / 进行仲裁。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的, 对双方均有约束力。
- (3) 提交双方共同上级协调解决。

13.3 在诉讼/仲裁/协调期间, 本合同不涉及争议部分的条款仍须履行, 双方均不得以解决争议为由拒不履行其在本合同项下的任何义务。

14. 合同效力及其他约定

14.1 本合同经双方法定代表人(负责人)或委托代表签字并加盖合同专用章或公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜, 由双方另行协商。对于本合同项下的任何修改、补充及变更均应由双方协商一致并以书面形式做出, 经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖合同专用章或公章后方为有效。该等修改、补充及变更的书面协议将构成本合同的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

14.3 本合同有效期为180天, 即于2023年12月5日始至2024年6月5日终止。如发生第11.1.1条约定之情形的, 本合同于该情形发生之日起自动解除。

14.4 本合同一式6份, 甲方执4份, 乙方执2份, 每份文本均具有同等法律效力。

14.5 以下附件作为本合同的组成部分:

- (1) 附件一 固体废物处置HSE合同
- (2) 附件二 履约保函格式

14.6 其他约定: /。

【以下无正文】

【本页为编号为 _____ 的《2023年八厂与兰溪谷公司含油防渗布等危险废物处理承揽合同》签署页】



甲方：大庆油田有限责任公司
(公章或合同专用章)
法定代表人/授权代表签字或盖名章：



乙方：黑龙江兰溪谷环保科技发展有限公司
(公章或合同专用章)
法定代表人/授权代表签字或盖名章：



附件 4：危废转移联单

危险废物转移联单 (省内)



联单编号: 20190100000000000000
 联单生成日期: 2019-01-01 00:00:00

第一联: 危险废物转移联单

产生单位: 广东某某环保科技有限公司
 转移单位: 广东某某环保科技有限公司
 转移日期: 2019-01-01

序号	危险废物名称	危险废物代码	危险废物类别	危险废物数量	危险废物包装形式	危险废物包装数量	危险废物包装重量	危险废物包装体积	危险废物包装容积	危险废物包装重量
1	废机油	201-024-08	II	1000	桶装	1000	1000	1	1	1000

第二联: 危险废物转移联单

第一联: 产生单位

单位名称: 广东某某环保科技有限公司
 法定代表人: 张三
 负责人: 李四
 联系电话: 12345678
 地址: 广东省广州市天河区某某路某某号
 经营范围: 环保工程、环保设备、环保材料、环保服务

第二联: 转移单位

单位名称: 广东某某环保科技有限公司
 法定代表人: 张三
 负责人: 李四
 联系电话: 12345678
 地址: 广东省广州市天河区某某路某某号
 经营范围: 环保工程、环保设备、环保材料、环保服务

危险废物转移联单 (省内)



联单编号: 20190100000000000000
 联单生成日期: 2019-01-01 00:00:00

第一联: 危险废物转移联单

产生单位: 广东某某环保科技有限公司
 转移单位: 广东某某环保科技有限公司
 转移日期: 2019-01-01

序号	危险废物名称	危险废物代码	危险废物类别	危险废物数量	危险废物包装形式	危险废物包装数量	危险废物包装重量	危险废物包装体积	危险废物包装容积	危险废物包装重量
1	废机油	201-024-08	II	1000	桶装	1000	1000	1	1	1000

第二联: 危险废物转移联单

第一联: 产生单位

单位名称: 广东某某环保科技有限公司
 法定代表人: 张三
 负责人: 李四
 联系电话: 12345678
 地址: 广东省广州市天河区某某路某某号
 经营范围: 环保工程、环保设备、环保材料、环保服务

第二联: 转移单位

单位名称: 广东某某环保科技有限公司
 法定代表人: 张三
 负责人: 李四
 联系电话: 12345678
 地址: 广东省广州市天河区某某路某某号
 经营范围: 环保工程、环保设备、环保材料、环保服务

危险废物转移联单 (省内)



转移日期: 2023/03/07 09:00
 转移数量: 202303070900000000

转移类别: 危险废物转移
 转移方式: 道路运输

转移地点: 危险废物贮存库
 转移原因: 危险废物贮存库满

序号	废物名称	废物代码	危险废物	数量	转移日期	转移方式	转移数量	转移地点	转移原因
1	废机油	251-014-08	是	2000	2023	道路	2000	危险废物贮存库	危险废物贮存库满

第一联: 转移人
 转移人: 危险废物贮存库
 转移日期: 2023/03/07 09:00
 转移地点: 危险废物贮存库
 转移原因: 危险废物贮存库满

第二联: 接收人
 接收人: 危险废物贮存库
 接收日期: 2023/03/07 09:00
 接收地点: 危险废物贮存库
 接收原因: 危险废物贮存库满

序号	废物名称	废物代码	危险废物	转移数量	接收日期	接收地点	接收原因
1	废机油	251-014-08	是	2000	2023	危险废物贮存库	危险废物贮存库满

危险废物转移联单 (省内)



转移日期: 2023/03/07 09:00
 转移数量: 202303070900000000

转移类别: 危险废物转移
 转移方式: 道路运输

转移地点: 危险废物贮存库
 转移原因: 危险废物贮存库满

序号	废物名称	废物代码	危险废物	数量	转移日期	转移方式	转移数量	转移地点	转移原因
1	废机油	251-014-08	是	2000	2023	道路	2000	危险废物贮存库	危险废物贮存库满

第一联: 转移人
 转移人: 危险废物贮存库
 转移日期: 2023/03/07 09:00
 转移地点: 危险废物贮存库
 转移原因: 危险废物贮存库满

第二联: 接收人
 接收人: 危险废物贮存库
 接收日期: 2023/03/07 09:00
 接收地点: 危险废物贮存库
 接收原因: 危险废物贮存库满

序号	废物名称	废物代码	危险废物	转移数量	接收日期	接收地点	接收原因
1	废机油	251-014-08	是	2000	2023	危险废物贮存库	危险废物贮存库满

危险废物转移联单 (省内)



编号: 440303000001
 日期: 2023-08-01

第一联: 危险废物产生单位

单位名称: 广东某某有限公司
 地址: 广东省广州市天河区某某路某某号
 法定代表人: 某某某
 联系电话: 020-12345678

序号	危险废物名称	危险废物代码	危险废物类别	危险废物数量	危险废物包装形式	危险废物产生日期	危险废物产生量	危险废物贮存日期	危险废物贮存量
1	废有机溶剂	900-04-08	HW08	1000	桶装	2023-07-25	1000	2023-08-01	1000

第二联: 危险废物接收单位

单位名称: 广东某某环保有限公司
 地址: 广东省广州市白云区某某路某某号
 法定代表人: 某某某
 联系电话: 020-87654321

序号	危险废物名称	危险废物代码	危险废物类别	危险废物数量	危险废物包装形式	危险废物接收日期	危险废物接收量	危险废物贮存日期	危险废物贮存量
1	废有机溶剂	900-04-08	HW08	1000	桶装	2023-08-01	1000	2023-08-01	1000

危险废物转移联单 (省内)



编号: 440303000001
 日期: 2023-08-01

第一联: 危险废物产生单位

单位名称: 广东某某有限公司
 地址: 广东省广州市天河区某某路某某号
 法定代表人: 某某某
 联系电话: 020-12345678

序号	危险废物名称	危险废物代码	危险废物类别	危险废物数量	危险废物包装形式	危险废物产生日期	危险废物产生量	危险废物贮存日期	危险废物贮存量
1	废有机溶剂	900-04-08	HW08	1000	桶装	2023-07-25	1000	2023-08-01	1000

第二联: 危险废物接收单位

单位名称: 广东某某环保有限公司
 地址: 广东省广州市白云区某某路某某号
 法定代表人: 某某某
 联系电话: 020-87654321

序号	危险废物名称	危险废物代码	危险废物类别	危险废物数量	危险废物包装形式	危险废物接收日期	危险废物接收量	危险废物贮存日期	危险废物贮存量
1	废有机溶剂	900-04-08	HW08	1000	桶装	2023-08-01	1000	2023-08-01	1000

危险废物转移联单 (省内)



联单编号: 2024C0000111
 备案编号: 2024C0000111

第一联 危险废物产生单位

单位名称: 江苏某某环保科技有限公司
 地址: 江苏省南京市江宁区某某路某某号
 联系人: 张三

危险废物名称: 废有机溶剂
 危险废物代码: 900-041-09
 产生日期: 2024-01-01
 产生量: 1000 kg

序号	接收单位	接收日期	接收量	接收人	接收单位	接收日期	接收量	接收人	接收单位	接收日期
1	江苏某某环保科技有限公司	2024-01-01	1000	张三	江苏某某环保科技有限公司	2024-01-01	1000	张三	江苏某某环保科技有限公司	2024-01-01

第二联 危险废物接收单位

单位名称: 江苏某某环保科技有限公司
 地址: 江苏省南京市江宁区某某路某某号
 联系人: 李四

危险废物名称: 废有机溶剂
 危险废物代码: 900-041-09
 接收日期: 2024-01-01
 接收量: 1000 kg

序号	接收单位	接收日期	接收量	接收人	接收单位	接收日期	接收量	接收人	接收单位	接收日期
1	江苏某某环保科技有限公司	2024-01-01	1000	李四	江苏某某环保科技有限公司	2024-01-01	1000	李四	江苏某某环保科技有限公司	2024-01-01

危险废物转移联单 (省内)



联单编号: 2024C0000111
 备案编号: 2024C0000111

第一联 危险废物产生单位

单位名称: 江苏某某环保科技有限公司
 地址: 江苏省南京市江宁区某某路某某号
 联系人: 张三

危险废物名称: 废有机溶剂
 危险废物代码: 900-041-09
 产生日期: 2024-01-01
 产生量: 1000 kg

序号	接收单位	接收日期	接收量	接收人	接收单位	接收日期	接收量	接收人	接收单位	接收日期
1	江苏某某环保科技有限公司	2024-01-01	1000	张三	江苏某某环保科技有限公司	2024-01-01	1000	张三	江苏某某环保科技有限公司	2024-01-01

第二联 危险废物接收单位

单位名称: 江苏某某环保科技有限公司
 地址: 江苏省南京市江宁区某某路某某号
 联系人: 李四

危险废物名称: 废有机溶剂
 危险废物代码: 900-041-09
 接收日期: 2024-01-01
 接收量: 1000 kg

序号	接收单位	接收日期	接收量	接收人	接收单位	接收日期	接收量	接收人	接收单位	接收日期
1	江苏某某环保科技有限公司	2024-01-01	1000	李四	江苏某某环保科技有限公司	2024-01-01	1000	李四	江苏某某环保科技有限公司	2024-01-01

危险废物转移联单 (省内)



联单编号: 20140200000001
 转移日期: 2014-02-01 10:00:00

第一联: 危险废物产生单位
 单位名称: 江苏XX有限公司
 地址: 江苏省XX市XX区XX路XX号
 法定代表人: 张三
 联系电话: 138XXXXXXX
 电子邮箱: zhangsan@xx.com

第二联: 危险废物接收单位
 单位名称: 江苏XX有限公司
 地址: 江苏省XX市XX区XX路XX号
 法定代表人: 李四
 联系电话: 139XXXXXXX
 电子邮箱: lisi@xx.com

序号	危险废物名称	危险废物代码	数量	包装形式	危险特性	备注	接收单位	接收日期	接收人
1	废有机溶剂	900-041-08	10	桶装	易燃		江苏XX有限公司	2014-02-01	李四

危险废物转移联单 (省内)



联单编号: 20140200000001
 转移日期: 2014-02-01 10:00:00

第一联: 危险废物产生单位
 单位名称: 江苏XX有限公司
 地址: 江苏省XX市XX区XX路XX号
 法定代表人: 张三
 联系电话: 138XXXXXXX
 电子邮箱: zhangsan@xx.com

第二联: 危险废物接收单位
 单位名称: 江苏XX有限公司
 地址: 江苏省XX市XX区XX路XX号
 法定代表人: 李四
 联系电话: 139XXXXXXX
 电子邮箱: lisi@xx.com

序号	危险废物名称	危险废物代码	数量	包装形式	危险特性	备注	接收单位	接收日期	接收人
1	废有机溶剂	900-041-08	10	桶装	易燃		江苏XX有限公司	2014-02-01	李四

危险废物转移联单 (省内)



单号: 20241201010101
 申报日期: 20241201010101

接收单位: 广州市天河区环保局
 转移单位: 广州市天河区环保局

序号	废物名称	废物代码	产生量	转移量	接收单位名称	接收地址	接收日期	接收方式	接收人姓名	接收人电话
1	废机油	261-01-02	10	10	广州市天河区环保局	天河区环保局	20241201	桶装	张三	13800000000

接收单位: 广州市天河区环保局
 转移单位: 广州市天河区环保局

序号	废物名称	废物代码	产生量	转移量	接收单位名称	接收地址	接收日期	接收方式	接收人姓名	接收人电话
1	废机油	261-01-02	10	10	广州市天河区环保局	天河区环保局	20241201	桶装	张三	13800000000

附件 5：排污许可证

排污许可证

证书编号：912306217336497473001W

单位名称：大庆模範屯油田有限责任公司

注册地址：黑龙江省大庆市肇州县新福乡保产村

法定代表人：王健

生产经营场所地址：

黑龙江省大庆市肇州县新福乡保产村，东至宋朝路，西至大广高速路，南至大肇路，北至同昌路

行业类别：陆地石油开采，锅炉，工业炉窑，水处理通用工序

统一社会信用代码：912306217336497473

有效期限：自2024年11月28日至2029年11月27日止



发证机关：（盖章）大庆市生态环境局

发证日期：2024年11月28日

附件 6：大庆油田有限责任公司第八采油厂环境突发事件专项应急预案

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	大庆油田有限责任公司第八采油厂	机构代码	91230607716675409L
法定代表人	王健	联系电话	0459-4511255
联系人	牛磊	联系电话	18745901333
传真	/	电子邮箱	niuleicy8@petrochina.com.cn
地址	黑龙江省大庆市		
预案名称	大庆油田有限责任公司第八采油厂突发环境事件应急预案		
风险级别	一般[一般-大气(Q1-M1-E3)+一般-水(Q1-M1-E2)]		
<p>本单位于2023年5月29日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。</p> <p>本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。</p> <p style="text-align: right;">预案制定单位：大庆油田有限责任公司第八采油厂</p>			
预案签署人	王健	报送时间	2023年6月15日

突发环境事件应急预案备案文件目录	1、突发环境事件应急预案备案表； 2、环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 3、编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 4、环境风险评估报告； 5、环境应急资源调查报告； 6、环境应急预案评审意见。		
备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2023年6月15日收讫，文件齐全，予以备案。 <div style="text-align: right;">  备案受理部门（公章） 2023年6月15日 </div>		
备案编号	230621-2023-010-L		
报送单位	大庆油田有限责任公司第八采油厂		
受理部门负责人	刘岩河	经办人	蔡大鹄

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般 L、较大 M、重大 H）及跨区域（T）表征字母组成。例如，河北省永年县**重大环境风险非跨区域企业环境应急预案 2015 年备案，是永年县环境保护局当年受理的第 26 个备案，则编号为：130429-2015-026-H；如果是跨区域的企业，则编号为：130429-2015-026-HT。

大庆市环境保护局文件

庆环建字(2011)171号

关于第八采油厂工业固废填埋场工程 环境影响报告书的批复

大庆油田有限责任公司第八采油厂:

你单位报送的《第八采油厂工业固废填埋场工程环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉,经我局审批领导小组研究后,现批复如下:

一、该项目建设性质属于新建,按一般工业固废处置场 II 类场设计、建设,地点位于大庆市肇州县新福乡双龙山北侧 1.8km,乐业村东南 1.05km,第八采油厂 303 队 9 号计量间东南 180m,芳 117 井排路北侧。位置坐标为东经 125° 07' 21",北纬 45° 54' 20"。项目新建工业固废填埋场一座,永久占地 1.91hm²,场内设施主要包括填埋坑、集液坑、门卫室和休息室及环保厕所等。填埋坑总容量为 11624m³,年处理能力为 581.2m³/a,合 700t/a,服

-1-

务年限 20 年，服务范围为第十采油厂、第八采油厂地区。项目工程内容主要有：填埋系统、渗滤液收集系统、集液坑、导气系统、监测系统及公用工程等。总投资 1032.44 万元，环保投资 477.36 万元。

我局同意该项目按照《报告书》所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容和环境保护对策措施进行项目建设。

二、在项目施工期和运行期应做好以下工作

1. 加强施工期间的环境管理工作，防止水土流失，减少和减轻施工扬尘和噪声污染，杜绝夜间施工，施工厂界噪声要满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）中规定的标准限值要求。建筑垃圾集中堆放，统一运送至市政部门指定地点进行填埋。施工现场封闭施工，湿法作业。施工产生的泥浆水等废水经过沉淀池澄清处理后，回用于施工场地。旱厕及时清掏外运处置。

2. 运营期填埋坑产生渗滤液要及时收集、统一外运至宋二联合站处理达标后回注地下，不外排。

3. 运营期产生的硫化氢、氨等气体的排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新建标准限值要求。

4. 运营期要严格按照工业固废入场要求（不易燃、无爆炸性和不含油），只允许废弃岩棉板、废气黄夹克和分子筛三类固废入场处置，禁止生活垃圾和危险废物入场处置。

5. 严格按照要求，做好封场期的环境管理。选择适宜的覆盖植被并维护管理；保持良好的排水系统，及时排出降水；保持渗

滤液收集系统和处理设备的正常运转直至渗滤液监测达到稳定化；长期监测地下水，直至水质稳定为止。

6. 生活垃圾和其他固体废弃物要按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，合理安全处置。

7. 制定有效的风险防范和应急预案，加强管理和监控，防止渗滤液泄露造成地下水污染事故。

8. 应建立健全环保组织机构，制定可行的规章制度和规范的环保档案，加强建设期和运营期的环境管理，把环境保护工作落到实处。

三、本项目建设完成后，投入生产前，应向我局总量减排科提出验收申请，经验收合格方能投入正式运行。

四、由大庆市环境监察支队、肇州县环保局负责该项目施工二期、运营期的环境监察和日常环境监督管理工作。

二〇一一年十一月二十二日

主题词：环保 建设项目 固体废物治理 报告书 批复

抄送：大庆市环境监察支队、市环保局局总量减排科、肇州县环保局。

大庆市环境保护局办公室

2011年11月22日印发

共印10份。

-3-

大庆市环境保护局

庆环验〔2014〕38号

关于第八采油厂工业固废处置场工程 竣工环境保护验收意见的函

大庆油田有限责任公司第八采油厂：

你单位报送的《第八采油厂工业固废处置场工程竣工环境保护验收申请》及相关验收资料收悉。我局组织了相关专家对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。经研究，现函复如下：

一、项目基本情况

本项目位于大庆市肇州县新福乡双龙山村北侧 1.8km，乐业村东南 1.05km，第八采油厂 303 队 9 号计量间东南 180m，芳 117 井排路北侧；项目周围村屯主要有乐业屯、张家围子屯、双龙山屯、陈家店屯、姜洪波屯和采油八厂三矿。其中距离最近的村屯为乐业屯，距离为 1.05km。新建的填埋场容量为 11624m³，年处理能力为 581.2m³，合 700t/a，服务年限 20 年。主要工程内容包括填埋坑、集液坑、门卫和休息室。工程计划总投资 1032.44 万元，全部为环保投资。

- 1 -

二、项目采取的主要环保措施

该项目执行了环境影响评价制度和“三同时”管理制度，按环评及其批复要求进行了建设，采取了相关环保措施。

三、验收调查结果

本项目竣工环境保护验收调查报告表明：

1、大气：采油八厂工业固废填埋场厂界无组织排放的非甲烷总烃、硫化氢和扬尘（TSP）均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值的要求；厂界无组织排放恶臭浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）二级标准新扩改建项目标准浓度限值的要求。

2、渗滤液：采油八厂工业固废填埋场中填埋的废弃岩棉被、废弃黄夹克和分子筛基本不产生渗滤液，集液坑中的水全部为雨水，目前水深近 2.0m，用于养鱼。集液坑中的水质满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）新污染源三级标准。

3 噪声：工业固废填埋场厂界噪声昼间、夜间范围均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类区标准要求。

四、环境管理措施落实情况

该公司制定了相关环保规章制度，经现场核实，环评报告表及批复提出的环境管理措施已基本落实，达到预期效果。

五、验收意见

该项目建设和运营过程中，采取的污染防治措施有效，基

本落实了环境影响报告提出的环境保护治理措施,满足环评报告及其批复的要求,基本具备竣工环境保护验收条件,同意通过项目竣工环境保护验收。

六、工程投运后应做好以下工作:

1、加强填埋场的运行管理,定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施,发现有损坏可能或异常,应及时采取必要措施,以保障正常运行,并对入场的一般工业固体废物的种类和数量等进行记录存案,严格执行设计的填埋要求。

2、严格遵守填埋技术操作规程,填埋过程中应及时覆土,服务期满后认真封场、绿化,防止和减少扬尘产生。

3、服务期满后落实封场方案。

七、由市环境监察支队、市危险废物监督中心负责该项目运营期的环境保护监督管理工作。

2014年8月8日

抄送:市环境监察支队、市环保局环境影响评价科、市危险废物监督中心

大庆市环境保护局办公室

2014年8月8日印发

肇州县环境保护局文件

州环发[2020]17号

关于第八采油厂三矿危险废物暂存项目报告表的批复

大庆第八采油厂有限责任公司：

你单位报送的《第八采油厂三矿危险废物暂存项目报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查研究后，现将审批意见复函如下：

一、该项目拟建于黑龙江省大庆市肇州县境内，第八采油厂三矿拟投资 20.0 万元新建 5000m³ 含油污泥暂存池 1 座、200m² 危废暂存间 1 间和其他配套设施。环保投资比例合适。

二、该项目在全面落实报告表提出的各项生态保护和污染防治措施，并做好沿线规划控制前提下，该工程建设对环境不利影响可以得到缓解和控制。因此，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施。

三、项目建设和运行管理中应重点做好的工作：

(一) 加强施工期间环境保护管理，采取有效措施防止噪声、扬尘对周围环境的不良影响，杜绝夜间施工，施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定的标准限值要求。现场施工应封闭进行，施工废水沉淀后回用施工现场降尘。

(二) 合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格控制施工作业带范围，尽量减小施工影响区域。

(三) 项目运行期，危废暂存间、污泥暂存池，危废暂存间换气经活性炭吸附过滤净化处理后排放；污泥暂存池设置活动钢框盖板，减少非甲烷总烃排放。满足硫酸雾排放浓度 $\leq 1.2\text{mg}/\text{m}^3$ ；铅排放浓度 $\leq 0.006\text{mg}/\text{m}^3$ ；非甲烷总烃 $\leq 4\text{mg}/\text{m}^3$ 。设备安装减振垫，车辆限速禁鸣，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类标准。危废暂存间和污泥暂存池内地面、墙面和顶棚材料全部做相应防腐防渗和硬化处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001) (2013年修订)。建设 100m^3 事故放空池防渗，尺寸为 $10\text{m}\times 5\text{m}\times 2\text{m}$ 。建设6口地下水跟踪监测井。满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。你单位在正式投入生产或使用之前应按照《建设项目环

境保护管理条例》中针对竣工环保验收的有关要求，按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对项目进行验收后，方可正式投入使用。

五、该报告表经批准后，建设项目性质、规模、地点和生产工艺等发生重大变化的，建设单位应向我局重新报批项目环境影响报告表，自批准之日5年后，方开工建设的，建设单位应将该报告表报我局重新审核。

六、本批复仅说明该项目应符合的环境保护相关要求，项目建设单位在项目开工建设前应依法取得其他相关部门的合法批件，确保项目的建设实施符合相关法律法规的规定。

七、由县环境监察大队负责该项目施工期、运行期的环境监察工作。

二〇二〇年七月二十四日

主题词：采油八厂 危废暂存项目 报告表 批复
肇州县环境保护局 2020年7月24日

共印4份

大庆市大同生态环境局文件

同环建字〔2021〕6号

关于黑龙江省大庆市采油八厂废弃钻井液集中处理站项目环境影响报告表的批复

吉林油田多源实业集团有限责任公司：

你单位报送的《黑龙江省大庆市采油八厂废弃钻井液集中处理站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经专家技术审查、我局行政审批会议研究，现批复如下：

一、该项目建设性质属于新建，位于大庆市大同区祝三乡大庆油田第八采油厂第一矿区东侧 1 公里处。主要建设内容：①建设废弃钻井液集中处理站处理废弃钻井液，设计处理能力为 45 万 m³/a（其中，废弃水基泥浆 30 万 m³/a，盐水泥浆 15 万 m³/a）；②建设一座 3000m³水基泥浆缓存池，一座 1500m³盐水泥浆缓存池，一座 500m³回用重浆池，一座 400m³滤液水缓存池，一座 67m³清水池；③建设配套厂房和生活区；④建设储运配套设施；⑤建设泥饼存放区，面积为 12000m²。总投资 1200 万元，其中环保投资 35 万元。我局同意你单位

按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容和环境保护对策措施进行项目建设。

二、该项目在建设和运营中要重点做好并达到以下要求：

(一)加强施工期间的环境管理工作，施工场地扬尘通过采取洒水抑尘、设围挡，运输物料车辆加盖苫布等措施，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放浓度限值要求；施工期噪声经合理安排施工时间、距离衰减等措施后满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准限值要求。

(二)运营期泥浆处理后有残留的泥渣附着在设备上，风干产生的扬尘在厂房内通过人工洒水的方式降低扬尘浓度，消除对环境产生影响；泥饼存储区覆盖防尘网，防止扬尘的产生，存储区扬尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值；食堂油烟经油烟净化装置处理后排放，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)排放限值。

(三)生活污水排入防渗旱厕，定期清运用作农家肥；泥浆处理产生的废水部分用于配制药剂，剩余部分送往大庆油田第八采油厂一矿区徐三联合站集中处理，做好拉运交接记录。

(四)选用低噪声设备，设备噪声采取距离衰减、基础减震、墙体隔声等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

(五) 运营期生活垃圾由当地环卫部门负责清运，日产日清，不外排；废包装袋统一收集后外售综合利用；泥饼统一收集后转运至大庆油田采油八厂指定地点，作为油田铺路、铺垫井场、修井间防火墙及回填等综合利用；废机油（危险废物）暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的机构进行无害化处理。固体废物做到“资源化、减量化、无害化”合理处置。

(六) 建立环保组织机构，制定可行的规章制度和规范的环保档案，编制突发环境事件应急预案，把环境保护工作落到实处。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投产运行。

四、自本批复文件发布之日起，如果该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自本批复文件发布之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报环保部门重新审核。

五、由大庆市大同生态环境局开展该项目建设期及运营期的环境监察工作。



主题词：废弃钻井液集中处理 新建 报告表 批复
大庆市大同生态环境局 2021年3月11日印发

黑龙江省大庆市采油八厂废弃钻井液集中处理站项目

竣工环境保护验收意见

2022年7月17日，吉林油田多源实业集团有限责任公司根据《黑龙江省大庆市采油八厂废弃钻井液集中处理站项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求组织专家对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

黑龙江省大庆市采油八厂废弃钻井液集中处理站项目位于大庆市大同区祝三乡大庆油田第八采油厂第一矿区东侧1公里处，本项目占地面积29988m²。

本项目建设内容为：①建设废弃钻井液集中处理站处理废弃钻井液，处理能力为45万m³/a（其中，废弃水基泥浆30万m³/a，盐水泥浆15万m³/a）；②建设一座230m³水基泥浆缓存池，一座114m³盐水泥浆缓存池，一座210m³盐水泥浆应急池，一座500m³水基泥浆应急池，2座固体药剂溶药池，一座液体药剂溶药池，5座210m³加药搅拌均质池，一座420m³重浆池，一座360m³滤液池（水基），一座210m³滤液池（盐水），一座150m³雨水收集池；③建设配套厂房和生活区；④建设储运配套设施；⑤建设泥饼存放区，面积为5600m²。


（二）建设过程及环保审批情况

2021年02月，黑龙江环盛环保科技开发有限公司编制完成了《黑龙江省大庆市采油八厂废弃钻井液集中处理站项目环境影响报告表》；2021年03月11日，该建设项目获得了大庆市大同生态环境局的批复同环建〔2021〕6号。2021年05月开工建设；2022年06月投入生产。

（三）投资情况

项目实际总投资1203万元，实际环保投资38万元，占总投资的3.16%。

第1页



(四) 验收范围

项目主体工程及其配套的附属设施和环保设施。

二、工程变动情况

本次验收项目为新建项目，本项目实际建设内容与环评阶段相比，变化内容为：本项目实际运行时未建设食堂，员工用餐采用订餐方式。

对照“《污染影响类建设项目重大变更清单（试行）》（环办环函〔2020〕688号）”，本项目建设性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施与环评相比，均未发生重大变动，项目总体上不存在不利环境影响的加重，项目无重大变更。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

(1) 生产废水

本项目泥浆处理产生的压滤液送运至大庆油田第八采油厂一矿区徐三联合站污水处理系统经处理后回注。

(2) 生活污水

本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清运堆肥。

(二) 废气


本项目生产过程中产生的废气主要为泥浆处理和泥饼暂存过程中产生的颗粒物。

本项目原料为泥浆，泥浆处理后有残留的泥渣附着在设备上，风干后容易形成扬尘。本项目在封闭厂房内进行生产，厂房内采用换气扇进行换气，采取人工洒水的方式降低扬尘浓度，不会散逸在大气中，对环境产生影响。

本项目生产产生的泥饼存放在泥饼暂存区（露天），其间由于水分蒸发会导致部分粉尘颗粒脱离泥饼遇风产生扬尘。本项目在泥饼暂存区覆盖防尘网，防止扬尘的产生。

(二) 噪声

本项目噪声主要由自筛分装置、强制固液分离装置、输送机、提升泵等设备



产生，噪声源强为 70~85dB (A)。本项目设备采取了合理布局，生产设备设置于独立设备间内，选择低噪声设备、泵与基座之间设置减振垫等降噪措施。

(三) 固体废物

本项目运行期间固体废物有：工作人员生活垃圾以及生产时产生的废弃药品包装袋、泥饼。

本项目产生的生活垃圾、药剂由编织袋包装由环卫部门统一收集后处置；水基泥浆处置过程产生泥饼、岩屑，各项监测结果均符合 DB23/T693-2000《废弃钻井液处理规范》中控制指标要求。用于油田铺路、铺垫井场、修井间防火墙及回填等。

四、污染物排放情况

(一) 废水

验收监测期间：生产废水滤水最大日均值浓度，pH 值 7.7~7.9，SS 为 44mg/L、石油类 0.67~0.69mg/L，满足大庆油田第八采油厂—矿区徐三联合站污水接收标准要求。

(二) 废气


验收监测期间：厂界无组织颗粒物排放浓度在 0.191~0.246mg/m³之间，监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织排放标准要求。

(三) 噪声

验收监测期间，厂界噪声昼间监测结果在 50.7~53.1dB (A) 之间，厂界噪声夜间监测结果在 41.7~44.5dB (A) 之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类区标准要求。

(三) 固体废物

本项目产生的生活垃圾、药剂由编织袋包装由环卫部门统一收集后处置；水基泥浆处置过程产生泥饼、岩屑浸出液各项监测结果均符合 DB23/T693-2000《废弃钻井液处理规范》控制指标要求。用于大庆油田有限责任公司组织铺垫井场、



铺井场路由昆仑集团环保分公司综合利用做烧结等。本项目暂未产生废机油、产生后委托有资质单位处理。


五、验收结论

本项目环境保护审批手续齐全，管理制度规范，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，并结合验收监测报告表的结论及现场检查情况，该项目执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本按照环境影响评价文件及批复要求配套建设了相应的废气、噪声和固体废物污染防治设施。本项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。本项目正在开展排污许可证申报工作。该企业制定有《吉林油田多源实业集团有限责任公司突发环境事件风险应急预案》并于2022年6月在大庆市大同生态环境局完成备案。

按照验收监测要求，验收期间废水、废气、噪声、固体废物满足建设项目竣工环境保护验收监测要求，本项目产生的生活垃圾、药剂由编织袋包装由环卫部门统一收集后处置；水基泥浆处置过程产生泥饼、岩屑，满足固相（泥饼）主要控制指标。暂存于泥饼暂存区，用于大庆油田有限责任公司组织铺垫井场、铺井场路由昆仑集团环保分公司综合利用做烧结等。同意通过建设项目竣工环境保护设施验收。

六、后续要求

- (1) 加强环保设施的日常维护和运行管理，确保设施稳定运行。
- (2) 严格控制环境风险，定期开展环境风险应急演练，避免发生环境污染事故。
- (3) 企业严格按照排污许可证要求排放污染物。



七、验收人员信息

验收人员信息表

序号	成员	姓名	单位	职务/职称	联系电话
1	专家组	张海东	吉林油田	教授	18645915815
2		张俊	吉林油田	主任	13190591536
4	验收单位				
5	建设单位				
6	监测单位				

吉林油田多源实业集团有限责任公司

2022年7月17日

附件 10: 拉运记录

序号	日期	时间	运往单位	运往原因(哪个单位什么原因产生的哪些固废)	运量数量(吨)	押运人	司机	重量	备注
1	2021.5.19	10:35	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	0.63吨	李元元	李忠臣	17.72吨	
2	2021.5.19	14:20	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	0.63吨	李元元	李忠臣	18.32吨	
3	2021.5.19	17:00	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	0.63吨	李元元	李忠臣	18.98吨	
4	2021.5.19	12:07	油运二部	更换脱硫塔液位计布袋除尘器	1.9吨	李元元	李忠臣	20.88吨	
5	2021.5.19	14:10	油运二部	更换脱硫塔液位计布袋除尘器	1.9吨	李元元	李忠臣	22.76吨	
6	2021.5.19	15:30	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	1.15吨	李元元	李忠臣	24.54吨	
7	2021.5.19	16:35	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	0.72吨	李元元	李忠臣	24.72吨	
8	2021.5.19	17:15	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	0.72吨	李元元	李忠臣	25.978吨	
9	2021.5.19	17:20	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	1.22吨	李元元	李忠臣	27.005吨	
10	2021.5.19	18:00	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	1.52吨	李元元	李忠臣	28.563吨	
11	2021.5.19	18:40	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	1.94吨	李元元	李忠臣	30.005吨	
12	2021.5.19	19:08	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	2.26吨	李元元	李忠臣	30.763吨	
13	2021.5.19	19:15	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	2.42吨	李元元	李忠臣	32.2035吨	
14	2021.5.19	19:00	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	2.82吨	李元元	李忠臣	37.025吨	正存
15	2021.5.20	14:35	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	0.34吨	李元元	李忠臣	37.905吨	
16	2021.5.20	12:40	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	4.8吨	李元元	李忠臣	62.5835吨	
17	2021.5.20	13:01	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	1.5吨	李元元	李忠臣	65.0035吨	
18	2021.5.20	15:04	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	5.75吨	李元元	李忠臣	70.7535吨	
19	2021.5.20	19:12	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	4.5吨	李元元	李忠臣	75.2535吨	正存
20	2021.5.20	18:45	油运二部	11厂脱硫石膏-脱硫石膏粉体物料	2.7吨	李元元	李忠臣	77.9535吨	正存

正本



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2540

DQWE-QR3-002

检测报告

TESTING REPORT



报告编号: R-WQ2212B134~WQ2212B136

样品名称: 宋二联合站厂界空气

委托单位: 第八采油厂

发送日期: 2022年12月16日

大庆石油管理局环境监测中心站

Environmental Monitoring Central Station of DPAB

大庆石油管理局环境监测中心站

检测报告

样品编号: WQ2212B134~WQ2212B136

共2页 第1页

样品名称	宋二联合站厂界空气	样品类型	厂界空气
委托单位	第八采油厂	地址	大庆市大同区
		联系人/电话	牛磊/ 18745901333
采样地点	宋二联合站厂界东侧	采样日期	2022.12.13
采样人	陈雨鸽、任估	样品数量	气袋1L×36
收样人	赵晓娟	收样日期	2022.12.13
样品状态	气体	检测日期	2022.12.13
检测依据	HJ 604-2017等 (见本报告第2页检测方法依据)		
检测项目	硫化氢、非甲烷总烃、甲烷		
检测结论	<p>本次检测以HJ 604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》等方法作为样品检测依据,以GB 39728-2020《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》为限值参考,厂外下风向3个监测点,共检测3项指标。</p> <p>检测结果及监测布点示意图见本报告第2页。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right;">日期: 2022年12月16日</p>		
备注	风向272° 风速(m/s) 1.9		

调 验

编制人: 陈雨鸽

审核人:

授权签字人:

大庆石油管理局环境监测中心站


检测报告

样品编号: WQ2212B134~WQ2212B136

共2页 第2页

样品编号	测点编号	采集时间	检测项目	检测方法依据	限值参考 GB 39728- 2020	计量单位	检测结果	备注
WQ2212B134	1#	13:08-14:08	甲烷	HJ 604-2017	—	mg/m ³	<0.06	—
		13:08-14:08	硫化氢	GB/T 14678-1993	—	mg/m ³	<0.001	—
		13:08-14:08	非甲烷总烃	HJ 604-2017	≤4.0	mg/m ³	0.39	—
WQ2212B135	2#	13:13-14:13	甲烷	HJ 604-2017	—	mg/m ³	<0.06	—
		13:13-14:13	硫化氢	GB/T 14678-1993	—	mg/m ³	<0.001	—
		13:13-14:13	非甲烷总烃	HJ 604-2017	≤4.0	mg/m ³	0.37	—
WQ2212B136	3#	13:20-14:20	甲烷	HJ 604-2017	—	mg/m ³	<0.06	—
		13:20-14:20	硫化氢	GB/T 14678-1993	—	mg/m ³	<0.001	—
		13:20-14:20	非甲烷总烃	HJ 604-2017	≤4.0	mg/m ³	0.37	—

监测布点示意图:

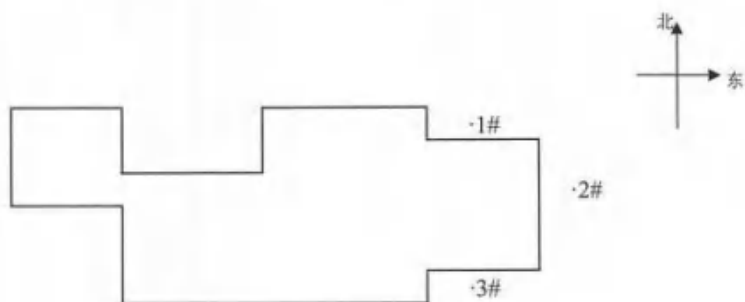


大气/废气现场采样原始记录

编码: DQWE-QR1-005

第 1 页 共 2 页

任务名称		委托监测		监测类别		厂界空气		
委托单位	第八采油厂	地址	大庆市大同区	生产单位	采一联 分站	地址	大庆市大同区	
		联系人	牛磊			联系人	牛磊	
		电话	18745901333			电话	18745901333	
仪器型号	kestrel5500							
出厂编号								
限值标准	GB39728-2020《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》							
采样日期	2022.12.13							
气象条件	气温(℃): -		气压(kPa): -		风向: 272°	风速(m/s): 1.9		
样品编号	测点编号	测点名称	样品采集起止时间	分析项目	流量(L/min)	采集时间(min)	采样体积(L)	标况/参比体积(L)
WB2212 B134	11#	11# 东偏南	13:08	非甲烷总烃	—	—	1	—
			13:28	非甲烷总烃	—	—	1	—
			13:48	非甲烷总烃	—	—	1	—
			14:08	非甲烷总烃	—	—	1	—
			13:08	硫化氢	—	—	1	—
			13:28	硫化氢	—	—	1	—
			13:48	硫化氢	—	—	1	—
			14:08	硫化氢	—	—	1	—
			13:08	甲烷	—	—	1	—
			13:28	甲烷	—	—	1	—
			13:48	甲烷	—	—	1	—
			14:08	甲烷	—	—	1	—
WB2212 B135	2#	11# 东偏南	13:13	非甲烷总烃	—	—	1	—
			13:33	非甲烷总烃	—	—	1	—
			13:53	非甲烷总烃	—	—	1	—
			14:13	非甲烷总烃	—	—	1	—
			13:13	硫化氢	—	—	1	—
			13:33	硫化氢	—	—	1	—
			13:53	硫化氢	—	—	1	—
			14:13	硫化氢	—	—	1	—
			13:13	甲烷	—	—	1	—
			13:33	甲烷	—	—	1	—
			13:53	甲烷	—	—	1	—
			14:13	甲烷	—	—	1	—
备注:								



采样人: 陈雨鸽

12/13

监督人:


12/13

大气/废气现场采样原始记录

编码: DQWE-QR1-005

第 2 页 共 2 页

任务名称		委托监测		监测类别		厂界空气			
委托单位	第八采油厂	地址	大庆市大同区	生产单位	采二队 分站	地址	大庆市大同区		
		联系人	牛磊			联系人	牛磊		
		电话	18745901333			电话	18745901333		
仪器型号 出厂编号	kestrel5500								
限值标准	GB39728-2020《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》								
采样日期	2022.12.17								
气象条件	气温(℃): -		气压(kPa): -		风向: 272°	风速(m/s): 1.9			
样品编号	测点 编号	测点 名称	样品采集 起止时间	分析项目	流量 (L/min)	采集时间 (min)	采样体积 (L)	标况/参比体 积(L)	
W67717 B136	3#	T界 东侧	13:20	非甲烷总烃	-	-	1	-	
			13:40	非甲烷总烃	-	-	1	-	
			14:00	非甲烷总烃	-	-	1	-	
			14:20	非甲烷总烃	-	-	1	-	
			13:20	硫化氢	-	-	1	-	
			13:40	硫化氢	-	-	1	-	
			14:00	硫化氢	-	-	1	-	
			14:20	硫化氢	-	-	1	-	
			13:20	甲烷	-	-	1	-	
			13:40	甲烷	-	-	1	-	
			14:00	甲烷	-	-	1	-	
			14:20	甲烷	-	-	1	-	
W72718									



采样人: 陈雨鹤 13#

监督人: 13#

厂界空气 甲烷、总烃、非甲烷总烃检测原始记录

编码: DQWE-QR2-223

样品类型	厂界空气		分析日期	2022.12.13	
仪器型号	GC6890	仪器编号	US00020039	载气	N ₂
检测方法依据	HJ 604-2017				
检测器参数	FID	温度: 200℃	H ₂ : 40.0ml/min	Air: 300.0 ml/min	
进样口参数	不分流		T: 100℃	流速: 4.8 ml/min	
色谱柱	1. 空柱, 2. HP-5 30m×0.25mm×0.25μm				
柱温	初温: 80℃, 保持3min。				
计算公式	甲烷 (mg/m ³ , 以甲烷计) = 甲烷 (μmol/mol) × 16/22.4				
	总烃 (mg/m ³ , 以甲烷计) = 总烃 (μmol/mol) × 16/22.4				
	非甲烷总烃 (mg/m ³ , 以碳计) = (总烃 (mg/m ³ , 以甲烷计) - 甲烷 (mg/m ³ , 以甲烷计)) × 12/16				
校正曲线	甲烷	y=3.8455X		, 相关性: 0.998	
	总烃	y=23.5974X		, 相关性: 0.996	
样品编号	检测结果				
	甲烷 (μmol/mol 以甲烷计)	甲烷 (mg/m ³ 以甲烷计)	总烃 (μmol/mol 扣除甲烷以甲烷计)	总烃 (mg/m ³ 扣除甲烷以甲烷计)	非甲烷总烃 (mg/m ³ , 以碳计)
WQ2212B134-1	0	ND	0.71	0.51	0.38
WQ2212B134-2	0	ND	0.74	0.53	0.40
WQ2212B134-3	0	ND	0.71	0.51	0.38
WQ2212B134-4	0	ND	0.76	0.55	0.41
WQ2212B134-时段平均	—	ND	—	—	0.39
WQ2212B135-1	0	ND	0.62	0.48	0.26
WQ2212B135-2	0	ND	0.71	0.51	0.38
WQ2212B135-3	0	ND	0.71	0.50	0.38
WQ2212B135-4	0	ND	0.66	0.47	0.36
WQ2212B135-时段平均	—	ND	—	—	0.37
WQ2212B136-1	0	ND	0.65	0.46	0.35
WQ2212B136-2	0	ND	0.64	0.46	0.34
WQ2212B136-3	0	ND	0.62	0.44	0.33
WQ2212B136-4	0	ND	0.70	0.50	0.35
WQ2212B136-时段平均	—	ND	—	—	0.37

分析人: 尹志远

监督人: 陈倩

第 (1) 页, 共 2 页

甲硫醇、甲硫醚、硫化氢检测原始记录（气相色谱法）

编码: DQWE-QR2-249

样品类型	丁烯空包		分析日期	2022.12.13	
仪器型号	GC7890A	仪器编号	CN13091078	载气	N ₂
检测方法依据	GB/T 14678-1993				
色谱柱	DB-1MS 60m×0.32mm×0.25μm			柱温	恒温70°C
进样口参数	不分流 T: 150°C 恒流: 2.5ml/min				
检测器参数	FPD 温度: 200°C H ₂ : 75.0ml/min Air: 100.0 ml/min				
校正曲线	硫化氢	y=670.9771x+20016.3770x+490.21874, 相关性: 0.9995			
	甲硫醇	y=, 相关性:			
	甲硫醚	y=, 相关性:			
计算公式	$C = \frac{g \times 10^{-3}}{V_{nd}}$		C-气体中硫化物组分浓度, mg/m ³ g-硫化物组分绝对量, ng V _{nd} -换算成标准状态下进样或浓缩体积, L		
样品编号	硫化氢		甲硫醇		甲硫醚
	g (ng)	C (mg/m ³)	g (ng)	C (mg/m ³)	g (ng) C (mg/m ³)
1102212 B134-1	0	ND			/
1102212 B134-1(2)	0	ND			
1102212 B134-1(3)	/	ND			
1102212 B134-2	0	ND			
1102212 B134-3	0	ND			
1102212 B134-4	0	ND			
1102212 B134-1(4)	/	ND			
1102212 B135-1	0	ND			
1102212 B135-2	0	ND			
1102212 B135-3	0	ND			
1102212 B135-4	0	ND			
1102212 B135-4(2)	/	ND			
1102212 B136-1	0	ND			
1102212 B136-2	0	ND			
1102212 B136-3	0	ND			
1102212 B136-4	0	ND			
1102212 B136-1(2)	/	ND			

注: 检测结果低于方法检出限时, 用“ND”表示, (“ND”代表未检出)

分析人: 孙玉

监督人: 孙玉

第 1 页, 共 2 页

甲硫醇、甲硫醚、硫化氢检测原始记录（气相色谱法）

编码: DQWE-QR2-249

质量控制项目		硫化氢	甲硫醇	甲硫醚
方法检出限 (mg/m ³)		1.0×10 ⁻³	1.0×10 ⁻⁹	1.0×10 ⁻⁹
运输空白	测定值 (mg/m ³)	ND		
	合格判断依据	低于方法检出限		
	是否合格	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
平行双样	样品编号	WR2212B134-1		
	测定值1 (mg/m ³)	ND		
	测定值2 (mg/m ³)	ND		
	相对标准偏差 (%)	0		
	合格判断依据	相对偏差应≤1.4%	相对偏差应≤0.7%	相对偏差应≤1.9%
	是否合格	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
有证标气	标准物质编号	GBW171062156		
	标准值 (ng)	15.7		
	测定值 (ng)	15.8		
	相对标准偏差 (%)	0.3		
	合格判断依据	相对偏差应≤1.7%	相对偏差应≤1.6%	相对偏差应≤2.0%
	是否合格	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

注: 检测结果低于方法检出限时, 用“ND”表示, (“ND”代表未检出)

附 17 页

分析人: 谷望

监督人:

第 2 页, 共 2 页

正本



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2540

DQWE-QR3-002

检测报告

TESTING REPORT



报告编号: R-WQ2212B137~WQ2212B139

样品名称: 肇一联注水站厂界空气

委托单位: 第八采油厂

发送日期: 2022年12月16日

大庆石油管理局环境监测中心站

Environmental Monitoring Central Station of DPAB

大庆石油管理局环境监测中心站

检测报告

样品编号: WQ2212B137~WQ2212B139


共2页 第1页

样品名称	肇一联注水站厂界空气	样品类型	厂界空气
委托单位	第八采油厂	地址	大庆市大同区
		联系人/电话	牛磊/ 18745901333
采样地点	肇一联注水站厂界东侧	采样日期	2022.12.13
采样人	陈雨鸽、任估	样品数量	气袋1L×36
收样人	赵晓娟	收样日期	2022.12.13
样品状态	气体	检测日期	2022.12.13
检测依据	HJ 604-2017等（见本报告第2页检测方法依据）		
检测项目	硫化氢、非甲烷总烃、甲烷		
检测结论	<p>本次检测以HJ 604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》等方法作为样品检测依据，以GB 39728-2020《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》为限值参考，厂外下风向3个监测点，共检测3项指标。</p> <p>检测结果及监测布点示意图见本报告第2页。</p> <div style="text-align: center;">  <p>日期: 2022年12月16日</p> </div>		
备注	风向272° 风速 (m/s) 1.9		


编制人:

陈雨鸽

审核人:



授权签字人:




大庆石油管理局环境监测中心站


检测报告

样品编号: WQ2212B137~WQ2212B139

共2页 第2页

样品编号	测点编号	采集时间	检测项目	检测方法依据	限值参考 GB 39728-2020	计量单位	检测结果	备注
WQ2212B137	1#	15:59-16:59	甲烷	HJ 604-2017	—	mg/m ³	<0.06	—
		15:59-16:59	硫化氢	GB/T 14678-1993	—	mg/m ³	<0.001	—
		15:59-16:59	非甲烷总烃	HJ 604-2017	≤4.0	mg/m ³	0.33	—
WQ2212B138	2#	16:05-17:05	甲烷	HJ 604-2017	—	mg/m ³	<0.06	—
		16:05-17:05	硫化氢	GB/T 14678-1993	—	mg/m ³	0.35	—
		16:05-17:05	非甲烷总烃	HJ 604-2017	≤4.0	mg/m ³	<0.07	—
WQ2212B139	3#	16:10-17:10	甲烷	HJ 604-2017	—	mg/m ³	<0.06	—
		16:10-17:10	硫化氢	GB/T 14678-1993	—	mg/m ³	<0.001	—
		16:10-17:10	非甲烷总烃	HJ 604-2017	≤4.0	mg/m ³	0.34	—

监测布点示意图:

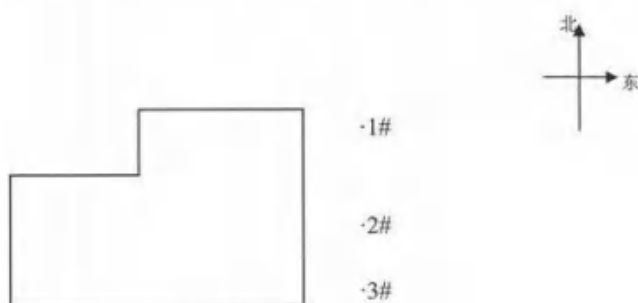


大气/废气现场采样原始记录

编码: DQWE-QRJ-005

第 1 页 共 2 页

任务名称		委托监测		监测类别		厂界空气		
委托单位	第八采油厂	地址	大庆市大同区	生产单位	肇一联 海水站	地址	大庆市肇州县	
		联系人	牛磊			联系人	牛磊	
		电话	18745901333			电话	18745901333	
仪器型号 出厂编号		kestrel5500						
限值标准		GB39728-2020《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》						
采样日期		2022.12.13						
气象条件		气温(℃): —		气压(kPa): —		风向 272°		
						风速(m/s): 1.9		
样品编号	测点编号	测点名称	样品采集起止时间	分析项目	流量(L/min)	采集时间(min)	采样体积(L)	标况/参比体积(L)
WB2212 B137	1#	厂界 东侧	15:59	非甲烷总烃	—	—	—	—
			16:19	非甲烷总烃	—	—	—	—
			16:39	非甲烷总烃	—	—	—	—
			16:59	非甲烷总烃	—	—	—	—
			15:59	硫化氢	—	—	—	—
			16:19	硫化氢	—	—	—	—
			16:39	硫化氢	—	—	—	—
			16:59	硫化氢	—	—	—	—
			15:59	甲烷	—	—	—	—
			16:19	甲烷	—	—	—	—
			16:39	甲烷	—	—	—	—
			16:59	甲烷	—	—	—	—
			WB2212 B138	2#	厂界 东侧	16:05	非甲烷总烃	—
16:15	非甲烷总烃	—				—	—	—
16:45	非甲烷总烃	—				—	—	—
17:05	非甲烷总烃	—				—	—	—
16:05	硫化氢	—				—	—	—
16:25	硫化氢	—				—	—	—
16:45	硫化氢	—				—	—	—
17:05	硫化氢	—				—	—	—
16:05	甲烷	—				—	—	—
16:25	甲烷	—				—	—	—
16:45	甲烷	—				—	—	—

备注:



采样人: 陈雨鸽 仝


监督人: 仝

大气/废气现场采样原始记录

编码: DQWE-QR1-005

第 2 页 共 2 页

任务名称		委托监测		监测类别		厂界空气		
委托单位	第八采油厂	地址	大庆市大同区	生产单位	肇东 污水处理	地址	大庆市肇州县	
		联系人	牛磊			联系人	牛磊	
		电话	18745901333			电话	18745901333	
仪器型号 出厂编号		kestrel5500						
限值标准		GB39728-2020《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》						
采样日期		2022.12.13						
气象条件		气温(℃): —		气压(kPa): —		风向: 272°		
						风速(m/s): 1.9		
样品编号	测点 编号	测点 名称	样品采集 起止时间	分析项目	流量 (L/min)	采集时间 (min)	采样体积 (L)	标况/参比体 积(L)
WB2212 B129	3#	丁界 东侧	16:10	非甲烷总烃	—	—	—	—
			16:30	非甲烷总烃	—	—	—	—
			16:50	非甲烷总烃	—	—	—	—
			17:10	非甲烷总烃	—	—	—	—
			16:10	硫化氢	—	—	—	—
			16:30	硫化氢	—	—	—	—
			16:50	硫化氢	—	—	—	—
			17:10	硫化氢	—	—	—	—
			16:10	甲烷	—	—	—	—
			16:30	甲烷	—	—	—	—
			16:50	甲烷	—	—	—	—
			17:10	甲烷	—	—	—	—
			以下略					



采样人: 陈雨鸽 仝

监督人: 仝

厂界空气 甲烷、总烃、非甲烷总烃检测原始记录

编码: DQWE-QR2-223

样品类型	厂界空气		分析日期	2022.12.13	
仪器型号	GC6890	仪器编号	LS00020039	载气	N ₂
检测方法依据	HJ 604-2017				
检测器参数	FID	温度: 200℃	H ₂ : 10.0ml/min	Air: 300.0 ml/min	
进样口参数	不分流		T ₁ : 100℃	流速: 4.8 ml/min	
色谱柱	1. 空柱, 2. HP-5 30m×0.25mm×0.25μm				
柱温	初温: 80℃, 保持3min。				
计算公式	甲烷 (mg/m ³ , 以甲烷计) = 甲烷 (μmol/mol) × 16/22.4				
	总烃 (mg/m ³ , 以甲烷计) = 总烃 (μmol/mol) × 16/22.4				
	非甲烷总烃 (mg/m ³ , 以碳计) = [总烃 (mg/m ³ , 以甲烷计) - 甲烷 (mg/m ³ , 以甲烷计)] × 12/16				
校正曲线	甲烷	y=3.8455X		相关性: 0.998	
	总烃	y=23.5974X		相关性: 0.996	
样品编号	检测结果				
	甲烷 (μmol/mol 以甲烷计)	甲烷 (mg/m ³ 以甲烷计)	总烃 (μmol/mol 扣除氧峰以甲烷计)	总烃 (mg/m ³ 扣除氧峰以甲烷计)	非甲烷总烃 (mg/m ³ , 以碳计)
WQ2212B137-1	0	ND	0.64	0.46	0.34
WQ2212B137-2	0	ND	0.61	0.44	0.33
WQ2212B137-3	0	ND	0.60	0.43	0.32
WQ2212B137-4	0	ND	0.64	0.46	0.34
WQ2212B137-5	—	ND	—	—	0.33
WQ2212B138-1	0	ND	0.64	0.46	0.34
WQ2212B138-2	0	ND	0.66	0.47	0.35
WQ2212B138-3	0	ND	0.67	0.48	0.36
WQ2212B138-4	0	ND	0.66	0.47	0.35
WQ2212B138-5	—	ND	—	—	0.35
WQ2212B139-1	0	ND	0.71	0.51	0.38
WQ2212B139-2	0	ND	0.62	0.44	0.33
WQ2212B139-3	0	ND	0.60	0.43	0.32
WQ2212B139-4	0	ND	0.64	0.46	0.34
WQ2212B139-5	—	ND	—	—	0.34

分析人:

监督人:

甲硫醇、甲硫醚、硫化氢检测原始记录 (气相色谱法)

编码: DQWE-QR2-249

样品类型	丁烯尾气		分析日期	2022.12.13	
仪器型号	GC7890A	仪器编号	CN13091078	载气	N ₂
检测方法依据	GB/T 14678-1993				
色谱柱	DB-1MS 60m×0.32mm×0.25μm			柱温	恒温70°C
进样口参数	不分流 T: 150°C 恒流: 2.5ml/min				
检测器参数	FPD 温度: 200°C H ₂ : 75.0ml/min Air: 100.0 ml/min				
校正曲线	硫化氢	y=1670.9771x ² -20016.7733x+4703.8765, 相关性: 0.9995			
	甲硫醇	y=, 相关性:			
	甲硫醚	y=, 相关性:			
计算公式	$C = \frac{g \times 10^{-3}}{V_{nd}}$		C-气体中硫化物组分浓度, mg/m ³ g-硫化物组分绝对量, ng V _{nd} -换算成标准状态下进样或浓缩体积, f _{1.2} ×10 ⁻² l.		
样品编号	硫化氢		甲硫醇		甲硫醚
	g (ng)	C (mg/m ³)	g (ng)	C (mg/m ³)	g (ng) C (mg/m ³)
WR2212 B137-1	0	ND			
WR2212 B137-1 (4)	0	ND			
WR2212 B137-1 (5)	/	ND			
WR2212 B137-2	0	ND			
WR2212 B137-3	0	ND			
WR2212 B137-4	0	ND			
WR2212 B137-1 (6)	/	ND			
WR2212 B138-1	0	ND			
WR2212 B138-1 (1)	0	ND			
WR2212 B138-3	0	ND			
WR2212 B138-4	0	ND			
WR2212 B138-1 (2)	/	ND			
WR2212 B139-1	0	ND			
WR2212 B139-2	0	ND			
WR2212 B139-3	0	ND			
WR2212 B139-4	0	ND			
WR2212 B139-1 (2)	/	ND			
注: 检测结果低于方法检出限时, 用“ND”表示, (“ND”代表未检出)					

分析人: 智望

监督人: 陈伟

第 1 页, 共 2 页

甲硫醇、甲硫醚、硫化氢检测原始记录（气相色谱法）

编码：DQWE-QR2-249

质量控制项目		硫化氢	甲硫醇	甲硫醚
方法检出限 (mg/m ³)		1.0×10 ⁻³	1.0×10 ⁻⁹	1.0×10 ⁻⁹
运输空白	测定值 (mg/m ³)	ND		
	合格判断依据	低于方法检出限		
	是否合格	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
平行双样	样品编号	MR2212B137-1		
	测定值1 (mg/m ³)	ND		
	测定值2 (mg/m ³)	ND		
	相对标准偏差 (%)	0		
	合格判断依据	相对偏差应≤1.4%	相对偏差应≤0.7%	相对偏差应≤1.9%
	是否合格	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
有证标气	标准物质编号	GBW(2)062156		
	标准值 (ng)	15.7		
	测定值 (ng)	15.8		
	相对标准偏差 (%)	0.3		
	合格判断依据	相对偏差应≤1.7%	相对偏差应≤1.6%	相对偏差应≤2.0%
	是否合格	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

注：检测结果低于方法检出限时，用“ND”表示，“ND”代表未检出

附 17 页

分析人：张望

监督人：[Signature]

第 2 页，共 2 页

正本

DQWE-QR3-006

检测报告

TESTING REPORT



报告编号: R-WQ2308S002
样品名称: 第三作业区宋二联3#真空炉007(DA007)烟道气
委托单位: 大庆油田第八采油厂
发送日期: 2023年8月25日

大庆油田水务环保研究院

大庆油田水务环保研究院

检测报告

样品编号: WQ2308S002

共2页 第1页

样品名称	第三作业区宋二联3#真空炉007(DA007)炉道气	样品类型	废气
委托单位	大庆油田第八采油厂	地址	大庆市大同区
		联系人/电话	牛磊/18945901333
采样地点	第三作业区宋二联3#真空炉007(DA007)炉道气排放口	采样日期	2023.08.08
采样人	钱贵明、张双庆	样品数量	滤筒×1
收样人	修金波	收样日期	2023.08.08
样品状态	气体	检测日期	2023.08.08
检测依据	GB/T 16157-1996及修改单、HJ 57-2017、HJ 693-2014、HJ/T 398-2007		
检测项目	烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度(林格曼黑度)		
检测结论	<p>本次检测以HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》等方法作为样品检测依据,以GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2(燃气锅炉)作为样品限值参考,共检测4项指标。</p> <p>检测结果见本报告第2页。</p>		
备注	标干流量(m ³ /h): 2697	废气流量(m ³ /h): 5012	



编制人:

审核人:

授权签字人:

大庆油田水务环保研究院

检测报告

样品编号: WQ2308S002

共2页 第2页

序号	检测项目	计量单位	检测方法依据	检测参考	检测结果		备注
				GB 13271-2014 表2 (燃气锅炉)	实际浓度		
1	二氧化硫	mg/m ³	HJ 57-2017	—	实际浓度	<3	—
				≤50	折算浓度	<3	—
2	氮氧化物	mg/m ³	HJ 693-2014	—	实际浓度	62	—
				≤200	折算浓度	84	—
3	烟尘 (粒 状物)	mg/m ³	GB/T 16157- 1996及修改单	—	实际浓度	<20	—
				≤20	折算浓度	<20	—
4	烟气黑度 (林格曼黑度)	级	HJ/T 398-2007	≤1		<1	—
以下空白							



正本

DQWE-QR3-006

检测报告

TESTING REPORT



报告编号: R-WQ2308S003

样品名称: 第三作业区宋二联6#真空炉009(DA009)烟道气

委托单位: 大庆油田第八采油厂

发送日期: 2023年8月25日

大庆油田水务环保研究院

大庆油田水务环保研究院
检测报告

样品编号: WQ2308S003

共2页 第1页

样品名称	第三作业区宋二联6#真空炉009(DA009)炉道气	样品类型	废气
委托单位	大庆油田第八采油厂	地址	大庆市大同区
		联系人/电话	牛磊/18945901333
采样地点	第三作业区宋二联6#真空炉009(DA009)炉道气排放口	采样日期	2023.08.08
采样人	钱贵明、张双庆	样品数量	滤筒×1
收样人	修金波	收样日期	2023.08.08
样品状态	气体	检测日期	2023.08.08
检测依据	GB/T 16157-1996及修改单, HJ 57-2017, HJ 693-2014, HJ/T 398-2007		
检测项目	烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物、烟气温度(林格曼黑度)		
检测结论	<p>本次检测以HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》等方法作为样品检测依据,以GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表1(燃气锅炉)作为样品限值参考,共检测4项指标。</p> <p>检测结果见本报告第2页。</p>		
备注	标干流量(m ³ /h): 2761	烟气流量(m ³ /h): 5160	



检测人:

钱贵明

审核人:

张双庆

授权签字人:

牛磊

大庆油田水务环保研究院

检测报告

样品编号: WQ2308S003

共2页 第2页

序号	检测项目	计量单位	检测方法依据	检测参考 GB 13271-2014 表1 (恶臭检测)		备注
				实际浓度	折算浓度	
1	二氧化硫	mg/m ³	HJ 57-2017	—	<3	—
				≤100	<3	—
2	氮氧化物	mg/m ³	HJ 693-2014	—	62	—
				≤400	59	—
3	粉尘 (颗粒物)	mg/m ³	GB/T 16157-1996及修改单	—	<20	—
				≤30	<20	—
4	臭气(恶臭) (林格曼黑度)	级	HJ/T 398-2007	≤1	<1	—
以下空白						



正本

DQWE-QR3-006

检测报告

TESTING REPORT

报告编号: R-WQ2308S004
样品名称: 第三作业区宋二联7#真空炉023(DA023)烟道气
委托单位: 大庆油田第八采油厂
发送日期: 2023年8月25日

大庆油田水务环保研究院

大庆油田水务环保研究院

检测报告

样品编号: WQ2308S004

共2页 第1页

样品名称	第三作业区宋二联7#真空炉023(DA023)炉道气	样品类型	废气
委托单位	大庆油田第八采油厂	地址	大庆市大同区
		联系人/电话	牛磊/18945901333
采样地点	第三作业区宋二联7#真空炉023(DA023)烟道气排放口	采样日期	2023.08.08
采样人	钱贵明、张双庆	样品数量	滤筒×1
收样人	修金波	收样日期	2023.08.08
样品状态	气体	检测日期	2023.08.08
检测依据	GB/T 16157-1996及修改单、HJ 57-2017、HJ 693-2014、HJ/T 398-2007		
检测项目	烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度(林格曼黑度)		
检测结论	<p>本次检测以HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》等方法作为样品检测依据,以GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表1(燃气锅炉)作为样品限值参考,共检测4项指标。</p> <p>检测结果见本报告第2页。</p> <div style="text-align: right;">  <p>日期: 2023年8月24日</p> </div>		
备注	标干流量(m ³ /h): 2590		烟气流量(m ³ /h): 4807

编制人:

钱贵明

审核人:

修金波

授权签字人:

牛磊



大庆油田水务环保研究院

检测报告

样品编号: WQ2308S004

共2页 第2页

序号	检测项目	计量单位	检测方法依据	检测参考	检测结果		备注
				GB 13221-2014 表1 (燃气轮机)	实际浓度	折算浓度	
1	二氧化硫	mg/m ³	HJ 57-2017	—	<3	<3	—
				≤100		<3	—
2	氮氧化物	mg/m ³	HJ 693-2014	—	58	86	—
				≤400		86	—
3	粉尘 (颗粒物)	mg/m ³	GB/T 16157-1996及修改单	—	<20	<20	—
				≤30		<20	—
4	烟气黑度 (林格曼黑度)	级	HJ/T 398-2007	≤1	<1		—
以下空白							





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2540

正本

DQWE-QR3-002

检测报告

TESTING REPORT



任务名称: 第八采油厂肇一联注水站厂界噪声

报告编号: DQWE-RE3-2303-005

委托单位: 第八采油厂

发送日期: 2023年4月20日

大庆石油管理局环境监测中心站

Environmental Monitoring Central Station of DPAB

检测报告

报告编号: DQWE-RE3-2303-005

共3页 第1页

一、基本情况			
任务名称	第八采油厂肇一联注水站厂界噪声		
委托单位	第八采油厂	地址	大庆市大同区
		联系人/电话	牛磊/1745901333
采样人	印铎	采样日期	2023.03.02
送样人	—	送样日期	—
收样人	—	收样日期	—
样品数量	8个	检测日期	2023.03.02
检测结论	<p>本次检测以GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》作为厂界噪声测量方法,以GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中表1、类别2排放标准作为限值参考,共设4个监测点,昼夜各监测1次。</p> <div style="text-align: center;">  </div>		
备注			
编制人: 杨柳	审核人: 		
授权签字人: 	签发日期: 2023.4.20		

检测报告

报告编号: DQWE-RE3-2303-005

共3页 第2页

二、样品信息				
序号	测点位置	样品编号	样品类型	备注
1	第八采油厂肇一联注水站 厂界南侧	WZ2303A025	工业企业厂界环境噪声	昼间
2	第八采油厂肇一联注水站 厂界西侧	WZ2303A026	工业企业厂界环境噪声	昼间
3	第八采油厂肇一联注水站 厂界北侧	WZ2303A027	工业企业厂界环境噪声	昼间
4	第八采油厂肇一联注水站 厂界东侧	WZ2303A028	工业企业厂界环境噪声	昼间
5	第八采油厂肇一联注水站 厂界南侧	WZ2303A029	工业企业厂界环境噪声	夜间
6	第八采油厂肇一联注水站 厂界西侧	WZ2303A030	工业企业厂界环境噪声	夜间
7	第八采油厂肇一联注水站 厂界北侧	WZ2303A031	工业企业厂界环境噪声	夜间
8	第八采油厂肇一联注水站 厂界东侧	WZ2303A032	工业企业厂界环境噪声	夜间
三、检测项目方法来源及仪器信息				
序号	检测项目	检测方法名称及标准号	仪器名称及型号	检出限*
1	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA6228/108398	—
备注:				



检测报告

报告编号: DQWE-RE3-2303-005


共3页 第3页

四、检测结果

序号	测点编号	样品编号	检测时间	参考限值 GB 12348-2008 表1 2类声环境功能区		计量单位	检测结果	最大声级	备注
				昼间	夜间				
1	1#	WZ2301A025	10:36	昼间	60	dB(A)	52.5	—	—
2	2#	WZ2301A026	10:43	昼间	60	dB(A)	52.4	—	—
3	3#	WZ2301A027	10:48	昼间	60	dB(A)	53.8	—	—
4	4#	WZ2301A028	10:53	昼间	60	dB(A)	52.2	—	—
5	1#	WZ2301A029	23:15	夜间	50	dB(A)	44.0	46.1	—
6	2#	WZ2301A030	23:21	夜间	50	dB(A)	44.2	46.8	—
7	3#	WZ2301A031	23:27	夜间	50	dB(A)	43.9	45.4	—
8	4#	WZ2301A032	23:32	夜间	50	dB(A)	43.3	45.1	—

备注: 昼间风速: 2.7 m/s, 夜间风速: 0.1 m/s

五、监测布点示意图

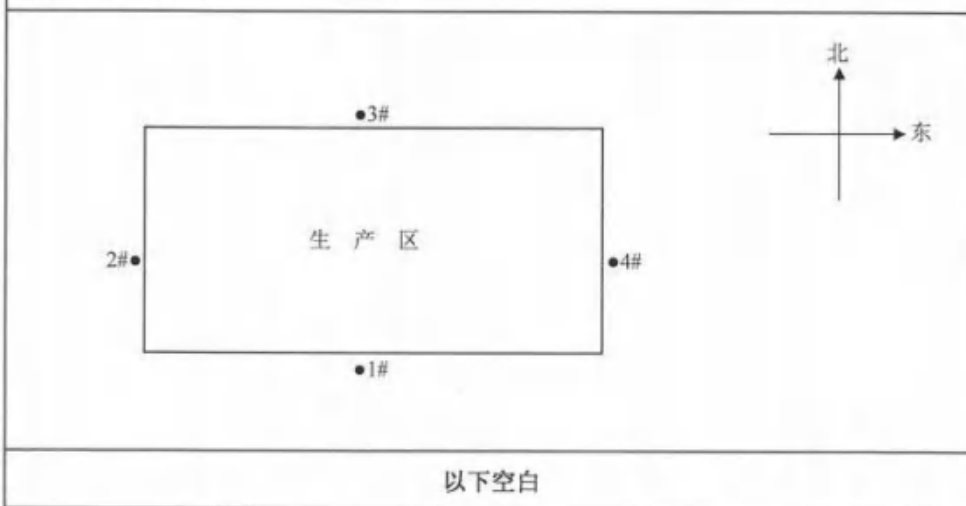

以下空白

检测报告归档记录清单

编码: DQWE-QR3-008

第 | 页 共 | 页

任务名称	第八采油厂-陈庄注水站T井采点
报告编号	DQWE-RE3-2303-005
委托合同/委托协议书/任务单	(1) 份, 共 (1) 页
采样记录	() 份, 共 () 页
现场监测原始记录	(1) 份, 共 (4) 页
样品接收登记表	() 份, 共 () 页
样品检验通知单	() 份, 共 () 页
检测原始记录	共 (1) 份, 包括 (1) 个参数
其中, 理化组原始记录	() 份, 包括 () 个参数
分光组原始记录	() 份, 包括 () 个参数
光谱组原始记录	() 份, 包括 () 个参数
色谱组原始记录	() 份, 包括 () 个参数
生化组原始记录	() 份, 包括 () 个参数
检测报告审核记录	(1) 份, 共 (1) 页
检测报告副本	(1) 份, 共 (4) 页
归档人:	归档日期:
归档审核:	审核日期:

检测报告审核记录

编码: DQWE-QR3-007

第 1 页 共 1 页

任务名称: <u>第11号油漆-胶州站噪声</u>	报告编号: <u>DQWE-QR3-2023-001</u>	
二级审核 (报告审核) 审核内容	审核情况	修改意见
编制报告依据原始记录数据资料是否完整、正确? (包括委托协议、采样记录、样品接收登记表, 样品检验通知单、检测原始记录等)	✓	
检测报告内容是否完整、正确(包括委托方信息、样品信息、检测时间范围、检测结论等)?	✓	
检测方法依据和判定规则标准文本是否有效, 标准选取是否正确? 是否超范围使用标准?	✓	
主要仪器设备是否有效, 仪器设备选取是否正确?	✓	
结果有效数字是否规范、正确?	✓	
是否使用法定计量单位?	✓	
关联检测项目检测值之间的相关性和合理性?	✓	
CMA/CNAS 标识是否正确使用?	✓	
检测报告编号是否规范、唯一?	✓	
检测结论是否规范、正确?	✓	
是否报送了不确定度?	Y	
如报送不确定度是否规范、正确?	Y	
审核人: <u>钱</u>	审核日期: <u>2023.4.17</u>	
三级审核 (授权签字人) 审核内容	审核情况	修改意见
检测报告内容的完整性。	✓	
检测依据标准的正确性。	✓	
检测报告数据结果和检测结论的准确性。	✓	
CMA 和/或 CNAS 标识使用的合法性。	✓	
报告审核结论: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> 同意 批准人 (授权签字人): <u>孙</u> 审核日期: <u>2023.4.20</u> </div>		

注: 1、该审核记录随检测报告进行审核及批准签发, 报告批准签发后随全部原始记录存档。
 2、如审核结论为“同意”即授权签字人同意批准签发该报告, 批准人对检测数据和结果具有真实性、客观性、准确性、可追溯性负责。否则为“退回修改”, 并返回编制人修改报告。

通讯地址：黑龙江省大庆市让胡路区前进村大庆油田水务研究设计院

电话：0459-5977608

委托样品检测任务单

编码：DQWE-QR1-030

任务名称	第八采油厂肇一联注水站厂界噪声		委托人	牛磊	
委托方(甲方)	第八采油厂		电话	1745901333	
检测方(乙方)	<input checked="" type="checkbox"/> 大庆石油管理局环境监测中心站		联系人	袁野	
	<input type="checkbox"/> 大庆油田水务环保研究院		电话	13054208866	
样品说明	样品来源	<input checked="" type="checkbox"/> 采样(采样依据标准 GB 12348-2008)			
		<input type="checkbox"/> 送样(□样品符合运输及保存条件; □样品不符合运输及保存条件,甲方坚持按照样品现状开展检测,检测仅对样品本身负责)			
	样品名称	第八采油厂肇一联注水站厂界噪声			
	样品编号	WZ 2301A025-A032			
	样品类型	厂界噪声	特性描述	—	
检测结果符合性要求	<input type="checkbox"/> 按限值标准判定; <input checked="" type="checkbox"/> 提供限值标准供参考,不判定; <input type="checkbox"/> 仅提供数据结果 <input checked="" type="checkbox"/> 限值标准 GB 12348-2008				
资质要求	<input type="checkbox"/> CMA 标志		<input checked="" type="checkbox"/> CNAS 标志 <input type="checkbox"/> 不出具资质标识		
序号	检测项目	检测方法	序号	检测项目	检测方法
1	厂界噪声	GB 12348-2008			
任务下达人:		任务领取人: 袁野			
时 间: 2023年3月2日		时 间: 2023年3月2日			
备注					

1.本任务单适用于非一次性完成的委托合同、监测计划的单次任务分解;单次委托检测以“委托检测协议书”作为任务来源。

噪声检测原始记录

编号: DQWE-QR2-281

第 1 页 共 1 页

监测任务名称		第八采油厂肇一联注水站							
委托单位	第八采油厂	地址		大庆市大同区					
		联系人/电话		牛磊/1745901333					
生产单位	肇一联注水站	地址		大庆市大同区					
采样地点	肇一联注水站	联系人/电话		牛磊/1745901333					
测量工况	正常	采样日期		2023.7.2					
噪声类型	<input type="checkbox"/> 环境噪声		<input checked="" type="checkbox"/> 工业企业厂界噪声			<input type="checkbox"/> 建筑施工场界噪声			
检测仪器名称和编号	AWA6228多功能声级计/108398								
校准仪器名称和编号	AWA6221A声校准器/1001326								
仪器校准值 (dB)	测量前	91.8		差值是否 ≤ 0.5dB	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	测量后	92.8							
	标准值	93.8							
限值标准	GB12348-2008 表1 2类								
检测依据	GB12348-2008								
气象条件	<input checked="" type="checkbox"/> 无雨雪 <input checked="" type="checkbox"/> 无雷电 风力: 2.7 m/s 0.1 m/s								
测点 编号	样品编号	测点 位置	主要 声源	测量值 dB(A)					
				时间	背景值	测量值	修正值	最大声级	测量结果
1	WZ2303A025	厂界南侧	电机	10:36		52.5			52.5
2	WZ2303A026	厂界西侧	电机	10:43		52.4			52.4
3	WZ2303A027	厂界北侧	电机	10:58		52.8			52.8
4	WZ2303A028	厂界东侧	电机	10:51		52.2			52.2
1	WZ2303A029	厂界南侧	电机	23:15		44.0		46.1	44.0
2	WZ2303A030	厂界西侧	电机	23:21		44.2		46.8	44.2
3	WZ2303A031	厂界北侧	电机	23:27		47.9		45.4	43.9
4	WZ2303A032	厂界东侧	电机	23:32		43.7		45.1	43.5
备注									
测点示意图:									

分析人: G012

监督人: 1

No.001
N:DATA0001_AIHUA
2023-03-02 10:36:12
Mode:STA01 Tm=00h01m00s
R:25dB-125dB WEIGHT:A F
LAeq=52.5dB LCEq=55.8dB
LZeq=65.3dB SEL=63.1dB

Lmax=54.4dB L5=54.0dB
L10=53.7dB L50=53.3dB
L90=52.5dB L95=52.1dB
Lm1n=51.9dB SD=2.9dB
LCpk=82.2dB

No.002
N:DATA0002_AIHUA
2023-03-02 10:43:07
Mode:STA01 Tm=00h01m00s
R:25dB-125dB WEIGHT:A F
LAeq=52.4dB LCEq=60.4dB
LZeq=67.2dB SEL=65.6dB

Lmax=54.0dB L5=53.7dB
L10=53.3dB L50=53.0dB
L90=52.5dB L95=52.1dB
Lm1n=51.7dB SD=3.3dB
LCpk=82.6dB

No.003
N:DATA0003_AIHUA
2023-03-02 10:48:31
Mode:STA01 Tm=00h01m00s
R:25dB-125dB WEIGHT:A F
LAeq=53.8dB LCEq=63.1dB
LZeq=69.1dB SEL=67.4dB

Lmax=55.2dB L5=54.7dB
L10=54.3dB L50=53.6dB
L90=53.1dB L95=52.9dB
Lm1n=52.6dB SD=2.8dB
LCpk=81.5dB

No.004
N:DATA0004_AIHUA
2023-03-02 10:53:41
Mode:STA01 Tm=00h01m00s
R:25dB-125dB WEIGHT:A F
LAeq=52.2dB LCEq=61.2dB
LZeq=60.5dB SEL=58.3dB

Lmax=53.4dB L5=53.1dB
L10=52.8dB L50=52.1dB
L90=51.9dB L95=51.7dB
Lm1n=51.5dB SD=3.2dB
LCpk=81.3dB

6049

No.005
N:DATA0005_AIHUA
2023-03-02 23:15:46
Mode:STA02 Tm=00h01m00s
R:25dB-125 WEIGHT:A F
LAeq=44.0dB LCEq=54.1dB
LZeq=53.7dB SEL=53.1dB

Lmax=46.1dB L5=45.5dB
L10=45.2dB L50=44.7dB
L90=44.5dB L95=44.0dB
Lm1n=43.5dB SD=3.5dB
LCpk=81.3dB

No.006
N:DATA0006_AIHUA
2023-03-02 23:21:30
Mode:STA02 Tm=00h01m00s
R:25dB-125 WEIGHT:A F
LAeq=44.2dB LCEq=50.4dB
LZeq=60.2dB SEL=59.4dB

Lmax=46.8dB L5=46.2dB
L10=46.0dB L50=45.3dB
L90=44.7dB L95=44.3dB
Lm1n=44.0dB SD=3.2dB
LCpk=82.7dB

No.007
N:DATA0007_AIHUA
2023-03-02 23:27:14
Mode:STA02 Tm=00h01m00s
R:25dB-125 WEIGHT:A F
LAeq=43.9dB LCEq=51.8dB
LZeq=60.5dB SEL=58.9dB

Lmax=45.4dB L5=44.7dB
L10=44.6dB L50=44.1dB
L90=43.5dB L95=43.1dB
Lm1n=42.8dB SD=3.5dB
LCpk=81.2dB

No.008
N:DATA0008_AIHUA
2023-03-02 23:32:15
Mode:STA02 Tm=00h01m00s
R:25dB-125 WEIGHT:A F
LAeq=43.3dB LCEq=54.3dB
LZeq=60.4dB SEL=58.7dB

Lmax=45.1dB L5=44.6dB
L10=44.2dB L50=43.7dB
L90=43.1dB L95=42.9dB
Lm1n=42.6dB SD=3.1dB
LCpk=82.1dB

6049

正本



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2540

DQWE-QR3-002

检测报告

TESTING REPORT



任务名称: 第八采油厂宋二联合站厂界噪声

报告编号: DQWE-RE3-2303-007

委托单位: 第八采油厂

发送日期: 2023年4月20日

大庆石油管理局环境监测中心站

Environmental Monitoring Central Station of DPAB

检测报告

报告编号: DQWE-RE3-2303-007

共3页 第1页

一、基本情况			
任务名称	第八采油厂宋二联合站厂界噪声		
委托单位	第八采油厂	地址	大庆市大同区
		联系人/电话	牛磊/1745901333
采样人	印铎	采样日期	2023.03.03
送样人	—	送样日期	—
收样人	—	收样日期	—
样品数量	8个	检测日期	2023.03.03
检测结论	<p>本次检测以GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》作为厂界噪声测量方法,以GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中表1、类别2排放标准作为限值参考,共设4个监测点,昼夜各监测1次。</p> <div style="text-align: right;">  </div>		
备注			
编制人: 印铎	审核人: 牛磊		
授权签字人: 印铎	签发日期: 2023.4.20		

检测报告

报告编号: DQWE-RE3-2303-007

共3页 第2页

二、样品信息				
序号	测点位置	样品编号	样品类型	备注
1	第八采油厂宋二联合站 厂界北侧	WZ2303A041	工业企业厂界环境噪声	昼间
2	第八采油厂宋二联合站 厂界东侧	WZ2303A042	工业企业厂界环境噪声	昼间
3	第八采油厂宋二联合站 厂界南侧	WZ2303A043	工业企业厂界环境噪声	昼间
4	第八采油厂宋二联合站 厂界西侧	WZ2303A044	工业企业厂界环境噪声	昼间
5	第八采油厂宋二联合站 厂界北侧	WZ2303A045	工业企业厂界环境噪声	夜间
6	第八采油厂宋二联合站 厂界东侧	WZ2303A046	工业企业厂界环境噪声	夜间
7	第八采油厂宋二联合站 厂界南侧	WZ2303A047	工业企业厂界环境噪声	夜间
8	第八采油厂宋二联合站 厂界西侧	WZ2303A048	工业企业厂界环境噪声	夜间
三、检测项目方法来源及仪器信息				
序号	检测项目	检测方法名称及标准号	仪器名称及型号	检出限*
1	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA6228/108398	—
备注:				

检测报告归档记录清单

编码: DQWE-QR3-008

第 1 页 共 1 页

任务名称	第1采由T采-综合站T界数在
报告编号	DQWE-RE3-2303-007
委托合同/委托协议书/任务单	(1) 份, 共 (1) 页
采样记录	() 份, 共 () 页
现场监测原始记录	(1) 份, 共 (4) 页
样品接收登记表	() 份, 共 () 页
样品检验通知单	() 份, 共 () 页
检测原始记录	共 (1) 份, 包括 (1) 个参数
其中, 理化组原始记录	() 份, 包括 () 个参数
分光组原始记录	() 份, 包括 () 个参数
光谱组原始记录	() 份, 包括 () 个参数
色谱组原始记录	() 份, 包括 () 个参数
生化组原始记录	() 份, 包括 () 个参数
检测报告审核记录	(1) 份, 共 (1) 页
检测报告副本	(1) 份, 共 (4) 页
归档人:	归档日期:
归档审核:	审核日期:

检测报告审核记录

编码: DQWE-QR3-007


第 1 页 共 1 页

任务名称: 第11号油汀宋=联合的保等	报告编号: DQWE-R63-2303-007	
二级审核 (报告审核) 审核内容	审核情况	修改意见
编制报告依据原始记录数据资料是否完整、正确? (包括委托协议、采样记录、样品接收登记表、样品检验通知单、检测原始记录等)	✓	
检测报告内容是否完整、正确(包括委托方信息、样品信息、检测时间范围、检测结论等)?	✓	
检测方法依据和判定规则标准文本是否有效,标准选取是否正确?是否超范围使用标准?	✓	
主要仪器设备是否有效,仪器设备选取是否正确?	✓	
结果有效数字是否规范、正确?	✓	
是否使用法定计量单位?	✓	
关联检测项目检测值之间的相关性和合理性?	✓	
CMA/CNAS 标识是否正确使用?	✓	
检测报告编号是否规范、唯一?	✓	
检测结论是否规范、正确?	✓	
是否报送了不确定度?	✗	
如报送不确定度是否规范、正确?	✓	
审核人: 	审核日期: 2023.4.17	
三级审核 (授权签字人) 审核内容	审核情况	修改意见
检测报告内容的完整性。	✓	
检测依据标准的正确性。	✓	
检测报告数据结果和检测结论的准确性。	✓	
CMA 和/或 CNAS 标识使用的合法性。	✓	
报告审核结论: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  批准人 (授权签字人): </div> <div style="text-align: center;">  审核日期: 2023.4.20 </div> </div>		

注: 1. 该审核记录随检测报告进行审核及批准签发, 报告批准签发后随全部原始记录存档。
 2. 如审核结论为“同意”即授权签字人同意批准签发该报告, 批准人对检测数据和结果具有真实性、客观性、准确性、可追溯性负责。否则为“退回修改”, 并返回编制人修改报告。

委托样品检测任务单

编码：DQWE-QR1-030

任务名称	第八采油厂宋二联合站厂界噪声		委托人	牛磊	
委托方(甲方)	第八采油厂		电话	1745901333	
检测方(乙方)	<input checked="" type="checkbox"/> 大庆石油管理局环境监测中心站		联系人	袁野	
	<input type="checkbox"/> 大庆油田水务环保研究院		电话	13054208866	
样品说明	样品来源	<input checked="" type="checkbox"/> 采样(采样依据标准 GB 12348-2008)			
		<input type="checkbox"/> 送样(□样品符合运输及保存条件; □样品不符合运输及保存条件,甲方坚持按照样品现状开展检测,检测仅对样品本身负责)			
	样品名称: 第八采油厂宋二联合站厂界噪声				
	样品编号: WZ233A041-A048				
	样品类型: 厂界噪声	特性描述: /			
检测结果符合性要求	<input type="checkbox"/> 按限值标准判定; <input checked="" type="checkbox"/> 提供限值标准供参考,不判定; <input type="checkbox"/> 仅提供数据结果 <input checked="" type="checkbox"/> 限值标准 GB 12348-2008				
资质要求	<input type="checkbox"/> CMA 标志		<input checked="" type="checkbox"/> CNAS 标志		<input type="checkbox"/> 不出具资质标识
序号	检测项目	检测方法	序号	检测项目	检测方法
1	厂界噪声	GB12348-2008			
任务下达人: 			任务领取人: 印舒		
时 间: 2023年3月3日			时 间: 2023年3月3日		
备注					

1.本任务单适用于非一次性完成的委托合同、监测计划的单次任务分解;单次委托检测以“委托检测协议书”作为任务来源。

噪声检测原始记录

编号: DQWE-QR2-281

第 1 页 共 1 页

监测任务名称		第八采油厂宋二联合站							
委托单位	第八采油厂	地址		大庆市大同区					
		联系人/电话		牛磊/1745901333					
生产单位	宋二联合站	地址		大庆市大同区					
采样地点	宋二联合站	联系人/电话		牛磊/1745901333					
测量工况	正常	采样日期		2023.3.3					
噪声类型	<input type="checkbox"/> 环境噪声 <input checked="" type="checkbox"/> 工业企业厂界噪声 <input type="checkbox"/> 建筑施工场界噪声								
检测仪器名称和编号	AWA6228多功能声级计/108398								
校准仪器名称和编号	AWA6221A声校准器/1001326								
仪器校准值 (dB)	测量前	93.8		差值是否 ≤ 0.5dB	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	测量后	92.8							
	标准值	93.8							
限值标准	GB12348-2008 表1 2类								
检测依据	GB12348-2008								
气象条件	<input checked="" type="checkbox"/> 无雨雪 <input checked="" type="checkbox"/> 无雷电 风力: 2.7 m/s 0.4 m/s								
测点编号	样品编号	测点位置	主要声源	测量值 dB(A)					
				时间	背景值	测量值	修正值	最大声级	测量结果
1	WZ2303A041	厂界北侧	电机	10:32		52.5			52.5
2	WZ2303A042	厂界东侧	电机	10:40		51.6			51.6
3	WZ2303A043	厂界南侧	电机	10:46		52.7			52.7
4	WZ2303A044	厂界西侧	电机	10:40		51.5			51.5
1	WZ2303A045	厂界北侧	电机	23:02		42.4		42.6	42.4
2	WZ2303A046	厂界东侧	电机	23:10		42.8		42.6	42.8
3	WZ2303A047	厂界南侧	电机	23:16		44.1		44.9	44.1
4	WZ2303A048	厂界西侧	电机	23:21		42.6		44.1	42.6
备注									
测点示意图 									

分析人: GZP

监督人: [Signature]

No.001
N:DATA0001_AIHUA
2023-03-03 10:32:33
Mode:STA01 Tm=00h01m00s
R:25dB-125dB WEIGHT:A F
LAeq=52.5dB LCeq=55.8dB
LZeq=65.1dB SEL=63.1dB
Lmax=54.7dB L5=54.5dB
L10=54.0dB L50=53.8dB
L90=53.1dB L95=52.5dB
Lmin=52.0dB SD=3.6dB
LCpk=83.2dB

No.002
N:DATA0002_AIHUA
2023-03-03 10:40:07
Mode:STA01 Tm=00h01m00s
R:25dB-125dB WEIGHT:A F
LAeq=51.8dB LCeq=60.3dB
LZeq=70.3dB SEL=67.6dB
Lmax=53.5dB L5=52.8dB
L10=52.5dB L50=52.3dB
L90=52.0dB L95=51.8dB
Lmin=51.7dB SD=3.0dB
LCpk=81.2dB

No.003
N:DATA0003_AIHUA
2023-03-03 10:46:17
Mode:STA01 Tm=00h01m00s
R:25dB-125dB WEIGHT:A F
LAeq=52.7dB LCeq=63.2dB
LZeq=68.3dB SEL=67.3dB
Lmax=54.1dB L5=53.9dB
L10=53.4dB L50=53.1dB
L90=52.7dB L95=52.2dB
Lmin=51.7dB SD=3.6dB
LCpk=83.8dB

No.004
N:DATA0004_AIHUA
2023-03-03 10:50:21
Mode:STA01 Tm=00h01m00s
R:25dB-125dB WEIGHT:A F
LAeq=51.5dB LCeq=61.3dB
LZeq=60.2dB SEL=59.1dB
Lmax=53.5dB L5=53.1dB
L10=52.6dB L50=52.5dB
L90=52.1dB L95=51.8dB
Lmin=51.6dB SD=3.7dB
LCpk=82.6dB

649

No.005
N:DATA0005_AIHUA
2023-03-03 23:02:42
Mode:STA02 Tm=00h01m00s
R:25dB-125dB WEIGHT:A F
LAeq=43.4dB LCeq=54.1dB
LZeq=53.7dB SEL=53.1dB
Lmax=45.6dB L5=45.2dB
L10=44.5dB L50=44.0dB
L90=43.8dB L95=43.6dB
Lmin=43.0dB SD=2.7dB
LCpk=81.5dB

No.006
N:DATA0006_AIHUA
2023-03-03 23:10:05
Mode:STA02 Tm=00h01m00s
R:25dB-125dB WEIGHT:A F
LAeq=43.8dB LCeq=50.4dB
LZeq=60.2dB SEL=59.4dB
Lmax=45.6dB L5=44.7dB
L10=44.3dB L50=44.0dB
L90=43.5dB L95=43.1dB
Lmin=42.9dB SD=3.5dB
LCpk=81.8dB

No.007
N:DATA0007_AIHUA
2023-03-03 23:15:21
Mode:STA02 Tm=00h01m00s
R:25dB-125dB WEIGHT:A F
LAeq=44.1dB LCeq=51.8dB
LZeq=57.5dB SEL=54.9dB
Lmax=46.9dB L5=46.0dB
L10=45.8dB L50=45.1dB
L90=44.7dB L95=44.4dB
Lmin=44.1dB SD=3.4dB
LCpk=81.2dB

No.008
N:DATA0008_AIHUA
2023-03-03 23:21:13
Mode:STA02 Tm=00h01m00s
R:25dB-125dB WEIGHT:A F
LAeq=42.6dB LCeq=53.3dB
LZeq=56.4dB SEL=53.6dB
Lmax=44.1dB L5=43.6dB
L10=43.1dB L50=42.7dB
L90=42.5dB L95=42.1dB
Lmin=41.6dB SD=2.7dB
LCpk=83.5dB

649



报告编号: JRD-BG-202407099



检测报告

报告名称 : 大庆市庆兴环保科技有限公司检测报告
委托单位 : 大庆市庆兴环保科技有限公司
检测类别 : 委托检测
样品类型 : 固体废物

黑龙江省青瑞达检测科技有限公司



说 明

- 1、本报告未加盖本公司检测报告专用章、骑缝章、计量认证章及无本公司防伪标识视为无效。
- 2、本报告无审核人及授权签字人签字无效，涂改、增删、部分复印无效。
- 3、委托检测结果仅对当时工况及环境状况负责，委托单位自行送样仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。
- 4、本报告未经同意不得用于商业宣传。
- 5、对本报告如有异议，请于收到报告之日起十日内向本公司查询，来函来电请注明报告编号，逾期不予受理。

黑龙江省吉瑞达检测科技有限公司

地址：黑龙江省大庆市高新区安萨路 9-1

邮政编码：163000

联系电话：13836766965

联系人：宋喜晶

一、检测信息

委托方: 大庆市庆兴环保科技有限公司

受检单位: 大庆市庆兴环保科技有限公司

地址: 大庆市肇源县大兴乡

联系人: 袁静	联系电话: 15845927090
接样时间: 2024年07月28日	接样人员: 于爽
样品分析时间: 2024年07月28日-08月10日	分析人员: 盛雪源、梁安琪、于爽、徐畅

二、检测内容

1、固体废物

检测项目: pH值、含水率、石油类、铜、锌、铅、镉、六价铬、砷、汞、镍;

样品数量: 1个。

三、质量保证

为保证本次检测分析数据的准确性、科学性,本次检测采取了相关质控措施,合格率为100%。分析中所使用的各类器皿及仪器,均经国家认可的计量检定部门检定,且检定合格。

四、检测项目、分析方法及分析仪器

检测项目、分析方法及分析仪器信息见表1。

表1 检测项目、分析方法及分析仪器信息

类别	检测项目	分析方法名称及方法标准号	分析仪器、型号及编号
固体废物	pH值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	精密酸度计 pHS-2F JRD-006
	水分 (含水率)	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011	电子天平 FA2004 JRD-010
	镉、铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128
	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光 法 第 2 部分: 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	原子荧光光度计 RGF-6800 JRD-015
	铜、锌、镍	土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法 NY/T 1613-2008	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128

汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分: 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	原子荧光光度计 RGF-6800 JRD-015
石油类	土壤 石油类的测定 红外分光光度法 HJ 1051-2019	红外分光测油仪 OIL450 JRD-018
六价铬	固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 JRD-128

五、检测结果

检测结果见表 2。

表 2 固体废物检测结果表

检测项目	单位	检测结果	《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》 DB 23/T3104-2022 中表 1 标准
水分(含水率)	%	1.0	≤40%
石油类	mg/kg	8.24×10 ²	≤3000
pH 值	无量纲	8.11	6.5~9
铜	mg/kg	71.2	≤150
锌	mg/kg	1.68×10 ²	≤600
铅	mg/kg	99.6	≤375
镉	mg/kg	1.72	≤3
六价铬	mg/kg	4.0	≤5
砷	mg/kg	8.98	≤30
汞	mg/kg	1.92	≤0.8
镍	mg/kg	68.0	≤150

注: 1、当测定结果在检出限以上时, 报实际测定结果值。

以下无正文

报告编写人: 
审核人: 
授权签字人: 
签发日期: 2024年8月10日



附件 12：工程完工交接证书

工程完工（中间）交接证书

TY-08

工程名称	宋芳屯油田 20 区块葡萄 花油层特高含水期补充及局 部注采系统调整合作部分产 能建设集油注水及配电系统 工程		工程编号	S (23) 0516YC005
单位工程名称	宋芳屯油田 20 区块葡萄 花油层特高含水期补充及局 部注采系统调整合作部分产 能建设集油注水及配电系统工程			
开工日期	2023 年 12 月 29 日	计划竣工日期	2024 年 12 月 30 日	
主要内容：基建油井 15 口，新建油气集输管道 9.57 千米，扩改建转油站 2 座；基建注水井 3 口，新建 供注水管道 0.85 千米；新建井场柱上变 17 座，利旧井场柱上变 2 座，新建 10KV 线路 2.94 千米，线路无 功补偿装置 300KVar。				
质量初评情况：合格				
施工（总承包）单位	监理单位	建设单位 (业主项目部)	建设单位 (生产单位)	
 项目经理： 杨治刚 2024 年 11 月 26 日		 项目代表： 2024 年 11 月 26 日 代表： 		
2024 年 11 月 27 日				



建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：大庆模範屯油田有限责任公司

填表人（签字）： *[Signature]*

项目经办人（签字）： *[Signature]*

建设项目	项目名称		2023年州20区块葡萄油层产能建设工程（合作）项目				项目代码		--				建设地点		大庆市肇州县新福乡境内									
	行业类别（分类管理名录）		石油开采/B0711				建设性质		<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造															
	设计生产能力		0.73×10 ⁴ t/a				实际生产能力		0.73×10 ⁴ t/a				环评单位		黑龙江环盛环保科技有限公司									
	环评文件审批机关		大庆市生态环境局				审批文号		庆环审[2023]44号				环评文件类型		环境影响报告表									
	开工日期		2023-12				竣工日期		2024-12				排污许可证申领时间		2021-5									
	环保设施设计单位		大庆油田工程有限公司				环保设施施工单位		大庆油田工程建设有限公司油田工程事业部				本工程排污许可证编号		912306217336497473001W									
	验收单位		大庆模範屯油田有限责任公司				环保设施监测单位		黑龙江省吉瑞达检测科技有限公司				验收监测时工况		正常运行									
	投资总概算（万元）		1950				环保投资总概算（万元）		106.883				所占比例（%）		5.48									
	实际总投资（万元）		816.21				实际环保投资（万元）		106.883				所占比例（%）		13.10									
	废水治理（万元）		4		废气治理（万元）		13		噪声治理（万元）		3.6		固体废物治理（万元）		5.945		绿化及生态（万元）		33.838		其他（万元）		46.5	
	新增废水处理设施能力		--				新增废气处理设施能力		--				年平均工作时		--									
	运营单位		大庆模範屯油田有限责任公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）				91230607716675409L				验收时间		2025.10							
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物		原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)										
	废水																							
	化学需氧量																							
	氨氮																							
	石油类																							
	废气																							
	二氧化硫			3L	50			0.023			0.023			0										
	烟尘			11.5-16.9	20			0.021			0.021			0										
	工业粉尘																							
	氮氧化物			96-123	200			0.14			0.14			0										
工业固体废物																								
与项目有关的其他特征污染物		非甲烷总烃	10.35				10.35			10.35			0											

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。

2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。
